



বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাণী

সৃষ্টিগ্ন হতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষেপণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারেজ, রেগুলেটর, ক্রস-ড্যাম, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, ডুবন্ত বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ, নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ, নদ-নদী ড্রেজিং ও খাল খনন/পুনঃখনন, ব-দ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রমের তথ্য সকলের মাঝে অবাধ প্রবাহের নিমিত্ত বাপাউবো নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মকাণ্ডের বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ছোট বড় ১০০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এসব প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য অবকাঠামোর পাশাপাশি ১৬৬৬২ কিলোমিটার বাঁধ এবং ১৬৫৮.৯৬ কিলোমিটার নদীতীর সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে মানুষের জীবন, জীবিকা ও বিনিয়োগের নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর নাব্যতা রক্ষা ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত ৫৪০১ কিলোমিটার ড্রেজিং ও খনন/পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৪১টি সেচধর্মী প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৬.৪৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করায় বাৎসরিক অতিরিক্ত প্রায় ১.১১ কোটি মেট্রিক টন খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সমন্বয়ে হাওর অঞ্চল, উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের সকল অঞ্চলে প্রকল্পের কাজ চলমান রেখেছে এবং নিবিড় মনিটরিং এর মাধ্যমে কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ নিশ্চিত করেছে।

আধুনিক বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বন্যা মৌসুমে ৫ দিনের সুনির্দিষ্ট আগাম বন্যা পূর্বাভাস এবং এপ্রিল-মে মাসে হাওর অঞ্চলের জন্য ৩ দিনের আকস্মিক বন্যার আগাম পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। বর্তমান পদ্ধতির সহায়তায় স্থানভেদে ৩দিন থেকে ৫দিন পূর্বে সুনির্দিষ্টভাবে সতর্কবার্তা প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের মোবাইলে পুশ নোটিফিকেশনের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজিতে সতর্কবার্তা এবং সুরক্ষা পরামর্শ পৌঁছে যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমন্বিতভাবে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের ফলে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপি ব্যবহার, ই-ফাইলিং ব্যবহার, জনবল নিয়োগে অনলাইন সিস্টেম ব্যবহার, হাজিরা ব্যবস্থাপনাসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর তথ্য ডেটাবেজে সংরক্ষণ করেছে। মাঠ পর্যায়ে অনলাইন ক্যামেরার মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম ই-মনিটরিং করার একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ চালু করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রসরমান প্রযুক্তির সাহায্যে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে অদম্য তারুণ্যের উদ্ভাবনী চিন্তা এবং সচেতন নাগরিক শক্তিকে সাথে নিয়ে টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নতুন উদ্যমে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

(মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা)

প্রকাশক
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২৪

প্রকাশনা কমিটি

- | | |
|--|------------|
| ১। প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | আহবায়ক |
| ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
প্রসেসিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য |
| ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য-সচিব |
| ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী
প্রসেসিং পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য |
| ৫। প্রোগ্রামার
কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড | সদস্য |

মুদ্রণ
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পানি ভবন, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা-১২০৫

সূচিপত্র

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি	১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০	১
পরিচালনা পরিষদ	১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী	২
সাংগঠনিক কাঠামো	২
জনবল	৪
পদ সৃজন	৪
জনবল নিয়োগ	৪
নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান	৫
মানব সম্পদ উন্নয়ন (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ)	৫
বাপাউবোর প্রকল্পে অর্থায়ন	৫
২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী	৫
২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে সম্পাদিত কার্যক্রম	৬
২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ	৭
২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমাপ্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য	৯
২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প	১১
২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ	১২
জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গ্রহীত প্রকল্প	১৫
বাপাউবোর ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা	১৫
টেকসই উন্নয়ন অভিজ্ঞ (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১৬
প্রকৃতি নির্ভর পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা (Nature Based Solution)	১৭
বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ	১৮
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রপ্টন কার্যক্রম	১৯
পানি বিজ্ঞান (Hydrolog) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম	২২
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম	২৩
ড্রেজার পরিদপ্তরের কার্যক্রম	৩০
যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের কার্যক্রম	৩০
শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)	৩০
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩১
জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম	৩১
কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল এর কার্যক্রম	৩১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম	৩৩
এক নজরে বাপাউবোর সাফল্য	৩৭
এক নজরে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/ কর্মকাণ্ডের	৩৯
বিবরণ	
উপসংহার	৪০
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০২৩-২৪ সালের বিভিন্ন কার্যক্রম	৪১

পরিশিষ্ট-১

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের ৩০-০৬-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

৪১

৪৩

পরিশিষ্ট-২

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

৫৭

৫৯

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশের ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

৬১

৬৩

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতিবৃষ্টি জনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা ও সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদ উন্নয়ন অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন ও এর সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন্যা প্রতিরোধ, সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা ও সমুদ্র হতে নতুন নতুন জমি উদ্ধার কাজে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া, দেশের শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সৃষ্টি

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের ভয়াবহ বন্যায় দেশের জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সরকারের আমন্ত্রণে জনাব জে, এ, ক্রুগের নেতৃত্বে ক্রুগ মিশন নামে জাতিসংঘের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের জটিল পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করেন। ক্রুগ মিশনের সমীক্ষার সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এর মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি করা হয়। তৎকালীন সেচ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে ইপিওয়াপদার পানি উইং এ আত্মীকরণসহ প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কারিগরি ও অ-কারিগরি বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে, ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদার “পানি উইং” নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০

জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর অনুসরণে সমন্বিত ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১১ জুলাই, ২০০০ তারিখে “বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০” জারি করা হয়। পানি সমুদ্র ব্যবস্থাপনা খাতে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প/প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ৯টি জোনে (উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল) বিভক্ত করা হয়েছে। মহাপরিচালক এবং তাঁর অধীনস্থ ৫ জন অতিরিক্ত মহাপরিচালক সমন্বয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যবস্থাপনা কার্য পরিচালিত হয়। প্রধান প্রকৌশলী/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ৯টি জোনের দায়িত্ব পালন করেন।

পরিচালনা পরিষদ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ অনুসারে বোর্ডের সার্বিক নীতি নির্ধারণের জন্য একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, এছাড়া পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ৪ (চার) জন সচিবসহ সরকারি/বেসরকারি খাতের বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি এবং মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির প্রতিনিধিসহ ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন- ২০০০ অনুসারে বাপাউবোর কার্যাবলী

(ক) কাঠামোগত কার্যাবলী

১. নদী ও অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ব্যবস্থাপনা ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ ও রেগুলেটর বা অন্য যে কোনো অবকাঠামো নির্মাণ;
২. সেচ, মৎস্য চাষ, নৌপরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খালবিল ইত্যাদি পুনঃখনন;
৩. ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার এবং নদীর মোহনা নিয়ন্ত্রণ;
৪. নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙ্গন হতে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে শহর, বাজার, হাট এবং ঐতিহাসিক ও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ সংরক্ষণ;
৫. উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ;
৬. লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন;
৭. সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ।

(খ) অকাঠামোগত ও সহায়ক কার্যাবলি

- ১) বন্যা ও খরা পূর্বাভাস সতর্কীকরণ;
- ২) পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদসম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ;
- ৩) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহযোগিতায় এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক সৃষ্ট অবকাঠামোভুক্ত নিজস্ব জমিতে বনায়ন, মৎস্য চাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বাঁধের উপর রাস্তা নির্মাণ;
- ৪) বোর্ডের কার্যাবলির উপর মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা;
- ৫) বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের মধ্যে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের সংগঠিতকরণ, প্রকল্পে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন এবং প্রকল্প ব্যয় পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন।

সাংগঠনিক কাঠামো

প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং সমাপ্ত-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ পানি সেক্টরের সকল কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দপ্তরসমূহের বিস্তারিত নিম্নের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রদর্শিত হয়েছে।

মহাপরিচালক



জনবল

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৫৯ মোতাবেক তদানীন্তন ইপিওয়াপদার “পানি উইং” নিয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে সৃষ্টি হয়। শুরুতে এর অনুমোদিত জনসংখ্যা ছিল ২৪,৩৬৮ জন। সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন সময় সংস্থাটির জনবল হ্রাস করা হয়। ১৯৮৫ সালে সংস্থার জনবল এনাম কমিটির মাধ্যমে ১৮০৩২ জনে অবনমন করা হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সালে এর জনবল ১৮০৩২ থেকে কমিয়ে ৮৯৩৫ জন করা হয়। তন্মধ্যে গ্রেড-১ হতে গ্রেড-৯ এর পদ ৯৮৬টি, গ্রেড-১০ এর পদ ৮২০টি, গ্রেড-১১ হতে গ্রেড-১৬ এর পদ ৩১২৩টি এবং গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ এর পদ ৪০০৬টি। পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ ক্যাটাগরির ১২৬৩৮ টি (২৭ ক্যাটাগরির ৩৫৫৫টি আউটসোর্সিং পদ ও নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) ক্যাটাগরিতে ৮৫০টি আনসার অঙ্গীভূতকরণসহ) পদ সৃজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

পদ সৃজন

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ নদীসমূহে ক্যাপিট্যাল ড্রেজিং, নদী ব্যবস্থাপনা এবং গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ন্যায় মেগা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী মধ্য-মেয়াদী বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নের পরিধিও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে জনবল হ্রাস ও বর্তমানে বাপাউবোর কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে মোতাবেক ২০১০ সালে সর্বমোট ১৫০৬৭টি পদের জন্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বাপাউবো’র জনবল কাঠামোর প্রস্তাবনা দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা পূর্বক ৬৪৫৯টি নতুন পদ (যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর ও ড্রেজার পরিদপ্তর নতুনভাবে অন্তর্ভুক্তকরণ পূর্বক) অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজন এবং বাপাউবো’র অনুমোদিত ৮৯৩৫টি পদ হতে ১৮০০টি পদ বিলুপ্তিসহ সর্বমোট ১৩৫৯৪ পদ এর সম্মতি জ্ঞাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় অর্থ মন্ত্রণালয় ৫৫০৩টি পদ সৃজন এবং ১৮০০টি পদ বিলুপ্ত করে মোট ১২৬৩৮টি (২৭ ক্যাটাগরির ৩৫৫৫টি আউটসোর্সিং পদ ও নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) ক্যাটাগরিতে ৮৫০টি আনসার অঙ্গীভূত করণসহ) পদের সুপারিশ করে। এছাড়াও ৫৯৫টি আর্মড গার্ড (আনসার) এর পদ অঙ্গীভূত করণের (Embodiment) মাধ্যমে পূরণ করার সুপারিশ থাকায় মোট পদ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩২৩৩টি। বিস্তারিত নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংস্থা/পরিদপ্তরের নাম	এনাম সেট-আপ ১৯৮৫ অনুসারে জনবল	গেজেট '৯৮ অনুসারে জনবল	বাপাউবোর Need Based সেট-আপ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	
				জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	অর্থ মন্ত্রণালয়
১।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (যান্ত্রিক সরঞ্জাম ও ড্রেজার পরিদপ্তর বাদে)	১৪১২৫	৮৯৩৫	১২০২৮	১১৮৭০
২।	যান্ত্রিক সরঞ্জাম (এমই) পরিদপ্তর	২১৪৫	-	৪২৫	৩৬০
৩।	ড্রেজার পরিদপ্তর	১৪০৫	-	১১৪১	১০০৩
৪।	নদী গবেষণা ইন্সটিটিউট	১৯০	-	-	-
৫।	মৌখ নদী কমিশন	১৬৭	-	-	-
	মোট	১৮০৩২	৮৯৩৫	১৩৫৯৪	১৩২৩৩

জনবল নিয়োগ

পানি সম্পদ সেক্টরে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গতিশীল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়মিতভাবে জনবল নিয়োগের কাজ চলমান আছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে নিয়োগের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	গ্রেড	বাপাউবো’র অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০২৩-২০২৪ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর’ ২০২৪ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদসংখ্যা
১	১ হতে ৯	১,৪২৭	৯৮৫	১৪৬	৪৪২	৬
২	১০ হতে ১২	১,১৯৮	৯৫৭	৭১	২৪১	৯৬
৩	১৩ হতে ১৬	৪,২৩২	২,৬৯৭	৫৫	১,৫৩৫	১৫৪

ক্রমিক নং	গ্রেড	বাপাউবো'র অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত সংখ্যা	২০২৩-২০২৪ সালে সরাসরি নিয়োগকৃত পদসংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	ডিসেম্বর' ২০২৪ এর মধ্যে সরাসরি নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন পদ সংখ্যা
৪	১৭ হতে ২০	৫,৭৮১	৪,২৩৭	০০	৯৬৭	০০
	মোট	১২,৬৩৮ (আউটসোর্সিং ৩৫৫৫ ও নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) পদে ৮৫০ জন আনসার অঙ্গীভূতকরণ সহ)	৮,৮৭৬ (আউটসোর্সিং পদে নিয়মিত ৮৬৪ জনসহ মোট ৩০২০ জন এবং নিরাপত্তা প্রহরী (গার্ড) পদে নিয়মিত ১১৫ জন ও আনসার অঙ্গীভূতকরণ এর ৬৯৯ জন সহ মোট ৮১৪ জন কর্মরত)	২৭২	৩৭৬২	২৫৬

নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি		
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
১৫১ জন	৫০ জন	২০১ জন

মানব সম্পদ উন্নয়ন (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ)

	ধরণ	অভ্যন্তরীণ		বিদেশ	
		সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী
ক.	প্রশিক্ষণ	৩৭	৮৪৪	৪৪	৭৯
খ.	সেমিনার	৬	৩০৮	-	-

উল্লেখ্য, বাপাউবো'র প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহে Disaster management, Project Management, Construction Management with Quality Assurance, Participatory Water Management & Climate Change, Delta Plan-2100, Sustainable Development Goals, Procurement Management Course, Training on O&M Activities, ICT, e-GP, D-nothi, Auto CAD, iBAS ++ সহ প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে।

বাপাউবো'র প্রকল্পে অর্থায়ন


বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) সরকারের উন্নয়ন ও পরিচালনা বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়ে থাকে। বিগত বছরসমূহে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ, নেদারল্যান্ড সরকার, জাইকা, সিডা, ওপেক, চীন প্রভৃতি উন্নয়ন সহযোগীর কাছ থেকে পানি সম্পদ খাতে ঋণ বা অনুদান সহায়তা পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগী/ দাতা সংস্থাসমূহ কর্তৃক আরোপিত শর্ত সংক্রান্ত কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে বিগত বছরসমূহে এ সাহায্যের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমে এসেছে। বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগই সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হচ্ছে। সংস্থাপন ব্যয় ও সমাপ্ত প্রকল্পের বিদ্যমান অবকাঠামোগুলোর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সরকারের অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেট থেকে আসে। বিগত কয়েক বছরে অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সমাপ্ত প্রকল্পগুলো হতে ঈঙ্গিত সুফল অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) তে বাস্তবায়নাধীন মোট প্রকল্প ছিল ৯৫টি। এডিপিতে বরাদ্দ ছিল ৭৫৮১.৮৩ কোটি টাকা। সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি) তে ২৫টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়ে মোট প্রকল্প সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০টি। তন্মধ্যে ১০৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প (৯৭টি জিওবি ও ৭টি বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট) ও ১৬টি সমীক্ষা প্রকল্প (জিওবি অর্থায়নে ১৪টি এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ২টি)। আরএডিপি বরাদ্দ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় ১২২২০.৯১ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৯০.৮৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.১২%। (বিস্তারিতঃ পরিশিষ্ট-১)। ৩৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। ২০২৩-২৪

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি (বরাদ্দের %)
স্থানীয়	১০৪১৪.১৭	১০১০১.০০	৯৮৭০.০০	৯৪.৭৭%
প্রকল্প সাহায্য	১৮০৬.৭৪	১৮০৬.৭৪	১৬৩২.৬০	৯০.৩৬%
মোট	১২২২০.৬১	১১৭৭২.৩০	১১৫০২.৬৯	৯৪.১২%

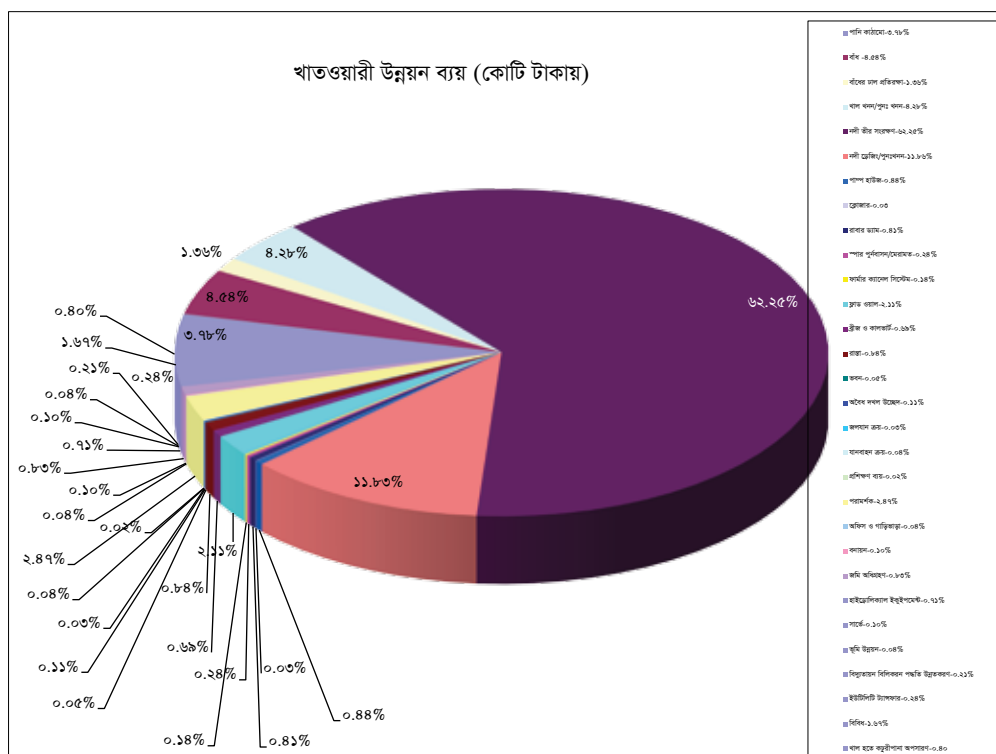

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের আবর্তক ব্যয়ের আওতাধীন পরিচালন ব্যয় বাবদ বাজেট বরাদ্দ ২৪,০৮০,৫৭০,০০০.০০/- টাকা এবং ব্যয় ২২,৭৯৮.৯২৬.৮৬৭.৯৫/- টাকা। পরিচালন বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী নিম্নরূপঃ

ব্যয়ের খাত সমূহের বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ	ব্যয়
১	২	৩
অপারেটিং খরচ		
৩৬৩১১০১-বেতন বাবদ সহায়তা:		
মূল বেতন (অফিসার)	৯৫৬,৪৮৮,০০০.০০	৮৫৫,৬৯৮,৬৬৮.৭৮
মূল বেতন (কর্মচারী)	১,০৭৮,৮৬০,০০০.০০	৮৫৫,৯৫২,০৬০.৭০
বিশেষ সুবিধা	১১০,০০০,০০০.০০	৯২,৩৪০,৮৮৮.৭১
উপমোট-বেতন বাবদ সহায়তা:	২,১৪৫,৩৪৮,০০০.০০	১,৮০৩,৯৯১,৬১৬.১৯
অনুদান, খরচ (বেতন সহায়তা ব্যতীত)		০.০০
৩৬৩১১০২- ভাতাদি বাবদ সহায়তা	১,৫৭৯,৩১৭,০০০.০০	১,২৩৭,৬৪৬,৮৫৫.৪৭
৩৬৩১১০৩- পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা	১৬,৫৪৮,৬০০,০০০.০০	১৬,০৮৫,৪৮০,২০৬.৭২
৩৬৩১১০৪- পেনশন স্কিম বাবদ সহায়তা	৩,২০৩,০০৫,০০০.০০	৩,১৩৩,৬৪৭,৬৮৬.৫৭
৩৬৩১১০৮- গবেষণা অনুদান	৭,৫০০,০০০.০০	৩,০০২,৪১৭.০০
৩৬৩১১৯৯- অন্যান্য অনুদান	৩৪৭,৪০০,০০০.০০	৩১১,২৪৩,৯১০.০০
৩৬৩২১০২- যন্ত্রপাতি অনুদান	১০৯,৮০০,০০০.০০	১০৩,৫৩৬,৪২১.০০
৩৬৩২১০৪- ভবন ও স্থাপনা নির্মাণ অনুদান	৬,০০০,০০০.০০	০.০০
৩৬৩২১০৫- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অনুদান	১২১,৫০০,০০০.০০	১০৯,৮১৫,৮৮০.০০
৩৬৩২১০৬- অন্যান্য মূলধন অনুদান	১২,১০০,০০০.০০	১০,৫৬১,৮৭৫.০০
উপমোট	২১,৯৩৫,২২২,০০০.০০	২০,৯৯৪,৯৩৫,২৫১.৭৬
মোট পরিচালন ব্যয়	২৪,০৮০,৫৭০,০০০.০০	২২,৭৯৮,৯২৬,৮৬৭.৯৫

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে আরএডিপি বরাদ্দ হতে ১৭৭৯.৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা			
১	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৪)	১২৯৯৯১.১৭	১২১১৩০.৯১
২	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় দূর্গাপুর ইউনিয়নের তারাগঞ্জ বাজার এবং সংলগ্ন এলাকা শীতলক্ষ্যা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪)	৩০৭৯.৩০	২৩৮৪.০৮
৩	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচ্চকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪)	৩৫০৩৪.৩৩	৩৪৯৭৪.৭৭
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা			
৪	কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	৭৮৮৫.১৫	৬০৫৬.১৬
৫	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমাৱা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	১২২৪৩.০১	৪১৪.৬৮
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট			
৬	সিলেট জেলায় সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	১৩৫০৪.১৯	১২৩৯৮.৫২
৭	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	১৯১৬৭.২৩	১৪৯৩১.৩৯
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম			
৮	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোন্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোন্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোন্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৪)	৫৭৭২৩.৯২	৫৫৫৩৪.৪৭
উত্তরাঞ্চল, রংপুর			
৯	গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	৪০১৭৫.৯৬	৩৮৮৫৮.৫৫
১০	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪)	৪৯৩৪.৯৫	৪৪২৯.৩৭
১১	নীলফামারী জেলার চাড়ালাকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)	১৬৯১৮.৪১	১৪২৬০.৮২
১২	দিনাজপুর জেলার ঢেপা, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪)	১৮০০৫.৩২	১৭৩৫৭.৬৬
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী			
১৩	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলায় ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	১৭৬৩৬.৪১	১৫৪০২.১৬
১৪	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাসপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ (জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৪)	৪৬৮৯.৮৪	৪৬২৩.৬৭
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর			
১৫	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)	৫৯৬৫২.৮২	৫৮৫০২.৮৪

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	প্রকৃত ব্যয়
১	২	৩	৪
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ			
১৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Jhalakathi, Barguna & Patuakhali District (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	৩২৮০০০.০০	২৮৫৫৩২.৬৭
১৭	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৪)	৩৪৫৬৯.৯৬	৩২৬৬৯.২৫
১৮	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৪)	৫৬২৬৯.০০	৫০৭৩০.৭৭
১৯	Support to Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project Additional Financing in c/w Ensuing Project in Tungipara & Kotalipara Upazila under Gopalganj District. (জুলাই, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	৮৬৪.০০	৮৫৮.০০
২০	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৪)	৯৯৭৫৫.০০	৯৮১৭৭.৩৯
বিশেষ প্রকল্পসমূহ			
২১	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪)	২২৫৬৮৪.৮৮	১৮২৮০০.৫৮
২২	যমুনা নদী সিস্টেমের বামতীরে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেজ-১) (মে, ২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৪)	৪৮১.১৪	৪২২.৪৫
২৩	বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের তথ্যাদি হালনাগাদকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ হতে জানুয়ারি, ২০২৪)	৪৪৭.৫০	৩৬৩.২৬
২৪	নাফ নদীর মোহনার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং শাহ পরীর দ্বীপের ভূমি উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুন, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৩৩২.০০	৩১৩.৩৪
২৫	নোয়াখালী জেলার আওতাধীন হাতিয়া উপজেলাস্থ পোর্ডার নং- ৭৩/১ (এ+বি) এবং ৭৩/২ এর সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪)	৩৮০.০০	৩২৪.৫৪
২৬	কীর্তনখোলা-সুগন্ধা-বিষখালী নদী অববাহিকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪)	৪৫৫.০০	৪২২.৮৩
২৭	Detailed Study for Riverbank Erosion and Sustainable Mitigation Strategies for the Medium Rivers in Bangladesh (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪)	৩৮৮.০০	৩২৭.৮৬
২৮	খুলনা জেলায় দাকোপ উপজেলায় অবস্থিত পোন্ডার-৩১ এর পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা হতে (আগস্ট ২০২২ হতে জুন, ২০২৪)	৪৩৭.০০	৩৯১.৯৩
২৯	যমুনা নদীর চর স্থিতিশীল ও জীবিকায়ন প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (পাইলট স্টাডি: কাউয়াখোলা চর) (জুলাই, ২০২২- জুন, ২০২৪)	৪৯০.০০	৩৮০.৭৯
৩০	বর্ষা বাওর এলাকার পানি, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত সমীক্ষা (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪)	২৩০.০০	২২৩.২৫
৩১	পাবনা জেলার পদ্মা নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা এবং পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের পুনর্বাসন কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুন, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	৪৪২.৫৭	৩৯৭.৩২
৩২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাস্থ মহানন্দা নদী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর জেলাস্থ পদ্মা নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (সেপ্টেম্বর, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	৪৮১.২৫	৪৩৮.৭৪
৩৩	পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (সেপ্টেম্বর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪)	৪৯৭.৭৬	৪৫২.৯৮

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য

➤ ঢাকা- নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

বাস্তবায়নকাল :	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৪
প্রকল্প এলাকা :	ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর, কদমতলী ও ডেমরা থানা এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলা।
প্রাক্কলিত ব্যয় :	১২৯৯৯১.১৭ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয় :	১২১১৩০.৯১ লক্ষ টাকা
অবকাঠামো :	জমি অধিগ্রহণ- ৫.৩৯ হে: পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ২টি পাম্পিং প্ল্যান্ট নির্মাণ- ৩টি আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ- ৬৯টি আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ- ২২টি ক্রস ড্রেইন নির্মাণ- ৫টি নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কি:মি: আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ- ৬৯টি বিদ্যমান ব্রীজ ও কালভার্ট মেরামত- ৫২টি, ওয়াকওয়ে নির্মাণ- ৪৪.০০ কি:মি:

প্রকল্পের সুফল :

- ডিএনডি প্রকল্প এলাকার ডেনেজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন,
- ডিএনডি এলাকার প্রায় বিশ লক্ষ মানুষের জলাবদ্ধতার দূর্ভোগ লাঘব,
- অতি জনগুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর জনবহুল এলাকার জনগণের স্বাভাবিক জীবনমান উন্নয়ন।



পাম্প স্টেশন, শিমরাইল, নারায়ণগঞ্জ



পাম্প স্টেশন, আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জ



ক্রসড্রেন নির্মাণ



আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ

➤ গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (১ম সংশোধিত)।

বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪
প্রকল্প এলাকা	:	গাইবান্ধা
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪০১৭৫.৯৬ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয়	:	৩৮৮৫৮.৫৬ লক্ষ টাকা
অবকাঠামো	:	নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৭১১ কি:মি: বাঁধ পুনর্বাসন- ১৩.০৫ কি:মি:

প্রকল্পের সুফল :

- গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলাধীন কামারজানি ইউনিয়নের গোঘাট এলাকায় ১১২৪ মিটার, সুন্দরগঞ্জ উপজেলার শ্রীপুর নামক স্থানে ২০৬৮.৫৫ মিটার, কাপাসিয়া নামক স্থানে ৯৩২.৩৬ মিটার, লালচামার নামক স্থানে ১২৭৬.৫৪ মিটার, হরিপুর নামক স্থানে ১৩০৯.২৫ মিটারসহ মোট ৬৭১০.৭০ মিটার নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে বিআরই বাঁধ কাম রাস্তা ও সরাই ৬-ভেন্ট রেগুলেটরসহ প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ২৮৬৪৮৫.০০ লক্ষ টাকার স্থাবর সম্পদ যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উন্নয়ন, সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র বিমোচনসহ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে।



বাঁধ পুনর্বাসন কাজ, চন্ডিপুর, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।



তীর প্রতিরক্ষা কাজ, কামারজানি, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা।

➤ Irrigation Management: Improvement Project: (IMIP) for Muhuri Irrigation Project: (MIP) (3rd Revised)

বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২৪
প্রকল্প এলাকা	:	ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলা
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫৬২৬৯.০০ লক্ষ টাকা
প্রকৃত ব্যয়	:	৫০৭৩০.৭৭ লক্ষ টাকা
অবকাঠামো	:	

- উপকূলীয় বাঁধ সংস্কার- ১৭.৭৫ কিলোমিটার
- খাল পুনঃখনন- ৩৭৩ কিলোমিটার
- স্লুইস মেরামত/পুনর্বাসন- ৪টি
- স্লুইস নির্মাণ- ২টি
- পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্বাসন- ৩টি
- পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ- ৪টি
- পাম্প হাউজ নির্মাণ- ৮৫০টি
- হেডার ট্যাংক নির্মাণ- ৮৫০টি
- ভূ গর্ভস্থ সেচ পাইপলাইন নির্মাণ- ৮৫০ কিলোমিটার
- লো-লিফট পাম্প- ৮৯০টি

- প্রিপেইড মিটার- ৮৬০টি
- সেচ পাম্প পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন উন্নীত করণ- ২৮৩ কিলোমিটার (১টি সাবস্টেশন সহ)

প্রকল্পের সুফল :

- মুহুরী সেচ প্রকল্পের পুনঃসংস্কারপূর্বক সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন,
- প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বোত্তম সেচ সুবিধা নিশ্চিত করণ,
- ভূগর্ভস্থ পাইপলাইনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে প্রি-পেইড মিটারিং সিস্টেমে পানির লস কমিয়ে ইকোনমিক সেচ ব্যবস্থা চালু করণ।



ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন



পাম্প হাউজ ও হেডার ট্যাংক



নির্মিত স্লুইস (সোনাগাজী, ফেনী)



পাম্প হাউজ

২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

➤ সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার নং-১৫ পুনর্বাসন

বাস্তবায়নকাল :	অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫
প্রকল্প এলাকা :	সাতক্ষীর জেলার শ্যামনগর উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় :	১০২০৪২.৯২ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি :	২৪.২০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :	

- টেকসই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ইউনিয়নের ৩৪৪১ হেক্টর এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে পোল্ডার অভ্যন্তরস্থ লোকজনকে রক্ষা করা এবং উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- নিক্ষেপন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা;
- প্রকল্পের মাধ্যমে পোল্ডারিং ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করে বিদ্যমান কৃষি/মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

- বাঁধ পুনর্বাসন কাজ-০.৬০০ কি:মি: (আং-৮০%)
- বাঁধ পুনর্বাসনসহ বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ২১.০৮১ কি: মি: (আং-১১.১৫%)

- বাঁধ পুনর্বাসনসহ নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ৭.৮১৯ কি:মি: (আং-১৯%)
- নিষ্কাশন খাল পুন:খনন-২২.৫০০ কি:মি: (আং-৩৫%)
- ইনলেট নির্মাণ- ৯টি (আং-৩৫%)

➤ **পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**

বাস্তবায়নকাল :	জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৪ খ্রিঃ
প্রকল্প এলাকা :	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় :	৪৩৭৭১.১৮ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি :	৯০.০০%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :	

- নদীতীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন রোধ এবং বন্যা প্রতিরোধ;
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা;
- পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা করা;
- বাঁধের উপর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- আনুমানিক ২৬৬৩৭৭.৯০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রক্ষা করা।

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

- নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ২.০০ কি:মি:
- বাঁধ মেরামত- ১.৭০ কি:মি:

➤ **মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদের তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প**

বাস্তবায়নকাল :	জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ খ্রিঃ
প্রকল্প এলাকা :	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় :	৪০৪২৮.২৪ লক্ষ টাকা
বাস্তব অগ্রগতি :	৮১.৮৬%
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :	

- নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন রোধ এবং বন্যা প্রতিরোধ;
- নদী ড্রেজিং দ্বারা নদীর প্রবাহ/নাব্যতা স্বাভাবিক রাখা।

২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ :

- নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৩.৮০০ কি:মি:
- নদী ড্রেজিং-৩.০০০ কি:মি:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে অনুমোদিত উল্লেখযোগ্য নতুন প্রকল্পসমূহ

➤ **পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন তালবাড়িয়া এবং কুমারখালী উপজেলাধীন শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি এলাকা রক্ষা প্রকল্প**

বাস্তবায়নকাল :	অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬ খ্রিঃ
প্রকল্প এলাকা :	কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর ও কুমারখালী উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় :	১৪৭১৯৮.০০ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ :	৩১-১০-২০২৩ খ্রিঃ
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :	

- কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন তালবাড়িয়ার এলাকায় ৯.০০ কি:মি: স্থায়ী নদীর তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে কুষ্টিয়া-পাবনা/রাজশাহী ও কুষ্টিয়া-ঢাকা মহাসড়ক, জাতীয় গ্রীড লাইন, জনসাধারণের ঘরবাড়ী, স্কুল, কলেজ, হাট-বাজার, রাস্তাঘাট, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন অবকাঠামোসহ বিপুল পরিমাণ কৃষি জমি নদী ভাঙ্গনের কবল হতে সুরক্ষা;
- কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলাধীন শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি এলাকায় ১.৫৩ কি:মি: সতর্কতামূলক

প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ী সংলগ্ন এলাকা ও সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন অবকাঠামো নদী ভাঙ্গনের কবল হতে সুরক্ষা প্রদান;।

- বাংলাদেশের বৃহৎ জিকে সেচ প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা এবং এলাকা বন্যা মুক্ত রাখা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ :

- নদী তীর প্রতিরক্ষাকাজ - ৯.০০ কি:মি:
- সতর্কতামূলক প্রতিরক্ষা কাজ - ১.৫৩ কি:মি:

➤ **পাবনা জেলার ইছামতি নদী পুনরুজ্জীবিতকরণ**

বাস্তবায়নকাল : নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ হতে জুন, ২০২৭ খ্রিঃ

প্রকল্প এলাকা : পাবনা জেলা

প্রকল্প ব্যয় : ১৫৫৪৯০.০০ লক্ষ টাকা

অনুমোদন তারিখ : ০৭-১২-২০২৩ খ্রিঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ইছামতি নদী ও সংযোগ খাল উন্নয়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা;
- প্রকল্প এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির পুনঃভরনের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধিকরণ;
- প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- ইছামতি নদী ও সংযোগ খালের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করে টেকসই কৃষির সম্প্রসারণ;
- প্রকল্প এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন;
- ইছামতি নদী সংযোগ খালের অভ্যন্তরে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; এবং
- দর্শনার্থী আকৃষ্ট করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাটিকে পর্যটন এলাকায় রূপান্তর।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ :

- ইছামতি নদী পুনঃখনন কাজ - ৩৩.৭৭২ কি:মি:
- ইছামতি নদীর দুই পাড়ে রিটেইনিং ওয়ার নির্মাণ - ১০.০০ কি:মি:
- ইছামতি নদীর দুই পাড়ে ড্রেন নির্মাণ - ১০.০০ কি:মি:
- ইছামতি নদীর সংযোগ খাল পুনঃখনন - ৪৪.০৭২ কি:মি:,
- ব্রীজ অপসারণ - ২০টি
- ব্রীজ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ - ২৩টি
- সুতিখালি নদীর কাজ - ২০.০০ কি:মি:
- ইছামতি নদী ও সংযোগ খাল মেইনটেনেন্স ড্রেজিং/ পুনঃখনন কাজ - ৭৭.২১৬ কি:মি:
- রামচন্দ্রপুর (৫-ভেন্ট) রেগুলেটর পুনঃনির্মাণ - ০১ টি নেভিগেশন লকসহ
- ভারারা (২-ভেন্ট) ও সুতিখালি (১২-ভেন্ট) রেগুলেটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ - ২টি
- ভারারা খাল পুনঃখনন কাজ - ১২.৩৭২ কি:মি:
- ঘাটলা নির্মাণ - ৫৬টি
- বৃক্ষরোপণ - ৪২৩১০টি

➤ **মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলা রক্ষা**

বাস্তবায়নকাল : অক্টোবর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৭

প্রকল্প এলাকা : চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলা

প্রকল্প ব্যয় : ৫৫৭৩৮.৬৯ লক্ষ টাকা

অনুমোদন তারিখ : ০৯-১১-২০২৩ খ্রিঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- নদীভাঙ্গন প্রতিরোধ;
- সাইক্লোন মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রকল্প এলাকার বন্যা ব্যবস্থাপনা সুদৃঢ়করণ;
- লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি;

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ :

- নদী তীর সংরক্ষণ-৪.০০ কি:মি:

- বিদ্যমান নদী তীর সংরক্ষণ কাজ শক্তিশালীকরণ-৩.০০ কি:মি:
- উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন- ৫.৫০ কি:মি:

➤ দক্ষিণ চট্টগ্রামের বাঁশখালী ও আনোয়ারা উপজেলায় টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম পর্যায়)

বাস্তবায়নকাল :	মে, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৭
প্রকল্প এলাকা :	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী ও আনোয়ারা উপজেলা
প্রকল্প ব্যয় :	৮৭৪৫৭.০০ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ :	২৮-০৫-২০২৪ খ্রিঃ
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :	

- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও ঢাল সংরক্ষণের মাধ্যমে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের বিরূপ প্রভাব থেকে প্রকল্প এলাকা রক্ষা; নদী তীর প্রতিরক্ষার মাধ্যমে আকস্মিক বন্যা ও পাহাড়ী ঢলে প্রকল্প এলাকায় অব্যাহত ভাঙ্গন রোধ;
- বাঁধের ঢালে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণের বসত- বাড়ি, বাজার-ঘাট ও অতি উর্বর আবাদি কৃষি জমিসহ সরকারী-বেসরকারী বহু মূল্যবান স্থাপনা বন্যার কবল হতে রক্ষা;
- প্রকল্প এলাকায় সামগ্রিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থায়ী ও অধিক বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা বলয় সুদৃঢ়করণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন সাধন করা;
- প্রকল্প এলাকায় লবন পানি ও মিষ্টি পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে কৃষি চাষ, মৎস্য চাষ ও লবণ চাষ বৃদ্ধি করা।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ :

- নদী তীর সংরক্ষণ-১.১০ কি:মি:
- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও ঢাল সংরক্ষণ কাজ-১১.৫৮৫ কি:মি:

➤ যমুনা নদী টেকসই ব্যবস্থাপনা প্রকল্প-১: নদীতীর সংরক্ষণ ও নদী শাসন (কম্পোনেন্ট-১)

বাস্তবায়নকাল :	সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৭
প্রকল্প এলাকা :	সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল জেলা।
প্রকল্প ব্যয় :	৮৭৩২৮.০০ লক্ষ টাকা
অনুমোদন তারিখ :	৩১-১০-২০২৩ খ্রিঃ
প্রকল্পের উদ্দেশ্য :	

- নির্বাচিত ২টি স্থান (ফুলছড়ি ও কালিহাতী উপজেলা) নদী তীর ভাঙন হতে রক্ষাকরণ এবং কাওয়াখোলা (সিরাজগঞ্জ) চর স্থিতিশীল করার জন্য সমন্বিত কাঠামোগত ও অকাঠামোগত ঝুঁকি প্রশমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
- যমুনা নদী ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত কাঠামোগত ব্যবস্থা চিহ্নিত করা;
- ভূমি ও সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি প্রশমনের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটানো, কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, জনগণ ও প্রাণী সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান;
- জাতীয় পর্যায়ে নদী ব্যবস্থাপনা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন;
- মাস্টারপ্ল্যানের আলোকে যমুনা নদীর টেকসই ব্যবস্থাপনা ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য উপযুক্ত এবং কার্যকরী কৌশল নির্ধারণ।
- নদী তীর সংরক্ষণ, নদী ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। নদী ভাঙন এবং বন্যার ঝুঁকির বর্তমান পরিস্থিতির সাথে তুলনামূলক বিবেচনায় নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি অর্জন করা সম্ভব হবে।
- প্রায় ৫০০ হেক্টর জমি নদীভাঙন এবং প্লাবনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হবে;
- প্রায় ২০০ হেক্টর গ্রামীণ বসতি এলাকা এবং ৩০০ হেক্টর কৃষি জমি নদীভাঙন থেকে রক্ষা পাবে;
- প্রায় ১২,৫০০ টি পরিবার নদী ভাঙন কবলিত আনুমানিক ৫০,০০০ জন মানুষ ভূমি ক্ষয়ের সৃষ্ট দুর্যোগের ফলে ঘর-বাড়ি স্থানান্তর থেকে রক্ষা পাবে;
- বার্ষিক বন্যার ক্ষয়ক্ষতি এবং দুর্যোগের ত্রাণ খরচহ্রাস পাবে।

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়িতব্য ভৌত কার্যক্রমসমূহ :

- নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ
- ফুলছড়িতে ২.৪৩ কি:মি: ও কালিহাতিতে ১.৬২৫ কি:মি:
- টপগ্রাফ পার্মিয়েবল গ্রোয়েন নির্মান
- ফুলছড়িতে ৫টি ও কালিহাতিতে ৬টি
- বনায়ন
- ২৫০০টি।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় গৃহিত প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (সিসিটিএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প গ্রহণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০০৯-১০ হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাপাউবোর ১৩৭টি প্রকল্পের জন্য অনুমোদন আদেশ জারি করা হয় যার মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১১১৬.৫১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে, জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ১৩২ টি প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ৫ টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২)। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরাঞ্চলে পোল্ডার/বাঁধ নির্মাণ/মেরামত, ভূমি পুনরুদ্ধারে ক্রসড্যাম নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ এবং নদী/খাল পুনঃখনন ইত্যাদি। উক্ত প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের উপকারভোগী জনগন বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাপাউবো কর্তৃক ১ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মূল অনুমোদিত মেয়াদ/ সংশোধিত মেয়াদ
১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার অন্তর্গত নান্দাইল পৌর এলাকার নরসুন্দা নদীর বামতীরে চারানীপাড়া দরগা হতে আচারগাঁও ব্রীজ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা।	২০০.০০	ডিসেম্বর/১৭ হতে জুন/১৮ পর্যন্ত, সংশোধিত মেয়াদ: ডিসেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত।

বাপাউবোর আগামী ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প, উদ্দেশ্য, পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতি, আইন, বিধিমালা, নির্দেশিকা, কৌশল, পরিকল্পনা (ব-দ্বীপ, প্রেক্ষিত, পঞ্চ-বার্ষিকী), নির্বাচনী ইশতেহার ইত্যাদি পর্যালোচনার ভিত্তিতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাপাউবো কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহের আওতায় সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, মোহনা, সমুদ্র ও নদী হতে ভূমি উদ্ধার, নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় এলাকায় অবকাঠামোসমূহ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্যাটাগরীতে শ্রেণীবিভক্ত করে আগামী ২৫ বছরের জন্য প্রকল্পের খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পগুলো পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের নিমিত্তে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বিন্যস্ত করা হয়েছে। স্বল্প মেয়াদভূক্ত কার্যক্রমসমূহ আগামী আট বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদের আওতাধীন কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে ১৫ বছর ও ২৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমসমূহ পর্যাবৃত্তে পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে। যে সমস্ত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়নি অথবা দীর্ঘ দিন আগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদিত হয়েছে সেগুলো নতুন করে সমীক্ষা করা সমীচীন।


আগামী ২৫ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাপাউবো কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম সমূহের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হলো। উল্লেখ্য কিছু প্রকল্প স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কার্যক্রমের বিস্তারিত ছক-১ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্পের সংখ্যা	অগ্রাধিকার		
		স্বল্প মেয়াদী	মধ্য মেয়াদী	দীর্ঘ মেয়াদী
নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (ড্রেজিং, নদী তীরসুরক্ষা, প্লাবনভূমির সাথে সংযোগ)	১৫৭	১৪৫	২২	৪
ভূমি পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন প্রকল্প	২০	১৫	১২	৩
সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প	৪৪	৩৩	১৯	৬
সেচ প্রকল্প (নতুন ও পুনর্বাসন)	২৭	২৫	৩	১
জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন এবং ইকোসিস্টেম পুনরুদ্ধার প্রকল্প	২৫	২২	১০	৪
উপকূলীয় পোল্ডারদের পুনর্বাসন	২৬	২২	৬	১
হাওর পুনর্বাসন প্রকল্প	২১	১৮	১৬	৪
অন্যান্য প্রকল্প	২৪	২২	৩	১
মোট	৩৪৪	৩০২	৯১	২৪

উল্লেখ্য, প্রণীত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ এর সাথে সামঞ্জস্যতা নিরূপণ করা হয়েছে। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর ছয়টি অভীষ্টসমূহ হলো (১) বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় হতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, (২) পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও পানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, (৩) সমন্বিত ও টেকসই নদী ও মোহনা ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, (৪) জলাভূমি ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং তাঁদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, (৫) অন্তঃ ও আন্তঃদেশীয় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকরী প্রতিষ্ঠান ও ন্যায়সঙ্গত সুশাসন গড়ে তোলা, (৬) ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রূপান্তরিত “আমাদের পৃথিবী: ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডিজি” শিরোনামে গৃহীত প্রস্তাবনা অনুমোদন হয়েছে। জাতিসংঘের সারাবিশ্বের উন্নয়ন টেকসই করতে ১৭ টি অভীষ্ট লক্ষ্য (এসডিজি) নির্ধারণ করেছে। ২০৩০ সাল নাগাদ জাতিসংঘ ঘোষিত ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন বিবেচনায় ফলপ্রসূ বাস্তবায়নকে গুরুত্ব দিয়ে খাতভিত্তিক জাতীয় ও বৈশ্বিক লক্ষ্য এবং পরিকল্পনাসমূহকে দীর্ঘমেয়াদী সংহত কৌশলের সাথে সমন্বয় করার চ্যালেঞ্জ সরকার গ্রহণ করেছে। এসডিজির এই চ্যালেঞ্জ উত্তরণে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ১টি টার্গেট (৬.৫-সূচক ৬.৫.১, ৬.৫.২) অর্জনে লীড, ২টি সূচক (সূচক ৬.৬.১, ৬.৬.২) অর্জনে কো-লীড এবং ২০টি টার্গেট অর্জনে এসোসিয়েট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা, দপ্তর, অধিদপ্তর সমূহে তথ্য-উপাত্ত প্রদানের পাশাপাশি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্রিয়

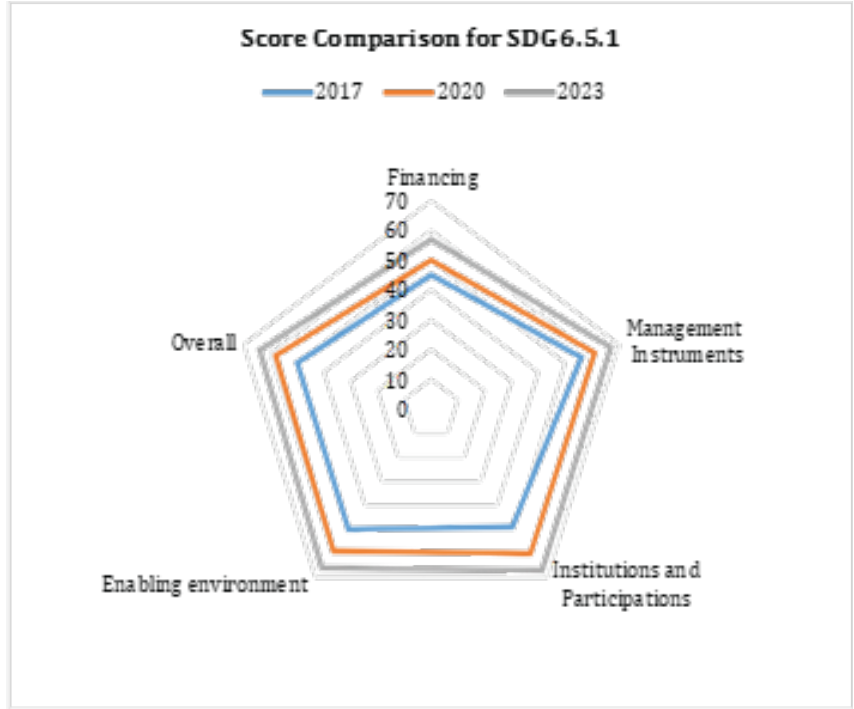

চিত্র ১- ২০১৭, ২০২০ এবং ২০২৩ সনের বাংলাদেশের স্কোরের তুলনা

অংশগ্রহণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে মানুষের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে এসডিজি-৬ অর্জনে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থাসমূহ নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও SDG Mapping অনুসারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জন্য নির্ধারিত টার্গেট ৬.৫-এর অধীন ইনডিকেটর ৬.৫.১ (Degree of integrated water resources management implementation (0-100)) এবং ইনডিকেটর ৬.৫.২ (Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for water cooperation) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে জাতিসংঘ, SDG Tracker-এ আপলোড করার নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-তে দাখিল করা হচ্ছে। SDG 6.5.1 (সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা) সূচকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রয়াসে বাংলাদেশ এ সংক্রান্ত জাতিসংঘের সর্বশেষ প্রতিবেদন (UN Water 2021) এশিয়ায় সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করেছে। ২০১৭ সালে UNEP প্রণীত গাইডলাইন অনুসারে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ৫০। ২০২০ সালের অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী আমাদের স্কোর ৫৮ (চিত্র-১), যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ইনডিকেটর ৬.৫.১ অর্জনের জন্য ২০১৬ সালে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ও ২০১৭ সালে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বৈজলাইন প্রতিষ্ঠা করে। ২০২০ সালের IWRM implementation অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং ২০২২ সালে পুনরায় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সম্ভ্রুতি ২০২৩ সালের IWRM implementation অগ্রগতি প্রতিবেদনে সমন্বিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা (IWRM Action Plan) প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২৩ সালের অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের স্কোর ৬৪।



এসডিজি'র অভীষ্টের সহিত বাপাউবো'র প্রকল্পসমূহের সমন্বয়:


পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রধান এবং একমাত্র বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ, নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন ইত্যাদি বিষয়ে বাপাউবো প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালনা করে দেশব্যাপী সেচ, জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা প্রতিরোধ, নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ, ব-দ্বীপ উন্নয়ন ও ভূমি পুনরুদ্ধার, নদ-নদীর নাব্যতা ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, দেশব্যাপী বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সেবাও বাপাউবো প্রদান করে থাকে। বাপাউবো'র বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প এসডিজি'র যে সকল লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ তা নিম্নলিখিত ছকে উল্লেখ করা হলো।

ক্রমিক	প্রকল্পের ধরণ	এসডিজি
০১	সেচ প্রকল্প	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৫.১
০২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৫.১
০৩	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৫.১
০৪	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন, সেচ ও ড্রেজিং	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১
০৫	রিভার ম্যানেজমেন্ট/নদী ব্যবস্থাপনা	১.৫, ২.৪, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৫.১
০৬	নদী পুনরুদ্ধার	১.৫, ৬.৩, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৫.১
০৭	সম্মিলিত পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা	১.৫, ২.৩, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১, ১৫.৩
০৮	ড্রেজিং/খনন	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৫.১
০৯	প্রতিরক্ষা/নদী তীর সংরক্ষণ কাজ	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১২.২
১০	উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন / হাওড় ব্যবস্থাপনা	১.৫, ২.৪, ৫.৫, ৬.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৩.১, ১৪.১, ১৪.২, ১৫.১
১১	পোন্ডার পুনর্বাসন	১.৫, ২.৪, ৬.৫, ৬.৬, ১২.২, ১৩.১, ১৫.১
১২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন	১.৫, ২.৪, ৫.৫, ৬.৫, ৬.৬, ১১.৫, ১৩.১, ১৪.১, ১৪.২, ১৫.১
১৩	ক্রস ড্যাম নির্মাণ	১.৫, ২.৩, ৬.৫, ৬.৬, ১৩.১, ১৫.৩
১৪	অন্যান্য প্রকল্প	৬.৫

প্রকৃতি নির্ভর পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Nature Based Solution)

দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, নদী/খালের তীরে এবং বাঁধে পরিকল্পিত বনায়ন থাকলে নদী/খালের পাড়ের মাটির গড়ন এবং মাটির বাঁধের স্থায়িত্ব অনেক মজবুত হয়। এমতাবস্থায়, প্রতিরক্ষা কাজের ব্যয় সাশ্রয় করে নদী/খালের তীরে ও বাঁধের ঢালে পরিকল্পিত বনায়ন করে পাড় ও বাঁধ সমূহকে প্রাকৃতিক উপায়ে মজবুত করে পানির ঢেউয়ের আঘাত সহনীয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে সকল বাঁধ নির্মাণ/পুনর্বাসন/মেরামতধর্মী প্রকল্পে এবং নদী/খাল খননধর্মী প্রকল্পে আবশ্যিকভাবে পরিকল্পিত বনায়ন করার সংস্থান রাখা হচ্ছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সংস্থাসমূহ দেশব্যাপী অফিস প্রাঙ্গন, চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ছাড়াও স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রের বাঁধ ও অন্যান্য খোলা জায়গাসমূহে অধিক সংখ্যক বনজ, ফলজ ও ভেষজ গাছ পরিকল্পিত উপায়ে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে প্রায় ১১ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করা হয়।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে Drainage খাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের পাশাপাশি ঐ পানি দ্বারা irrigation-কে বিবেচনায় নিয়ে ডিজাইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া খাল, বিল ও নিচু এলাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রাখার মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এর recharge নিশ্চিত করা যাচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দীঘি খনন এবং pond sand filter প্লান্ট নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

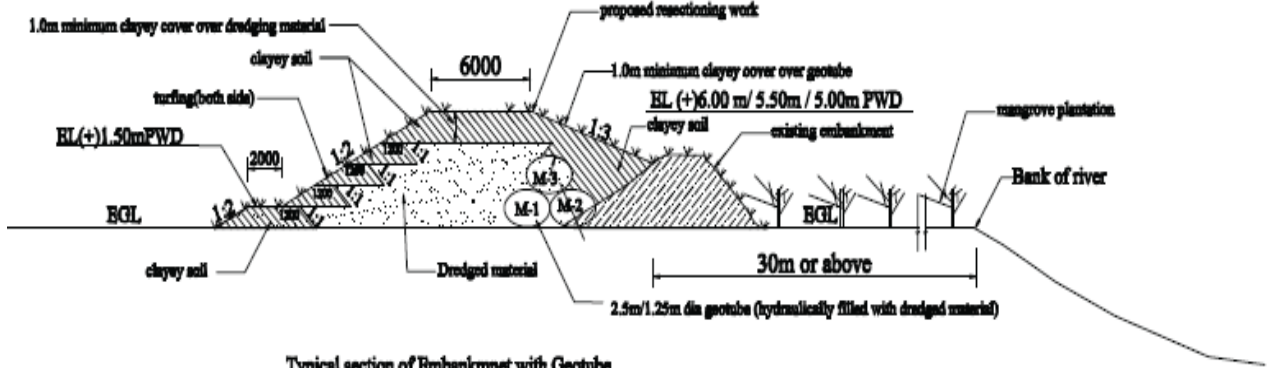

Typical section of Embankment with Geotube
(Applicable where dredged material is available near site or use of dredged material is feasible as per site condition)

বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের সেচ প্রকল্পের অবদানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কৃষি ও পরিবেশ

বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক ও কৃষি প্রধান দেশ। এ কারণে কৃষিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন্যা, অতি বৃষ্টিজনিত আগাম বন্যা, জলাবদ্ধতা, ফসলি জমিতে লোনা পানি প্রবেশ, খরা, সেচ সুবিধার অভাব, ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। কৃষি উন্নয়নের জন্য পানি সম্পদের উন্নয়ন অপরিহার্য। বাপাউবোর ভিশন অনুযায়ী দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন সাধন; বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা, আন্তর্জাতিক নদীর প্রবাহ, লবণাক্ততা, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন করা এবং বাপাউবোর মিশন অনুযায়ী জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি পরিকল্পনা, অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন এবং বাপাউবোর্ড আইন অনুসারে দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সহ মাঝারী এবং বড় (১০০১ হেক্টর বা তদুর্ধ্ব) প্রকল্প সমূহে স্থানীয় সংগঠনের সমন্বয়ে যৌথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিশেষ করে (ক) সমাজের সকল স্তর, শ্রেনী ও পেশার লোকজনের অংশগ্রহণ ও জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করা, (খ) দারিদ্রতা হ্রাস গ) খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান ঘ) পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন কৌশল অনুসরণ করা বাপাউবোর্ড এর কর্মকান্ডের আওতাভুক্ত। এরই আলোকে বাপাউবোর্ড সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে জনগনের অংশগ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন সহ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করতঃ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ১০০৩ টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৩৬টি (৩৯৫ টি FCD ও ১৪১ টি FCDI প্রকল্প) প্রকল্প হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচধর্মী প্রকল্প। এসব প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১১৪.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন উদ্ধৃত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাপাউবোর্ডের প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি ৯.৭৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে (৩টি ফসল মৌসুমে) সেচ প্রদান করা সম্ভব হয়েছে যা জাতীয় সেচকৃত এলাকার ১২.৪১%। বাপাউবোর বাস্তবায়িত প্রকল্পের মধ্যে ৫৩টি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানিতে সেচ প্রদানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে যা মাটির উর্বরতা ও পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখছে। এসব সেচ প্রকল্পে ব্যারেজ বা পাম্পের সাহায্যে ড্যাম থেকে/উৎস থেকে গ্রাভিটি ফ্লো পদ্ধতিতে (Gravity flow) সেচ খালের মাধ্যমে কৃষকের জমিতে সেচ সরবরাহ করা হয়। উক্ত ৫৩টি সেচ প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকা হচ্ছে ১১,২১,৩৭৩ হেক্টর, সেচযোগ্য এলাকা ৫,২০,১৭৭ হেক্টর এবং সেচকৃত এলাকা ৩,৮৬,৬৬৩ হেক্টর। এ ৫৩টি প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত ও সাফল্য অর্জন নিয়েই প্রকাশিত হয়েছে ২০২৩-২৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন যা বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তথ্যের উৎস হিসাবে ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, দেশের শিল্প ও বানিজ্য কেন্দ্র, শহর বন্দর, কৃষিযোগ্য জমি সীমান্ত বরাবর প্রবাহমান নদীসমূহ ভাঙ্গনের কবল থেকে বাংলাদেশের ভূখন্ড নদীর ভাঙ্গন থেকে রক্ষা কাজেও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বদা নিয়োজিত।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের রুটিন কার্যক্রম

২০২৩-২৪ সালের ফসল ও সেচ কার্যক্রমের অগ্রগতি

২০২৩-২৪ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি শস্য মৌসুমে ২৫.০৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল ও ১০.৫১ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন ২০২৪, পর্যন্ত ২৪.৩১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফসল চাষাবাদ ও ৯.৭৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহে প্রধান ফসল হিসাবে ধান, গম ও ভুট্টা আবাদ হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রকল্পসমূহ তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল সহ শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন সবজি আবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে আসছে। চাহিদা মারফিক সেচ সুবিধা থাকায় শস্যবহুমুখীকরণের পাশাপাশি শস্যের নিবিড়তাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপ

হেক্টর

ক্রঃ নং	জোন	প্রকল্পের সংখ্যা	আওতাভুক্ত এলাকা	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা এলাকা	সেচযোগ্য এলাকা	তিন মৌসুমের মোট লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য				মন্তব্য
						ফসল		সেচ		
						লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	উত্তরাঞ্চল (রংপুর)	২১	১৮৯২৫১	১৬৫৫৪৩	১২৭৯৩২	৩৮৮৪৪৫	৩৯১২৪৪	২০৮৮৮৮	১৭১৬১২	
২	উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল (রাজশাহী)	১১	২১৯৭৫২	১৮৬৪৫২	১২৯৫৪১	২৮৮০১৮	২৮৪৬৯৬	১৯৬৪৩১	১৯৪৯৪৫	
৩	পশ্চিমাঞ্চল (ফরিদপুর)	১১	২৮১৮৮৭	১৭৩৯৪৫	১৬৭৪৫৭	৩০৪৪৪২	২৬৬৫৪৬	৮৩৬৫৯	৬৪৭৯১	
৪	দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল (খুলনা)	৫	১৯৯৮৯১	১৫৩৪৩৫	১৩৯১১১	২৮৭৫২৯	২৮০১৩৪	১৭৫৩৫০	১৬৫৪৪৪	
৫	দক্ষিণাঞ্চল (বরিশাল)	৭	৪৯৯০১১	৪৮৩০১১	১৫৫২৬৪	৪৭৩৮৫৪	৪৭৩৯৫৪	১০১৮০১	১০১৭০৬	
৬	কেন্দ্রীয় অঞ্চল (ঢাকা)	৫২	২৫১০৫৮	২৪৬৩২৩	১৭৫৬৫২	৩৫৭৪৯৯	৩৫৫৭২২	১৬৯৭০১	১৬৭৮৯৮	
৭	পূর্বাঞ্চল (কুমিল্লা)	১০	২১২৫০৮	১৪২৭৯৮	১০৩৫৯৪	১৭৮৪৯৪	১৬৫৬৮১	৫৭৫৩৩	৫৪১৫৪	
৮	উত্তর-পূর্বাঞ্চল (সিলেট)	৪	১১৬৪৯২	২৭৫৪৯	৪১৮৬১	১০৬১৩০	৯৭৭৪২	২৩৪৫০	২৩১৮৫	
৯	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম)	২০	৯৭৭১২	৬৯৯৪৪	৪৮১৮৫	১২১১৭৯	১১৫৩২৭	৩৪৯৪০	৩৪৬০০	
	সর্বমোট :	১৪১	২০৬৭৫৬২	১৬৪৯০০০	১০৮৮৫৯৭	২৫০৫৫৯০	২৪৩১০৪৬	১০৫১৭৫৩	৯৭৮৩৩৫	

(১৪১টি সেচধর্মী প্রকল্পের মধ্যে ৫৩টি সেচ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে)

সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (জুন, ২০২৪ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
১।	পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা।	মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প	৩৬.৮২০	৩৭.৪১০	৮.৫৭৪	৭.৮৬৮	১৬.৪৪২	*মহুরী সেচ প্রকল্পের সেচ সার্ভিস চার্জ ২০১৫-১৬ হতে বাপাউবোর ইমিপি প্রকল্পের নিয়মে চলমান আছে।
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫৮.০০	৫৮.০০	৪.৪৭৮	৪.৫৩১	৯.০০৮	
		সুন্দলপুর সেচ প্রকল্প	০.২৫০	০.২৫০	০.০৭০	০.০০০	০.০৭০	
২।	দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম।	মুহুরী সেচ প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	
		কর্তফুলী সেচ প্রকল্প	২.০০০	২.০০০	১.৮১	১.৭৭০	৩.৮৫০	
		হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প	০.১০০	০.১০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	

ক্রঃ নং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা		সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	ক্রমপুঞ্জিত আদায়	মন্তব্য
৩।	উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী।	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৩৫.১২৩	৩৫.৫১২	১.৫১৯	২.০৩৩	৩.৬৮০	
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর।	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৪৪৯.৫৪০	৫১১.২৯০	২০.৮২	২৩.২১০	৪৪.২৬০	**বুড়ি তিস্তা প্রকল্পে মামলা চলমান থাকায় সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম বর্তমানে বন্ধ রয়েছে।*** এনএনআইপি'র ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ লক্ষ্যমাত্রা এখনো নির্ধারন হয়নি।
		টাক্সন বাঁধ প্রকল্প	০.১০০	০.১২০	০.৩০০	০.২১০	০.৩৩০	
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০০০	০.০০০	০.১২০	০.০০০	০.০০০	
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন. এন. আই. পি. (ব্লক এ-১)	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	১.৫৭৬	
৬।	পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর।	জি-কে সেচ প্রকল্প	২৬৪.৯৮০	১৬০.৮১৬	১৪.৪৫২	৫.১১৫	১৯.৫৬৭	
৭।	উত্তর- পূর্বাঞ্চল, সিলেট।	মনুনদী সেচ প্রকল্প	৭৫.৮৯	০.৫০০	০.৩৫০	০.২৪৫	০.৫৯৫	
	মোট	১৩ টি প্রকল্প	৯২২.৮০৩	৮০৬.২০৮	৫২.৪২৩	৪৪.৯৮২	৯৯.৩৭৮	

২০২২-২০২৩ সাল		২০২৩-২০২৪ সাল	
মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি	মোট লক্ষ্যমাত্রা	মোট প্রাপ্তি
৯২২.৮০৩	৫২.৪২৩	৮০৬.২০৮	৪৪.৯৮২

মন্তব্য: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বকেয়া সেচ সার্ভিস চার্জ আদায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা জুন ২০২৫ খ্রিঃ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

পানি ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম

বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচ্ছে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীন বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG), পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA) ও পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF) নামে তিন স্তরভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) গঠন করা হচ্ছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ বাপাউবো এর বিভিন্ন প্রকল্পে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা সহ সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবদান রাখছে। বাপাউবো কর্তৃক গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহকে সেচ অবকাঠামোর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংগঠনের সদস্যদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সংগঠন সমূহকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদেরকে টেকসই অবস্থায় নেয়ার জন্য বাপাউবো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। “অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৪” এর আলোকে বাপাউবোর্ডের অধীন ১৫৫টি বাস্তবায়িত প্রকল্প/উপ-প্রকল্প/স্কিম ও পোল্ডার সমূহে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহ এর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ উন্নয়ন ও আইনগত অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলমান।

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন-নিবন্ধনের তথ্যাদি (জুন-২০২৪ পর্যন্ত)

প্রকল্পের সংখ্যা (পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠিত)	আওতাভুক্ত এলাকা (হেক্টর)	পানি ব্যবস্থাপনা দল		পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন		পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন	
		গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন	গঠন	নিবন্ধন
১৫৫	২২,৮১,৮৪১	৩৩৮৪	৩১৭৯	৩০৬	২৯৩	৫	৪

বালিয়াডাঙ্গী খামার সম্পর্কিত প্রতিবেদন

বালিয়াডাঙ্গী প্রদর্শনী খামারটি ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা সদরে ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গী হাইওয়ে সংলগ্ন বালিয়াডাঙ্গী নামক স্থানে অবস্থিত। ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন ইপি-ওয়াপদা (বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) তদানীন্তন মঙ্গাপীড়িত উত্তরাঞ্চলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রদর্শনী খামার ব্যবস্থাপনার জন্য ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় ১৮১২ খতিয়ানে ১.৪৫ একর জমি বাপাউবোর সাবেক “ভূমি ও পানি ব্যবহার পরিদপ্তর” (বর্তমানে “প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা”র দপ্তর) এর নামে ক্রয় করা হয়। উক্ত প্রদর্শনী খামারটিতে শুরু থেকেই সেচের পানির অপচয় রোধ, স্বল্প পানিতে অধিক ফসল চাষে পরামর্শ প্রদান সর্বোপরি ঠাকুরগাঁও গভীর নলকূপ সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর থেকে প্রকল্প এলাকার মাটি ও কৃষি আবহাওয়া উপযোগী উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের আধুনিক ধানসহ মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন জাতের শাক-সজির পরীক্ষামূলক চাষাবাদ, শস্য বিন্যাস, ফসলের জাত নির্বাচন ও পরীক্ষামূলক সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে ভৌগলিক পরিবেশের উপর ভিত্তি করে বালিয়াডাঙ্গী খামার স্থাপিত হয়।

২) পরবর্তীতে ২০০০ সালের দিকে জনবলের স্বল্পতাহেতু প্রদর্শনী খামারটির কার্যক্রম কিছুটা হ্রাস পায়। সাম্প্রতিককালে উক্ত খামারের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রদর্শনী খামার অর্থ কোডে ২,১৫,০০০/- (দুই লক্ষ পনের হাজার) টাকা বোর্ড হতে বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে উক্ত অর্থ দিয়ে খামারটির উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ০.৭০ একর জমিতে বোরো ধান, আমন ধান আবাদ করা হয়। প্রদর্শনী খামারটি চাষের সুবিধার্থে কয়েকটি ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে পরীক্ষামূলকভাবে উফশী ধান, আধুনিক জাতের মিষ্টি কুমড়া, মরিচ, শশা ও বেগুন চাষ করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ঠাকুরগাঁও জেলাধীন হরিপুর, রাণীসংকৈল ও বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় ০৩টি এফসিডিআই প্রকল্প এবং টাংগন ব্যারেজ, বুড়িবাঁধ ও ভুল্লিবাঁধ প্রকল্পে সম্পূরক সেচের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সেচের পানির সুষ্ঠু ব্যবহার করে এবং সেচের পানির অপচয় রোধকল্পে প্রকল্পের জনগনকে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকল্প পরিচালনার স্বার্থে Advance Cropping pattern and Improved Water management বিষয়ে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে IoT Based আধুনিক সেচ, কৃষির আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে উন্নততর প্রযুক্তি পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সেচ প্রকল্পে WMG উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনের মাধ্যমে তা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

৩) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নির্দেশনা ক্রমে প্রদর্শনী খামারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাটি ও কৃষি আবহাওয়া ইত্যাদির বিবেচনায় উন্নত জাতের ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উক্ত বালিয়াডাঙ্গী খামারে উৎপাদিত শস্য বিক্রী বাবদ=৬২,৭০০/- (ষাটটি হাজার সাতশত টাকা) বোর্ডের রাজস্ব খাতে জমা করা হয়েছে।



প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাপাউবো, ঢাকা মহোদয় এর বালিয়াডাঙ্গী কৃষি খামার পরিদর্শনের স্থিরচিত্র

পানি বিজ্ঞান (Hydrology) এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের কার্যক্রম

পানি সম্পদ সেক্টরের সমন্বিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য নির্ভরযোগ্য পানি বিজ্ঞান উপাত্তের প্রাপ্যতা অপরিহার্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী পানি বিজ্ঞান এর আওতায় ৪ টি সার্কেল- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল, ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর, রিভার মরফোলজি ও গবেষণা সার্কেল এবং প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেলসমূহের মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী পানি বিজ্ঞান নেটওয়ার্কের সাহায্যে সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের অধিককাল পানি বিজ্ঞান উপাত্ত সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমানে প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান এর আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরসমূহ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সারাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত নিম্নবর্ণিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পানি বিজ্ঞান উপাত্তসমূহ সংগ্রহ করেছে।

ক্রমিক	উপাঙ্গের নাম		স্টেশন সংখ্যা	মন্তব্য
১.	পানি সমতল (টাইডাল/নন-টাইডাল)		৩৬২ টি	দিনে ৭ বার টাইডাল/দিনে ৫ বার নন-টাইডাল
২.	প্রবাহ পরিমাপ	নন-টাইডাল প্রবাহ	১২৩ টি	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
		টাইডাল প্রবাহ	৮ টি	পাক্ষিক
		সেমি টাইডাল প্রবাহ	৬ টি	শুষ্ক মৌসুম
৩.	ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ		৮৩ টি	মাসিক
৪.	লবণাক্ততা	স্থির	১০০ টি	দৈনিক/সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
		গতিশীল	৬৬ টি	বছরে একবার
৫.	পলল/পলিপ্রবাহ		২০ টি	সাপ্তাহিক/পাক্ষিক
৬.	বারিপাত		২৭৪ টি	দৈনিক
৭.	আবহাওয়া		২ টি	দৈনিক
৮.	বাস্পায়ন		৩৯ টি	দৈনিক
৯.	মরফোলজিক্যাল ক্রস সেকশন		১৮৪৬	বাৎসরিক/দ্বি-বাৎসরিক/ত্রি-বাৎসরিক/চতুর্থ- বাৎসরিক/পঞ্চম-বাৎসরিক
১০.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (সাপ্তাহিক)		১২৭২	বিভিন্ন কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ ও অটোমেটেড কূপসমূহসহ
১১.	ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল (প্রতি ঘন্টা)		৯০৫ টি	১২৭২ টি কূপের অন্তর্ভুক্ত কূপসমূহ সহ
১২.	ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ		০	অর্থ বরাদ্দ না থাকায় করা যায়নি
১৩.	একুইফার অনুসন্ধান/পাম্প টেস্ট		০	অর্থ বরাদ্দ না থাকায় করা যায়নি
১৪.	পর্যবেক্ষণ কূপ পুনঃখনন ও উন্নয়ন		৫৫ টি	
১৫.	অবকাঠামোর নকশা প্রণয়নে ভূ-কারিগরি অনুসন্ধান		৬ টি (১৩২ ফুট)	

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল

নিয়মিত কার্যক্রমঃ

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর ও পাবনায় অবস্থিত ৪টি পানি বিজ্ঞান পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। বিভাগসমূহের আওতায় ১৩টি উপ-বিভাগ এবং ৩৯টি শাখা দপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন নদ-নদীর পানি সমতল, প্রবাহ পরিমাপ, পলল/পলি নমুনা, পানিতে লবণাক্ততার পরিমান, বারিপাত, বাস্পায়ন এবং আবহাওয়াতন্ত্র বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বর্ণিত পানি বিজ্ঞান পরিমাপ বিভাগগুলোর মাধ্যমে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ১৪০টি নদীতে ৩৬২ টি (হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ) পানি সমতল গেজ স্টেশন, ১০২টি নদীর ১৩৭টি প্রবাহ পরিমাপ স্টেশনের মাধ্যমে ৪৪৭৩টি প্রবাহ পরিমাপ কাজ, ২০টি পলল/পলি নমুনা পরিমাপ স্টেশন, ৮৩টি পানির গুণাগুণ পরিমাপ স্টেশন, ২৭৪টি বারিপাত পরিমাপ স্টেশন, ৩৯টি বাস্পায়ন কাম বারিপাত স্টেশন এবং ২টি আবহাওয়াতন্ত্র স্টেশনের মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

এছাড়া কুমিল্লা ও ফরিদপুর পানি বিজ্ঞান পরিমাপ বিভাগের আওতায় দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীসমূহের ১০০টি স্থির স্টেশনের মাধ্যমে লবণাক্ততা পরিমাপ করা হয়। তাছাড়া ফরিদপুর পানি বিজ্ঞান পরিমাপ বিভাগের আওতায় ৬৬টি পয়েন্টে গতিশীল লবণাক্ততা (বেড়দিয়া থেকে খুলনার হিরণ পয়েন্ট পর্যন্ত) জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারী মাসে পরিমাপ করা হয়।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কার্যক্রমঃ

বন্যা মৌসুমে ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতাধীন হাওড় ও পার্বত্য অঞ্চলসহ ১১০টি পানি সমতল স্টেশনে মোট দৈনিক ৫ (পাঁচ) বারের সংগৃহীত উপাত্ত দিনে ০২ (দুই) বার এবং ৭২টি বারিপাত স্টেশনের ২৪ ঘন্টায় বারিপাতের পরিমাণ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হয়। উক্ত কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব বহন করে বিধায় বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রে সঠিকভাবে বন্যা তথ্য ও উপাত্ত প্রেরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনিটরিং করতে হয়।

রাষ্ট্রীয় জরুরী কার্যক্রমঃ

- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের আওতাধীন উত্তরাঞ্চলীয় পানি বিজ্ঞান পরিমাপ বিভাগ, বাপাউবো পাবনা এর আওতায় প্রতিবছর শুষ্ক মৌসুমে যৌথ নদী কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী গঙ্গা নদীতে হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে ৬ মাস ও তিস্তা নদীর ডালিয়াতে ৮ মাস দৈনিক প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক জানুয়ারি হতে মে মাস পর্যন্ত ৫ মাস যৌথভাবে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়।
- ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেলের অধীনে মাঠ পর্যায়ে ঢাকা, কুমিল্লা ও পাবনা পানি বিজ্ঞান পরিমাপ বিভাগ এর আওতায় যৌথ নদী কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী নতুন ৮টি নদীতে সীমান্তবর্তী প্রবেশ মুখে প্রবাহ পরিমাপ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

ভূ-গর্ভস্থ পানি বিজ্ঞান পরিদপ্তর

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে বোর্ডের বিভিন্ন মাঠ দপ্তর হতে প্রাপ্ত চাহিদাপত্রের বিপরীতে দেশব্যাপী ৬টি পয়েন্টে প্রায় ১৩২ ফুট সাব-সয়েল খনন কাজ সম্পাদন করা হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বহির্ভূত জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিবিধ প্রতিষ্ঠানকেও ডিপোজিট কার্যক্রমের আওতায় এ পরিদপ্তর প্রয়োজনীয় সেবা ও সহায়তা প্রদান করে থাকে। ভূ-গর্ভস্থ মৃত্তিকা অনুসন্ধান ও ভূ-কারিগরি তথ্য সয়েল টেষ্ট কাজ আরও মানসম্মত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৫০ হতে ২০০ মিটার খনন ক্ষমতা সম্পন্ন ৬ টি ড্রিলিং রিগ সংগ্রহ করা হয়েছে।

রিভার মরফোলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেল

রিভার মরফোলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীনে কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ মরফোলজি বিভাগ এবং ঢাকা মরফোলজি বিভাগ কর্তৃক দেশব্যাপী বর্তমানে বিদ্যমান মোট ৪০৫ টি নদীর মধ্যে প্রধান প্রধান এবং ঢাকার চতুর্দিকের সকল নদীসহ গুরুত্বপূর্ণ ১৬২টি নদীর ১৮৪৬টি ক্রস সেকশনে পর্যায়ক্রমে ব্যাথিমিট্রিক সার্ভে (প্রস্থচ্ছেদ জরীপ) সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১১ টি নদী, দুই বছর পর পর ১৫টি নদী, তিন বছর পর পর ৪০টি নদী, চার বছর পর পর ৪৬টি নদী এবং পাঁচ বছর পর পর ৫০টি নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপ করা হয়। নদীর প্রস্থচ্ছেদ জরীপের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর ইরোশন/ডিপোজিশন, নদীর ব্যাক লাইন শিফটিং ও নদীর থলওয়াগ ও গতিপথ নির্ণয়ক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এ সকল জরীপ উপাত্তসমূহ জিওরেফারেন্সিং, ভেলিডেশন, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সংরক্ষণ এবং ডিজাইন, প্ল্যানিং ও রিসার্চ এর চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের জন্য প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। রিভার মরফোলজি এন্ড রিসার্চ সার্কেলের অধীন তিনটি বিভাগ কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট ৩৪টি নদীর ৫০৯টি প্রস্থচ্ছেদ জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের গৃহীত কার্যক্রমঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	নদীর সংখ্যা	প্যাকেজ সংখ্যা	ক্রস সেকশনের সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	ঢাকা মরফোলজি বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।	১০টি	১২টি	৯৯ টি	৮৪.০০	৮৩.৬৮	
২	মরফোলজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া।	১১টি	১৭টি	১৯৫	৯৫.০০	৯৪.৯৭	
৩	মরফোলজি বিভাগ, বাপাউবো, ময়মনসিংহ।	১৩টি	১৪টি	২১৫	১১৫.০০	১১৪.৯৬	
	সর্বমোট	৩৪টি	৪৩টি	৫০৯	২৯৪.০০	২৯৩.৬১	

পানি বিজ্ঞান তথ্য ও বন্যা পূর্বাভাস সার্কেল

পানি বিজ্ঞান তথ্য ও বন্যা পূর্বাভাস সার্কেলের অধীনে সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র এবং নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ নামের পাঁচটি দপ্তর রয়েছে।

অত্র সার্কেল সংযুক্ত ম্যানেজমেন্ট এন্ড সার্ভিসেস ব্রাঞ্চ এর কার্যক্রমঃ

পানি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্তসমূহ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঠিকতা যাচাইকরণসহ অন্যান্য কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য পানি বিজ্ঞান তথ্য ও বন্যা পূর্বাভাস সার্কেল কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়ঃ

১. WebServer : ব্যবহারকারীগণ www.hydrology.bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট visit করে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত উপাত্তসমূহ সম্পর্কে যথাযথ ধারণা, ডাটার সময় কাল, ডাটার মূল্য ও অন্যান্য বিষয়ে সম্যক ধারণা নিয়ে অনলাইন পদ্ধতিতে ডাটার জন্য আবেদন করতে পারছেন।

২. অনলাইন পদ্ধতিতে ডাটা ব্যবহারকারীগণ বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যেকোনো সময়ে আবেদনের মাধ্যমে ১/২ ঘন্টার মধ্যে অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে ডাটা পেয়ে থাকেন।

বিগত ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্তসমূহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/প্রকল্প, বেসরকারি সংস্থা, দেশী/বিদেশী প্রকল্প, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান, এনজিও (NGO) সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে (আনুমানিক ২৭৫ প্রতিষ্ঠান) ম্যানুয়্যাল এবং অনলাইনের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে। এই সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাপাউবোর ম্যানুয়্যাল পদ্ধতিতে ৪,৭০৩,১৭৯/- টাকা এবং অনলাইন পদ্ধতিতে ৬,৬৮৪,৮৮০/- টাকা সহ সর্বমোট ১১,৩৮৮,০৫৯/- (এক কোটি তেরো লক্ষ আটশি হাজার ঊনষাট) টাকা রাজস্ব আয় হয়।

৩. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে উক্ত অফিসের আওতাধীন প্রসেসিং ব্রাঞ্চ (সারফেস ওয়াটার, গ্রাউন্ড ওয়াটার, রিভার মরফোলজি) এর জন্য নতুন ভাবে প্রসেসিং সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এছাড়া বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ওয়াটার লেভেল ও রেইন ফল ডাটা এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার ডাটা অনলাইনে আনার জন্য একটি মোবাইল এ্যাপ পাইলোটিং বাবদ চালু করা হয়েছে। হাইড্রোলজির জন্য একটি নতুন ওয়েব পোর্টাল কাজ চলমান।



খ) রিভার মরফোলজি প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বাপাউবো, ঢাকা।

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রাপ্ত ডাটা		২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রসেসিং ও আপলোডেড ডাটা		মন্তব্য
		নদীর সংখ্যা	ক্রস সেকশন সংখ্যা	নদীর সংখ্যা	ক্রস সেকশন সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ঢাকা মরফোলজি বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।	১৮ টি	২০৬ টি	১৮ টি	২০৬ টি	১০০%
২	ময়মনসিংহ মরফোলজি বিভাগ, বাপাউবো, ময়মনসিংহ।	৯ টি	১৫৯ টি	৯ টি	১৫৯ টি	১০০%
৩	কুষ্টিয়া মরফোলজি বিভাগ, বাপাউবো, কুষ্টিয়া।	১৪ টি	১৫৯ টি	১৪ টি	১৫৯ টি	১০০%
	সর্বমোট	৪১ টি	৫২৪ টি	৪১ টি	৫২৪ টি	১০০%

গ) সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চ, বাপাউবো, ঢাকা।

ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল কর্তৃক সংগৃহীত পানি সমতল (৩৬০ টি), প্রবাহ পরিমাপ (১৩৮ টি), ভূ-পরিস্থ পানির গুণাগুণ (১৯২ টি), লবণাক্ততা (১৪৪ টি), পলি প্রবাহ (৩০ টি), বারিপাত (২৭৫ টি), আবহাওয়া (২ টি) এবং বাষ্পায়ন (৩৯ টি) স্টেশন সমূহের ডাটা সারফেস ওয়াটার প্রসেসিং ব্রাঞ্চে প্রেরণ করা হয়। এ দপ্তরের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সংগৃহীত সকল হাইড্রোলজিকাল তথ্য/উপাত্তগুলোর যথাযথভাবে গুণগতমান পরীক্ষা/নিরীক্ষা, মিসিং ডাটা নির্ণয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়। এছাড়া ভূ-পরিস্থ পানি বিজ্ঞান সার্কেল হতে ৪ টি পরিমাপ বিভাগের মাধ্যমে ১৩৮ টি স্টেশনের প্রবাহ পরিমাপ তথ্য সংগ্রহ করা হয়, যার মধ্যে ৬টি টাইডাল, ৭টি সেমি টাইডাল এবং ১২৫ টি ননটাইডাল। সংগৃহীত প্রবাহ পরিমাপ স্টেশনের তথ্য-উপাত্ত সমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক ১১৬ টি স্টেশনের ২০০৭ সাল হতে MDD (Mean Daily Discharge) প্রস্তুতপূর্বক ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঘ) গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রেসেসিং ব্রাঞ্চ।

বাংলাদেশে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বিস্তৃত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১২৭২ টি পর্যবেক্ষণ কূপের মধ্যে ৩৬৫ টি পর্যবেক্ষণ কূপে অটোমেটিক লগার স্থাপনের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমতল ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৯০৭ টি পর্যবেক্ষণ কূপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তসহ ভূ-গর্ভস্থ পানির গুণাগুণ (শুষ্ক ও বর্ষা মৌসুমে), একুইফার বৈশিষ্ট্য, বোরহোল লিথলজি ডাটা গ্রাউন্ড ওয়াটার প্রেসেসিং ব্রাঞ্চে প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশ্লেষণ ও ডিজিটাল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়। এ সকল উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাপাউবোসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে উপাত্তসমূহ ব্যবহার উপযোগী করে secondary information প্রস্তুত করাসহ সকল উপাত্ত ডাটাবেজে সংরক্ষণ ও সরবরাহের কাজ করা হয়।

এছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়নের জন্য এ সকল তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। এ সকল তথ্য বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তাদের প্রকল্পের কাজে/দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অথবা বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করে থাকে এবং দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা, গবেষণামূলক কাজে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের শিক্ষামূলক কাজে উক্ত তথ্য/উপাত্ত ব্যবহার করে থাকে। তদুপরি সংগ্রহকৃত সকল তথ্য/উপাত্ত সমূহ দেশের পানি সম্পদ সংক্রান্ত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঙ) নির্মাণ ও যন্ত্রায়ন বিভাগ, বাপাউবো, ঢাকা।

- ১। কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন ল্যাব কর্তৃক ৩৪ টি কারেন্ট মিটার ক্যালিব্রেশন ও সার্ভিসিং।
- ২। ১ টি ডাবল ড্রাম ম্যানুয়াল উইন্স, ডিজিপিএস ১ টি, এডিসিপি ৪ টি, সিঙ্গেল ফ্রিকোয়েন্সি ইকো সাউন্ডার ৩ টি, প্রোপেলার টাইপ কারেন্ট মিটার ৫ টি, আরটিকে-জিপিএস ৪ টি মেরামত।
- ৩। তিন মিটার সাইজের ৩২ টি, দুই মিটার সাইজের ৩৬ টি পিভিসি ওয়াটার লেভেল স্টাফ গেজ সরবরাহ।
- ৪। ম্যানুয়াল রেইন গেজ ১৮ টি, ইভাপোরেশন প্যান ৫ টি, এক্সটেনশন বার ৬ টি, ওয়েডিং রড ৫ টি সরবরাহ।
- ৫। কারেন্ট মিটার এর জন্য ডিজিটাল সিগন্যাল কাউন্টার ১৭ টি ও এস্কেল প্লাগ ১৫ টি সরবরাহ।
- ৬। লেভেল মেশিন ৩ টি, লেভেলিং স্টাফ ৮ টি, এমার-গ্রাফ (লগিং) ক্যাবল ৫৫ মিটার সরবরাহ।
- ৭। দেশের বিভিন্ন ৩ টি, লেভেলিং স্টাফ ৮ টি, এমার-গ্রাফ (লগিং) ক্যাবল ৫৫ মিটার সরবরাহ।
- ৮। ডাটা সেন্টারের সার্ভার, ডাটাবেজ, ওয়েবসাইট ইত্যাদি এর বাৎসরিক পিরিয়ডিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ৯। বিভিন্ন ক্যাটামারান সার্ভে বোট এবং স্পীড বোট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ১০। বিভিন্ন ক্যাটামারান সার্ভে বোট এবং স্পীড বোটের আউটবোর্ড মোটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ১১। শিমরাইল পানি বিজ্ঞান উপ-বিভাগ অঙ্গনে আনসার সদস্যদের জন্য ডিউটি পোস্ট তৈরী।

চ) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কার্যক্রম

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) বন্যা বিষয়ক জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োজিত। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে (মে-অক্টোবর) ‘বন্যা তথ্য কেন্দ্র’ সাপ্তাহিক এবং সকল ছুটির দিনসহ প্রতিদিন খোলা থাকে এবং দেশের অভ্যন্তর ও উজানের বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সমূহের পানি সমতল বুলেটিন আকারে প্রকাশসহ গাণিতিক মডেল ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রণয়ন ও প্রচার করে থাকে।




গাণিতিক মডেল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য বন্যা পূর্বাভাস প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক টেলিফোন, ফ্যাক্স, লবি ডিসপ্লে, ই-মেইল, SMS, ভয়েস মেসেজ, বাংলা ও ইংরেজীতে ওয়েব সাইট (www.ffwc.gov.bd), Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন (১০৯০ নাম্বারে কল করে ৫ চেপে বিনামূল্যে বাংলায় বন্যা বার্তা শোনা যায়) ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম, NGO, উন্নয়ন সহযোগী, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা-উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইত্যাদি পর্যায়ে নিয়মিত বিতরণ/প্রেরণ করা হয়।

উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বর্তমানে ৩৫টি প্রধান নদ-নদীর ৬১টি স্থানে সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক ৫ (পাঁচ) দিনের আগাম পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা প্রণয়ন করা হচ্ছে। স্টেশনভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থার পাশাপাশি ৫ দিনের বন্যা পূর্বাভাসের পানি



বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের (www.ffwc.gov.bd) হোম পেজ
(মানচিত্রে পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশনসমূহ প্রদর্শিত)

২০০৫-০৭ খ্রিঃ মেয়াদে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা USAID-র সহায়তায় ১৮টি স্থানে গাণিতিক মডেলভিত্তিক ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং ২০১৪ খ্রিঃ হতে দুর্যোগ সতর্কীকরণ বিষয়ক আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থা RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় এ পদ্ধতি ৩৮টি স্থানে সম্প্রসারণ করা হয়, যা বর্তমান অবধি একটি মধ্যমেয়াদী বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা হিসেবে সক্রিয় আছে। ১০ দিনের সম্ভাব্যতামূলক আগাম বন্যা পূর্বাভাস ১৫ দিনে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রধান নদ-নদীসমূহের ৩টি পয়েন্টে ১৫ দিনের পানিপ্রবাহ পূর্বাভাস ব্যবস্থা চালু আছে। এছাড়া RIMES-এর কারিগরী সহায়তায় আগামীতে শুষ্ক মৌসুমে খরা পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ পরিকল্পনাধীন রয়েছে।




বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর অববাহিকায় এপ্রিল-মে মাসের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী/দাতা সংস্থা IFAD এর অনুদান সহায়তাপুষ্ট স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) অধীনে বাস্তবায়নাধীন ‘Haor Infrastructure Livelihood Improvement Project (HILIP)’ প্রকল্পের ‘Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP)’ component এর আওতায় ‘Development of Early Warning System of Flash Flood in the North Eastern Region of Bangladesh’ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম জুন, ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে ২০২১ সালে বর্ধিত প্রকল্প কর্মসূচীর আওতায় পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস স্টেশনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রধান নদ-নদীসমূহের মোট ৪৫ টি স্থানে পানি সমতল পর্যবেক্ষণ এবং মোট ৩৭ টি স্থানে ৩(তিন) দিনের সুনির্দিষ্ট আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে যেটি প্রচারের সুবিধার্থে একটি পৃথক ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।



আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করার জন্য ওয়েবভিত্তিক ব্যবস্থা (<http://geo.iwmbd.com:4003>) বা (<http://ffwc.bwdb.gov.bd/flashflood>)

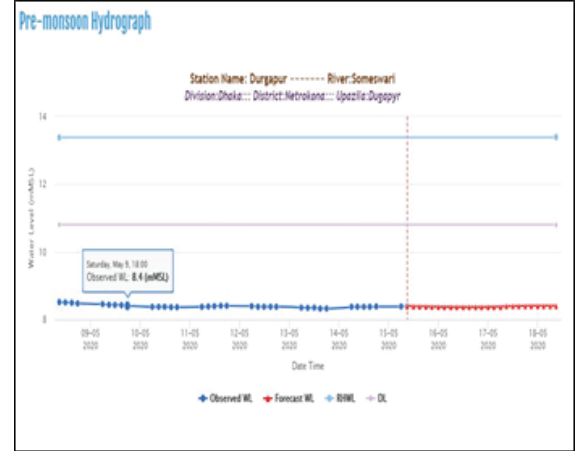

৩ দিনের আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাসের পানি সমতল লেখচিত্র স্টেশন: সোমেশ্বরী নদীর দুর্গাপুর পয়েন্ট


বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সরবরাহকৃত তথ্য ও সার্বিক দিক-নির্দেশনায় যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington (UW) এ কর্মরত প্রফেসর ডঃ ফয়সাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি গবেষণা দল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যবস্থা তৈরি করেছে যা ৩ দিনের আগাম আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস দিয়ে থাকে। উক্ত আগাম পূর্বাভাসটি <http://depts.washington.edu/saswe/flashflood> ওয়েবসাইটে প্রচার করা হচ্ছে। ২০২০ সালের আকস্মিক বন্যা মৌসুমে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং বাস্তবিক তথ্যের প্রেক্ষিতে ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের পূর্বাভাসের সঠিকতা যাচাই করা হচ্ছে।

ওয়াশিংটন ভিত্তিক আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস মডেলের সুবিধা- গাণিতিকভাবে কার্যকর, তুলনামূলক পূর্বাভাস, উজানের তথ্যের উপর নির্ভরশীল নয়, সরল ওয়েবসাইট ইত্যাদি।



চিত্রঃ যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক University of Washington এর আকস্মিক বন্যার পূর্বাভাস ওয়েবসাইট

বন্যা পূর্বাভাস বার্তা তৃণমূল পর্যায়ে সুচারুভাবে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এপ্রিল, ২০১৮ হতে আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ICIMOD এর সহায়তায় অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমভিত্তিক BWDB Flood App নামক একটি মোবাইল অ্যাপ পরিসেবা চালু করা হয়েছে। অ্যাপটি Google Play Store থেকে বিনামূল্যে Download করা যাবে। এটি মূলতঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ওয়েবসাইটের একটি মোবাইল ফোন বান্ধব সংস্করণ যার সাহায্যে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক মোবাইল ফোন গ্রাহক কেবল একটি ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে অতি সহজে বন্যা পূর্বাভাস বার্তা এবং চিত্রসমূহ তাঁর ফোনে পেয়ে যাবেন।

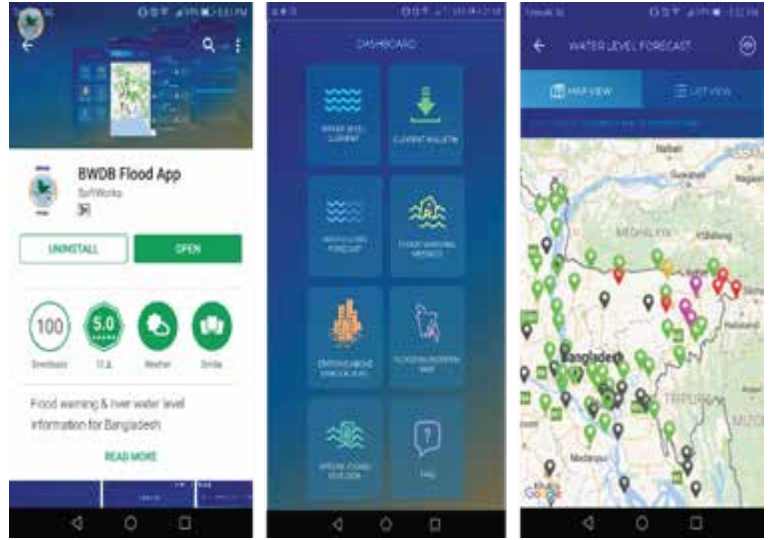


BWDB Flood App এর ডাউনলোড পেজ, ড্যাশবোর্ড এবং স্টেশন মানচিত্র (বাম থেকে ডান)

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের স্টেশনভিত্তিক বন্যা পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস ব্যবস্থাকে নিকটবর্তী সময়ের স্যাটেলাইট উপাত্তের মাধ্যমে নিখুঁততর স্থানভিত্তিক প্লাবন মানচিত্রে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা Google এর সাথে এটুআই এর সহযোগিতায় বাপাউবো ডিজিটাল পদ্ধতিতে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা চালু করে। চুক্তির আওতায় Google বাপাউবো'র বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র দপ্তরের নদ-নদীর পানি সমতল তথ্য ও পূর্বাভাসকৃত তথ্য ব্যবহার করে নিজস্ব ওয়েবভিত্তিক মডেল এবং উন্নততর Digital Elevation Map (DEM) এর মাধ্যমে Real time বন্যা প্লাবন মানচিত্র প্রস্তুত করা এবং Google Alert Service এর মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দেয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে এই ওয়েবভিত্তিক সেবা চলমান আছে এবং বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ১০৯টি স্টেশন এলাকার আওতাভুক্ত ৫৫টি জেলার ৯৯টি উপজেলার বন্যাপ্রবণ এলাকার জনগণের নিকট স্মার্ট ফোনের “পুশ নোটিফিকেশন” এর মাধ্যমে বন্যার তথ্য ও পূর্বাভাস প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। চলতি ২০২৪ সালে বন্যাকালীন সময় মে মাসে ৫,৪৬,৮১১টি, জুন মাসে ২৬,২৭,১৩৩টি এবং জুলাই মাসে ৫০,০৭,৫৪৭টি পুশ-নোটিফিকেশন প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও গুগল ম্যাপ এবং গুগল ফিডে আগাম বন্যা সম্পর্কিত সতর্কতামূলক বার্তা পাওয়া যাচ্ছে এবং গুগল ম্যাপ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট স্থানের বন্যা সতর্কতার ভিত্তিতে প্লাবনের দৃশ্যপট নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম বিধায় বন্যা পূর্বাভাস প্রান্তিক জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে এসএমএস পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ বিধায় এসএমএস পদ্ধতিতে পূর্বাভাস প্রেরণের বিষয়ে কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর নিকট কেবল সংশ্লিষ্ট স্থানের যথাযথ বন্যা সতর্কবার্তাসহ নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রের নাম পৌঁছে যাবে যার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার আরেকটি নতুন মাইলফলক রচিত হবে।



মোবাইলে প্রেরিত পুশ নোটিফিকেশন

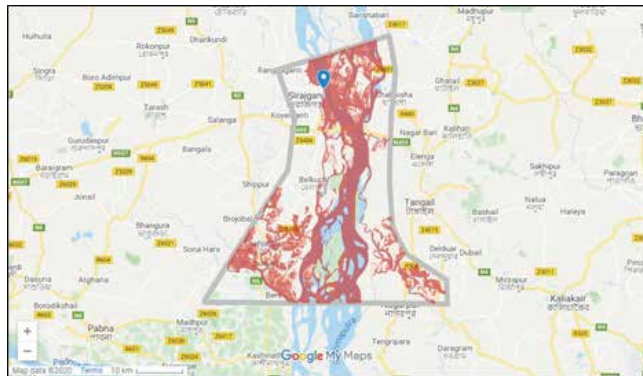


Google কর্তৃক প্রদত্ত সিরাজগঞ্জের প্লাবন মানচিত্র

বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে “পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (কম্পোনেন্ট-বি)” প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার কাজ পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে দেশের উপকূলীয় ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য অববাহিকায় বন্যা পূর্বাভাস সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের


আওতায় বন্যা পূর্বাভাস সফটওয়্যার এর আপগ্রেডেশন এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পানি সমতল ও বারিপাত তথ্য সংগ্রহের কাজও চলমান রয়েছে। এর ফলে স্বল্পসময়ের ব্যবধানে একাধিকবার মডেল চালনা করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও নগর অঞ্চলের জনগণের দীর্ঘ চাহিদার প্রেক্ষিতে DANIDA এর অর্থায়নে “Capacity Development for Enhanced Flood Forecasting and Warning Services of Bangladesh” প্রকল্পের আওতায় নগরভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস (ঢাকা শহরের জন্য) নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এর ফলে ঢাকা শহরের বিভিন্ন হটস্পট পয়েন্টে বন্যা পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের আওতায় অববাহিকা ভিত্তিক বন্যা প্রবাহ পূর্বাভাস নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বন্যা লিড টাইম বৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গা-মেঘনা অববাহিকায় বন্যার প্রবাহ পূর্বাভাস প্রদান করা সম্ভব হবে।

বন্যা পূর্বাভাস এবং সতর্কীকরণ কেন্দ্র (FFWC) MIKE 2023 লাইসেন্স সংগ্রহের মাধ্যমে সমগ্র দেশকে কভার করার জন্য তার বন্যা পূর্বাভাস ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত করেছে। বন্যা মডেলটি 2005 সংস্করণ থেকে 2023 সংস্করণে আপগ্রেড করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় পানি সমতল এবং বৃষ্টির পরিমাপক ডেটা অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে মডেল সক্ষমতা বৃদ্ধি করা গিয়েছে। দক্ষতা আরও বাড়ানোর জন্য, FFWC-এর দৈনন্দিন কাজগুলি MIKE অপারেশনে সফটওয়্যার এ পাইথন স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে অটোমেশন করা হয়েছে। এছাড়া উপকূলীয় এবং হটস্পট এলাকার জন্য একটি 2D প্লাবন মডেল তৈরি করা হয়েছে। মডেল ডোমেনটিকে কৌশলগতভাবে চারটি পৃথক মডেলে ভাগ করা হয়েছে এর কার্যক্ষমতাকে অপ্টিমাইজ করার জন্য।

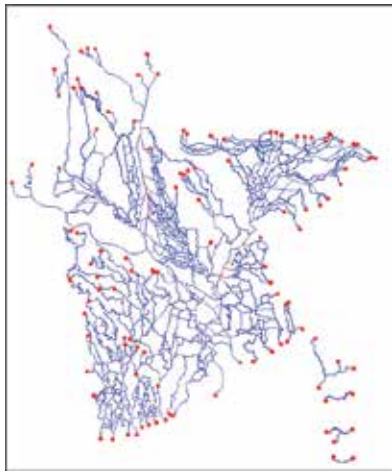


বর্ধিত মডেল ডোমেইন

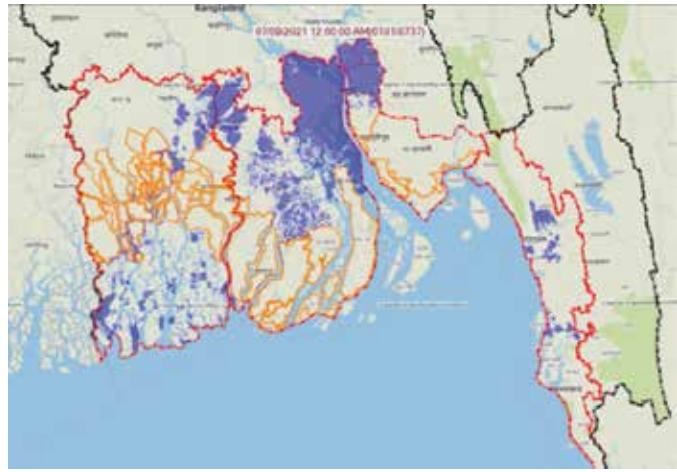

উপকূলীয় বন্যার 2D প্লাবন মডেল

হাইড্রোলজিক্যাল খরার পূর্বাভাস জানার জন্য, পরিসংখ্যানগত ও মেশিন লার্নিং উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করে শুষ্ক মৌসুমের জন্য ৭ দিন, ৩, ৬ ও ১২ মাসের খরার ধারণাগত পূর্বাভাস মডেল প্রস্তুত করা হয়েছে যা স্ট্যান্ডার্ডাইজড ওয়াটার ইনডেক্স (SWI) ব্যবহার করে খরার পূর্বাভাস প্রদান করে। শুষ্ক মৌসুমে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকে রাখতে পারবে।

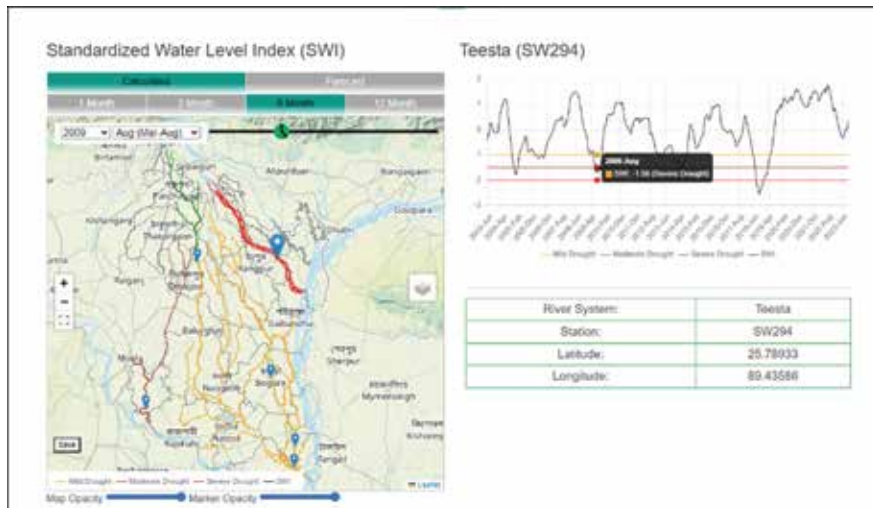

খরা পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাস

ড্রেজার পরিদপ্তরসমূহের কার্যক্রম

নদ-নদীর নাব্যতা, নদী শাসন, ভাঙ্গনরোধ প্রভৃতি কাজে ব্রিটিশ আমল হতেই ড্রেজার ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইতোপূর্বে ড্রেজার পরিদপ্তরের সকল কার্যক্রম প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, ড্রেজার, বাপাউবো, নারায়ণগঞ্জ এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হতো। বাপাউবোর অনুমোদিত বর্তমান সেটআপ মোতাবেক ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান সার্বিক ড্রেজিং কার্যক্রম নারায়ণগঞ্জ এবং খুলনা দুইটি দপ্তরের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রায় ২৭.৪৮ কি:মি: দৈর্ঘ্যে ৭৫.৯৫২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পাদন করা হয়। বাপাউবোর অন্তর্গত ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৩৪ (চৌত্রিশ) টি বিভিন্ন সাইজের (৯টি ২৬", ২ টি ২০", ১৬টি ১৮", ৬টি ১২" এবং ১টি ৬") ড্রেজার আছে। ০৭(সাত) টি ১২" ড্রেজার নিলাম কার্যক্রম মে/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। ড্রেজার ছাড়াও ৪৩ (তেরাত্তালিশ) টি অন্যান্য সহযোগী জলযান/যন্ত্রপাতি (যেমন টাগবোট, হাউজবোট, ওয়ার্কবোট ইত্যাদি) আছে। ১২" কাটার সাকশন ড্রেজারগুলি ১৯৫৩ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়।

বর্তমানে সচল ও কার্যক্ষম ড্রেজারগুলোর বাৎসরিক ড্রেজিং ক্ষমতা প্রায় ২৯৩.০০ লক্ষ ঘন মিটার। ড্রেজার পরিদপ্তর বাপাউবোর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের এবং পরিচালন ব্যয় খাতের আওতায় বিভিন্ন স্থানে চাহিদা মোতাবেক ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে “গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প” গড়াই নদী, কুষ্টিয়া, সুগন্ধা নদীর বামতীরে বরিশাল বিমানবন্দর সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে ড্রেজিং কাজ, সুগন্ধা নদী, বাবুগঞ্জ, বরিশাল, “মধুমতি নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প”, মধুমতি নদী, লোহাগড়া, নড়াইল, কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলায় ব্রক্ষপুত্র নদীর ডানতীরে নদীভাঙ্গনরোধ প্রকল্পে ড্রেজিং কাজ, যমুনা নদী, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ এনায়েতপুর স্পার-২ সংলগ্ন এলাকায় চর অপসারণ কাজ, জিকে পাম্প হাউজের ইনটেক ক্যানেল ড্রেজিং, চরবাগাদী পাম্প হাউজ, চাঁদপুর এর ইনটেক ক্যানেল এবং টাঙ্গাইলস্থ নিউ ধলেশ্বরী নদীর অফটেক সিল্ট বেসিন ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করা হয়।

যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরের কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক কাজ সম্পাদন করে দেশের সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আসছে। প্রতিষ্ঠার পর হতে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর বোর্ডের সকল যান্ত্রিক/বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী কর্মকাণ্ডের সহযোগী হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রধান কার্যক্রম:

- পানি নিষ্কাশন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ অবকাঠামোগুলোর গেট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস তৈরী ও স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাম্প হাউজগুলোর পুনর্বাসন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ইত্যাদি।
- উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে যেসব যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম কেনা হয়, প্রকল্প শেষে সেসব ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়। যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তর সেসব যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ করে বাপাউবোর প্রয়োজন মারফি ব্যবহার করে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তররাধীন বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক বাপাউবোর ২১০ টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর ৩৩০ টি পুরাতন গেইট পরিবর্তন করে নতুন গেট স্থাপন, ২২৭ টি পুরাতন হোয়েস্টিং পরিবর্তন করে নতুন হোয়েস্টিং সিস্টেম স্থাপন, বিভিন্ন ধরনের ১৩৩ টি গেইট ও ১১৯ টি হোয়েস্টিং সিস্টেম মেরামত; অর্থাৎ সর্বমোট ১০১৯ টি বিভিন্ন সাইজের এবং আকারের গেইট ও হোয়েস্টিং ডিভাইস তৈরী ও মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এছাড়াও, যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তররাধীন বিভিন্ন বিভাগের ২৫ টি ভারী যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত সহ যান্ত্রিক সরঞ্জাম দপ্তররাধীন ৫টি ওয়ার্কশপের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র/সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।

শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে পুঞ্জীভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা			২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অনিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/বরখাস্ত	অন্যান্য দণ্ড	অব্যাহতি		
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৭	৪	৫	১৪	২৩	২৪

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম

(০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত):

- ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বোর্ডের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ও বোর্ড কর্তৃক দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মোকদ্দমার সংখ্যাগত তথ্যাদি:

দক্র. নং.	আদালতের নাম	দায়েরকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা			নিষ্পত্তিকৃত মোকদ্দমার সংখ্যা		
		বাপাউবো-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত	বাপাউবো কর্তৃক দায়েরকৃত	মোট দায়েরকৃত	পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	মোট নিষ্পত্তিকৃত
১।	আপীল বিভাগ	০০	২১	২১	০৩	০৬	০৯
২।	হাইকোর্ট বিভাগ	৬৪	০১	৬৫	১৮	১৮	৩৬
৩।	নিম্ন আদালত	৮১	০৫	৮৬	০৪	০০	০৪
মোট:		১৪৫	২৭	১৭২	২৫	২৪	৪৯

জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম

২০২৩-২০২৪ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের ৬১৬.০২ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

২০২২-২৩ সালের জের (Carried over)	= ২২৩.৭৫ হেক্টর
২০২৩-২৪ সালের কার্যক্রম	= ৩৯২.২৭ হেক্টর
মোট :	= ৬১৬.০২ হেক্টর

(ক) জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেক্টর)	অগ্রগতির (%)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	৩৪৯.৩৮	৫৬.৭১ %
২।	ডিএলএস/সিএলএস কর্তৃক অনুমোদিত	২৯৬.০৬	৪৮.০৬ %
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	২৮.৯০	৪.৬৯ %
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	১৪১.১৯	২২.৯২ %
৫।	তহবিল প্রদান	১৪১.১৯	২২.৯২ %
৬।	দখল প্রাপ্ত	১০৩.৭৮	১৬.৮৫ %

(খ) জুন, ২০২৪ পর্যন্ত পেণ্ডিং কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেক্টর)	অগ্রগতির (%)
১।	জেলা প্রশাসক	২৬৬.৭৩	৪৩.৩০ %
২।	পানি উন্নয়ন বোর্ড	১৭৯.২৫	২৯.০৯ %
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৬৬.২৬	১০.৭৬ %
মোট		৫১২.২৪	

কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল এর কার্যক্রম

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তার বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের অধিকাংশ তথা প্রায় ৮৫% সরকারি ক্রয়ে ব্যয় করে থাকে। জনসাধারণের অর্থকে আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে এবং নাগরিক কল্যাণ বাড়ানোর জন্য এই ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অত্যাবশ্যক। পাশাপাশি সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় সুশাসন নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষতার সাথে সর্বোত্তম আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যে কোনও প্রকল্পের সাফল্য অর্জনের নিমিত্ত সুষ্ঠু ও কার্যকর সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়াকরণ এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য যোগ্য দরপত্রদাতাদের নির্বাচন অপরিহার্য।

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতীয় নীতি ও কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারি ক্রয় পদ্ধতিতে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনতে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সরকারি ক্রয় Public Procurement Act-2006 (PPA-2006) Public Procurement Rules-2008 (PPR-2008), Electronic Government Procurement Guidelines-2011, Sustainable Public Procurement (SPP) Policy এবং Delegation of Financial Power-2016 (DoFP-2016) দ্বারা সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সম-আচরণ এবং Value for Money নিশ্চিত হয়। এক্ষেত্রে Electronic Government Procurement (e-GP) System গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (CPC) মহাপরিচালক, বাপাউবো-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত) সহ বিদ্যমান ক্রয়বিধি বিধানের আলোকে ক্রয়-সংক্রান্ত বিষয়াদি

নিয়ে কাজ করে। এই দপ্তরটি বাপাউবো-তে উন্নয়ন ও পরিচালন বাজেট নির্বিশেষে জাতীয় (NCT) ও আন্তর্জাতিক (ICT) ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র ডকুমেন্ট প্রস্তুতি, দরপত্র আহবান, উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে Focal Point হিসেবে বাপাউবোর ক্রয়কারী দপ্তরসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে বাপাউবোতে ক্রয় দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সঠিক ক্রয় এবং দক্ষ চুক্তি ব্যবস্থাপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কন্ট্রাস্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল (CPC), বাপাউবো, ঢাকা এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ (পিপিএ-২০০৬), পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮(পিপিআর-২০০৮) এবং বাপাউবোর আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ-২০১৬ এর আলোকে বাপাউবোর ক্রয়কারী দপ্তরসমূহের ক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদান করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং ই-জিপি গাইডলাইন-২০১১ এর আলোকে সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে সরকারি ক্রয়ের বিধি বিধান ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এবং ই-জিপি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে সমন্বয় করা;
- পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮, ই-জিপি গাইডলাইনস-২০১১ এবং সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক সংশোধিত পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বোর্ডে ক্রয় পরিকল্পনা/নীতি গ্রহণ ও আইন/বিধি-বিধানের আলোকে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ও চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা।

e-GP কার্যক্রমঃ

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এবং Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRIIAF) প্রকল্পের আওতায় এবং Dohatec পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তায় কন্ট্রাস্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবোতে e-GP Cell ও e-GP Helpdesk স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত e-GP Cell ও e-GP Helpdesk বাপাউবোর Procuring Entity এবং ঠিকাদারগণকে e-Tendering সংক্রান্ত বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এছাড়াও Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়িত Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP) এর আওতায় বাপাউবো একটি PSPSOs হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং e-GP এর মাধ্যমে e-Contract Management System (e-CMS) বাস্তবায়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে (বাপাউবো) ২০১৬-১৭ অর্থ বছর হতে সকল পণ্ডর এবং পানি উন্নয়ন বিভাগে সকল উন্মুক্ত দরপত্র (OTM) এবং সীমিত দরপত্র (LTM) ব-এচ পদ্ধতিতে আহবান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বাপাউবোতে মোট ৩৯৫৬ টি দরপত্র ই-জিপি সিস্টেমে আহবান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩১২৮টি OTM, ৮১৫টি LTM, ৬টি RFQ এবং ৭টি OSTEM পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। নিচের লেখচিত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত বাপাউবো এর e-GP কার্যক্রমের সার-সংক্ষেপ প্রদর্শন করা হলোঃ




Figure-1: Financial year wise total no. of e-tenders processed in e-GP.




Figure-2: Financial year wise total no. of e-tenders invited in OTM, LTM, RFQ, OSTEM in e-GP.

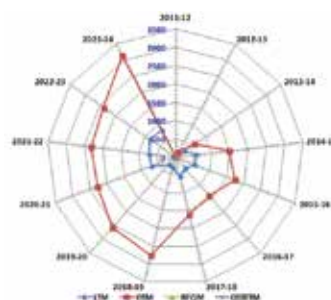


Figure-3: Financial year wise e-tenders invited in different procurement method in e-GP.

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সুশাসন, স্বচ্ছতা ও সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে Personnel Management Information System (PMIS), Online Recruitment Management System (ORMS), Online Payment Gateway, Online SMS Gateway System, Biometric Online Attendance System, Online Hydrological Data Sale System, Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS), MODFLOW-Hydro Geo Analytical System, Scheme Information Management System (SIMS), IP Camera based Monitoring System, WMO-Registration & Irrigation Management system, Intercom and IP Phone via soft-switch, Contract Information System, Online Disaster Damage Reporting System, O&M Budget Management Software বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং Legal Affairs Information Management System, Deposit Work Management System, Lease Management System, One Stop Service, Water Resources Interactive Experience Centre এর কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি খাত আরো সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে বোর্ডের কর্মকাণ্ড অধিকতর গতিশীল হয়েছে এবং অনেক সুফল পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্য প্রযুক্তি খাত এবং লোকবলকে আরো দক্ষ, গতিশীল ও সমৃদ্ধ করার জন্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরও অনেক কর্মকাণ্ড চালু ও পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে পরিকল্পিত ও প্রত্যাশিত সুফল বয়ে আনবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তিসমূহ সম্পর্কে বাপাউবো কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবহিত করা হয়েছে এবং এসব প্রযুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালন ব্যয় এর আওতায় পরিচালিত বিশাল কর্মযজ্ঞ সমন্বয় ও মনিটরিং করে সুবিন্যস্ত আকারে সংরক্ষণপূর্বক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য একটি ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, প্রধান প্রকৌশলী (পওর) এর দপ্তর ও পওর পরিদপ্তর এর পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে O&M Budget and Fund Management System সফটওয়্যারটি তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে চালু আছে ও ব্যবহৃত হচ্ছে। সফটওয়্যারের লিংক: <https://onm.bwdb.gov.bd/>

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য (যদি থাকে)
০১	সংসদীয় আসন অনুযায়ী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম	কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	সংসদীয় আসন অনুযায়ী বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল কার্যক্রমের তথ্য একটি ওয়েবভিত্তিক সফটওয়্যার ও মোবাইল এ্যাপ কেশনের মাধ্যমে মনিটরিং। এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ৩৫০টি আসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমাপ্ত, চলমান এবং পরিকল্পনাধীন প্রকল্পের বাস্তব তথ্য, সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের সাথে ডিও এর মাধ্যমে পত্রালাপের তথ্য, সংসদীয় প্রশ্নোত্তরে আলোচিত প্রকল্প তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট এলাকায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রীর পরিদর্শন তথ্য সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়।	সেবার লিংক: https://bwdb.gov.bd/com পাসওয়ার্ড: ১২৩
০২	ডিজিটাল পদ্ধতিতে বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা	বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	এ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) বিদ্যমান পাঁচ দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করে প্লাবন মানচিত্রের সাহায্যে বন্যা শুরু হওয়ার তিন দিন থেকে তিন ঘণ্টা আগে স্থানীয় জনগোষ্ঠী পর্যায়ে তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।	সেবার লিংক: http://www.ffwc.gov.bd/

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য (যদি থাকে)
০৩	Online Recruitment Management System for BWDB	মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	অনলাইনে চাকুরি প্রার্থীদের আবেদন, বাছাই, এডমিট কার্ড বিতরণ, পরীক্ষা ও রেজাল্ট প্রক্রিয়াকরণ, রেজাল্ট প্রদান ও এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা।	সেবার লিংক: https://orms.bwdb.gov.bd/orms
০৪	Contract Information System of BWDB	কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল ও কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	Contractor এর তথ্য অনলাইনে যাচাই-বাছাই এবং সংরক্ষণ। ঠিকাদারি কাজের তথ্যগুলো এবং সার্টিফিকেট এর তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।	সেবার লিংক: https://bcms.bwdb.gov.bd
০৫	পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রদান এবং Online Payment Gateway Service System এর মাধ্যমে ফি পরিশোধ	প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল ও কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল হতে আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এর আবেদনের প্রেক্ষিতে পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ প্রদান করা হয়। এই পেঞ্চাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পানি বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সমূহ অটোমেশন পদ্ধতিতে প্রদান এবং Online Payment Gateway Service System এর মাধ্যমে ফি পরিশোধ এর মাধ্যমে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সহজ করা হয়েছে।	সেবার লিংক: http://hydrology.bwdb.gov.bd/
০৬	WMO Registration Management System	প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা এর দপ্তর ও কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিদ্যমান সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ৩২টি ধাপে ৬৫ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ২০৬ দিনে সম্পন্ন হয়। এই বিদ্যমান পদ্ধতিকে উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ২৫টি ধাপে ৪২ জনের সম্পৃক্ততায় মাত্র ১০ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে উপকারভোগীগণ সহজে দ্রুত WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা ভোগ করতে পারবেন।	সেবার লিংক: http://wmo.bwdb.gov.bd
০৭	Irrigation Management System	প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা এর দপ্তর ও কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিদ্যমান সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ৩২টি ধাপে ৬৫ জন জনবলের সম্পৃক্ততায় দীর্ঘ ২০৬ দিনে সম্পন্ন হয়। এই বিদ্যমান পদ্ধতিকে উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবাদান প্রক্রিয়া প্রায় ২৫টি ধাপে ৪২ জনের সম্পৃক্ততায় মাত্র ১০ দিনে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে উপকারভোগীগণ সহজে দ্রুত WMO নিবন্ধন ও সেচ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা ভোগ করতে পারবেন।	সেবার লিংক: http://wmo.bwdb.gov.bd

ক্রমিক	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম	বাস্তবায়নকারী অফিসের নাম	উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	মন্তব্য (যদি থাকে)
০৮	নদ-নদীর পানির হ্রাস বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও অনলাইনে প্রকাশকরণ।	প্রসেসিং এন্ড ফ্লাড ফোরকাস্টিং সার্কেল, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ও পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্য সেবা ও আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (কম্পোনেন্ট-বি) প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	৩৬টি Auto Real Time Data Acquisition System (ARTDAS Station এর Real Time Data Hydrological Data গ্রহীত হওয়ার পর প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে। www.hydrology.bwdb.gov.bd site টি browse করে প্রতি মুহূর্তে Online scrolling এ নদ-নদীর Real Time Water level এবং Graphical view সংক্রান্ত তথ্য; পানি বিজ্ঞান কর্তৃক সংরক্ষিত সকল তথ্য-উপাত্তের পর্যাপ্ততা সমন্ধে তথ্য জানা যাবে।	সেবার লিংক: http://hydrology.bwdb.gov.bd/
০৯	SMS Management System	কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	SMS Management System রয়েছে যার মাধ্যমে যেকোনো জরুরি বার্তা কম খরচে একসাথে সবার নিকট মোবাইলে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।	সেবার লিংক: https://osgs.bwdb.gov.bd/
১০	Online Payment Gateway	কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হয়। নিয়োগের ফি পরিশোধের জন্য অনলাইন নিজস্ব পেমেন্ট গেটওয়ে তৈরি করা আছে। উপরন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে যে হাইড্রলজিক্যাল ডেটা বিক্রয় করা হয় তার জন্যও এই পেমেন্ট গেটওয়েটি ব্যবহৃত হচ্ছে।	সেবার লিংক: https://opgs.bwdb.gov.bd/
১১	Online Attendance Management System (OAMS)	কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হাজিরা ও ছুটি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা।	সেবার লিংক: https://www.bwdb.gov.bd/attendance
১২	Geographic Information System (GIS) Based Digital Land Information System on BWDB Acquired Land in Dhaka City and its surrounding	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পুর), পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর এবং ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন জমি সমূহের জিআইএস ও ডাটাবেজ ভিত্তিক তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।	সেবার লিংক: http://lis.bwdb.gov.bd/ ৩১/০৫/২০১৭ তারিখে ঢাকা শহরের আবদুল্লাহপুর, উত্তরায় পাইলটিং হয়েছে।
১৩	বাঁধের ভেতরে টিউব	হবিগঞ্জ পুর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, হবিগঞ্জ।	হাওড় অঞ্চলের ডুবন্ত বাঁধের স্থায়ী বৃদ্ধি কল্পে বাঁধের ভেতরে বালুভর্তি জিওটিউব স্থাপন করা এবং জিওটিউবের ওপর মাটির আবরণ দিয়ে বাঁধের সেকশন তৈরী করা	বর্তমানে সাতক্ষীরা ও হাওর অঞ্চলে ব্যবহৃত হচ্ছে।
১৪	O&M Budget and Fund Management System	প্রধান প্রকৌশলী (পওর) এর দপ্তর, পওর পরিদপ্তর, কেন্দ্রীয় আইসিটি পরিদপ্তর	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পরিচালন ব্যয় এর আওতায় পরিচালিত বিশাল কর্মযজ্ঞ সমন্বয়, মনিটরিং করে সুবিন্যস্ত আকারে সংরক্ষণপূর্বক তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম হিসেবে কাজ করতে O&M Budget and Fund	https://onm.bwdb.gov.bd/ সম্পূর্ণরূপে চালু আছে ও ব্যবহৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক কার্যক্রম

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার আওতায় রয়েছে-

- সেচ কার্যক্রম অটোমেশনে গেটগুলিতে সোলার পাওয়ারচালিত আইওটি ডিভাইস ব্যবহারপূর্বক সফটওয়্যারের মাধ্যমে পানির প্রবাহমাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ এবং সেচ সুবিধার আওতাধীন এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি;
- নবায়নযোগ্য শক্তি (Solar Power) ও IOT Device ভিত্তিক সেচ কার্যক্রম পরিচালনা এবং AI ও Big Data ভিত্তিক মনিটরিং ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন;
- উপকূলীয় পোল্ডারব্যবস্থার স্মার্ট অটোমেশন এবং AI ও GIS ভিত্তিক মনিটরিং;
- দেশের বিভিন্ন পয়েন্টে গেজ রিডিং অটোমেশন;
- পানিবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে পরিমাণগত তথ্যের পাশাপাশি গুণগত তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণ;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি AI, Machine Learning ও IOT ব্যবহারের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত, পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন;
- আন্তঃদেশীয় পানিপ্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহ এবং ঢল/বন্যা ইত্যাদি হতে আগাম সতর্ককরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- AI, Machine Learning ও IOT ব্যবহারের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় পানি প্রবাহের তথ্যাদি সংগ্রহকরণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির উন্নয়ন;
- Machine Learning, GIS ও Big Data ভিত্তিক One Stop Service Centre প্রস্তুতকরণ;
- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এর অগ্রসরমান প্রযুক্তি Drone, AI, AR ও VR ব্যবহারের মাধ্যমে সার্ভেওয়ার্কের GIS ভিত্তিক ডিজিটাইজেশন;
- Blockchain ভিত্তিক Disaster Damage Reporting & Information System স্থাপন;
- VR & AR Based Interactive Water Resources Experience Centre প্রস্তুতকরণ;
- AR-VR ভিত্তিক Training System প্রস্তুতকরণ।

ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যসূচি

গত ১৫ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি, ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি, ৩ ও ৪ মার্চ, ৬ ও ৭ মার্চ, ১০ ও ১১ মার্চ, ১৩ ও ১৪ মার্চ, ১৯ ও ২০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে ৮টি ব্যাচে ২ (দুই) দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে ৩০ জন করে মোট ২৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আইসিটি ল্যাব, লেভেল-১১ ডি-নথি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।



এক নজরে বাপাউবো'র সাফল্য

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সূচনালগ্ন থেকেই দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা এবং প্রণীত নীতিমালার আলোকে দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন রোধ করে সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ, নদী খনন/ড্রেজিং প্রভৃতি কর্মসূচী সম্বলিত এ যাবৎ ১০০৩টি ছোট বড় প্রকল্প (সেচধর্মী- ১৪১টি, এফসিডি/এফসিডিআই- ৫৪১টি, নদী তীর সংরক্ষণধর্মী- ১৬৯টি, ভূমি পুনরুদ্ধারধর্মী- ৬টি, সমীক্ষাধর্মী- ১৪৪টি, ভবন নির্মাণধর্মী- ১টি অন্যান্য-১টি) বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়ন সমাপ্ত করা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, চাঁদপুর সেচ প্রকল্প, জিকে সেচ প্রকল্প, মুন্সীরী সেচ প্রকল্প, বরিশাল সেচ প্রকল্প প্রভৃতি প্রকল্পের সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ করে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। অপরদিকে, দেশের নদী তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরগুলোতে নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ, চাঁদপুর, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নরসিংদী, নওগাঁসহ মোট ৩১টি জেলা শহরকে নদী ভাঙ্গন হতে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন দাতা সংস্থা/উন্নয়ন সহযোগীরা অর্থায়নে অংশীদারীত্বমূলক সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ধারণার আলোকে বর্তমানে প্রকল্প গৃহীত হচ্ছে এবং এরূপ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকাসমূহে সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়নের ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের বাম্পার ফলন অর্জনের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থ বছর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাপাউবো কর্তৃক বিগত ৬৫ বছরে দেশের প্রায় ১১০ লক্ষ হেক্টর বন্যা মুক্ত ও নিষ্কাশনযোগ্য এলাকার মধ্যে প্রায় ৬৭.২৪ লক্ষ হেক্টর এলাকা প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন অথবা সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৫৮৩৫ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধসহ মোট ১৬,৬৬২ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এ সকল সুবিধাদি দ্বারা বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় বিগত অর্থ-বছরে প্রায় ১১৪.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য (প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায়) উৎপাদিত হয়েছে।

দেশের নদ-নদী সমূহের নাব্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাসকল্পে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশব্যাপী নদ-নদীখনন সম্পন্ন করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে গাজীপুর জেলায় শীতলক্ষ্যা নদী, কুমিল্লা জেলায় তিতাস নদী, সিলেট জেলায় সুরমা নদী, হবিগঞ্জ জেলায় কুশিয়ারা নদী, মৌলভীবাজার জেলায় কুশিয়ারা নদী, দিনাজপুর জেলায় ঢেপা ও গর্ভেশ্বরী নদী, রাজশাহী জেলায় পদ্মা নদী, মাদারীপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী, মেহেরপুর জেলায় ভৈরব নদী, কুষ্টিয়া জেলায় গড়াই নদী, যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদ প্রভৃতি নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ এর আওতায় গৃহীত “৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী মোট ৪৮৫১ কি: মি: পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে নদী ও খাল সমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার ফলে বন্যার ঝুঁকি ও প্রকল্প হ্রাস পেয়েছে। ফলে নদী ও খালে অতিরিক্ত প্রবাহ সেচ কাজে সহায়ক হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হইতে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে রক্ষার্থে ও উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে লবনাক্ততা প্রতিরোধ ও জলোচ্ছ্বাস রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে বিদ্যমান জোয়ার-ভাটা সহিষ্ণু বাঁধসমূহকে ঘূর্ণিঝড় সহনশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৭ সালে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় সিডর এর ক্ষয়ক্ষতি পূর্ববাসনসহ আইলা (২০০৯), মহাসেন (২০১৩), রোয়ানু (২০১৬), মোরা (২০১৭), ফনী (২০১৯), আম্পান (২০২০), ইয়াস (২০২১), রেমাল (২০২৪) প্রভৃতি প্রলয়ংকারী উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় “উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প-১” এর আওতায় ৩২, ৩৩, ৩৫/১, ৩৫/৩, ৩৯/২সি, ৪০/২, ৪১/১, ৪৩/২ সি, ৪৭/২ ও ৪৮-এই ১০ টি পোল্ডারের পূর্ববাসন ও উন্নীতকরণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো উন্নয়ন করেছে যার তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
১	স্লুইস ও রেগুলেটর নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	৩৮	৬৭
২	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	২৫৯	২২
৩	স্লুইস ও রেগুলেটর মেরামত (সংখ্যা)	১৩৭	১১৪
৪	স্লুইস ও রেগুলেটর রক্ষণাবেক্ষণ মেরামত (সংখ্যা)	২৪৭	৭৩০
৫	অন্যান্য পানি কাঠামো (বোটপাস/সাইফুন/একুইডাক্ট/ ইনলেট/ পাইপ স্লুইস ইত্যাদি) মেরামত (সংখ্যা)	১১১	৩১

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
৬	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	১৮.৭৩ (CDSP প্রকল্প)	৬.২০
	ভুবন্ত বাঁধ	০.০৬ (ব্রাক্ষণবাড়িয়া)	-
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১২.৩৪ (পটিয়া ১০.০০ কিগমিঃ, FRERMIP-2 ১.৫ কিগমিঃ)	৯.১০
	সেচ খালের ডাইক	-	-
৭	বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/মেরামত/উন্নীতকরণ (কিলোমিটার)		
	উপকূলীয় বাঁধ	১৭০.৫৭	৬৪.৩২
	ভুবন্ত বাঁধ	৯৫৬.০০ (পিআইসি'র মাধ্যমে ৯৪৫ কিগমিঃ, গোপালগঞ্জ ১১.০০ কিগমিঃ))	-
	অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১৫২.০৪	১৮৭.০১
	সেচ খালের ডাইক	১৮০.৪৬	৩৪.২০
৮	বাঁধের ব্রীজ ফ্লোজিং দৈর্ঘ্য (কিলোমিটার)	৫.৩১	-
৯	বাঁধের রেইনকাট, ঘোগস ইত্যাদি মেরামত (কিলোমিটার)	৪৪.৪৭	-
১০	বাঁধের ঢাল স্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	২.৮৩	১৬.১৩
১১	বাঁধের ঢাল অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার)	৬.১৭	০.৫৯
১২	খাল খনন ও পুনঃখনন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি)	১৭২.৮৩ লক্ষ ঘনমিটার	
	নিষ্কাশন খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৭১৯.৮৭	১৩৪.০৪
	সেচ খাল খনন (কিলোমিটার)	-	-
	সেচ খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	১৭৮.৪৬	৩৫.৭০
১৩	খাল হতে কচুরীপানা/আবর্জনা অপসারণ (কিলোমিটার)	১৬৩.৮৭	-
১৪	খালের ঢাল প্রতিরক্ষা(কিলোমিটার)	৯০.৭১	০.৯৪
১৫	জমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	৫.৭১	২৪.৪৮
১৬	নদী তীর স্থায়ী সংরক্ষণ (কিলোমিটার)	১০৭.২৮	১৩৩.৫৬
১৭	নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত/শক্তিশালীকরণ (কিলোমিটার)	৪৭.৬৬	২৪.২৫
১৮	নদী তীর অস্থায়ী প্রতিরক্ষা (কিলোমিটার) (জরুরী আপদকালীন প্রতিরক্ষাসহ)	২১৯.২৪	২৯.১৫
১৯	নদ-নদী ড্রেজিং ও পুনঃখনন (লক্ষ ঘনমিটার মাটি)	৭১৮.০৩ লক্ষ ঘনমিটার	
	ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং (কিলোমিটার)	১১৫.৮৩	৯.৭৪
	রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং (কিলোমিটার)	-	-
	এক্সকাভেটর দ্বারা নদী পুনঃখনন (কিলোমিটার)	২২৫.০৯	৫৯.০৯
	লুপকাট খনন (কিলোমিটার)	৯.৪৫	-
২০	ড্রেজার সরবরাহ গ্রহণ (সংখ্যা)	-	-
২১	পাম্প হাউস নির্মাণ (সংখ্যা)	২ (শিমরাইল, আদমজীনগর)	১ (খড়িবাড়ি)
২২	পাম্প সরবরাহ গ্রাণ্ডি (সংখ্যা)	-	-
২৩	কোজার নির্মাণ (সংখ্যা)		
	হাওর অঞ্চল (অস্থায়ী)	১৬০	-
	উপকূলীয় অঞ্চল	-	-
	অন্যান্য	৫	-
২৪	রাবারড্যাম নির্মাণ (সংখ্যা)	-	১
২৫	ক্রসবার নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৬	স্পার নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৭	ঘোয়েন নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
২৮	ঘোয়েন পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	৩	১
২৯	স্পার পুনর্বাসন/মেরামত (সংখ্যা)	১০	৪
৩০	কজায়ে নির্মাণ (সংখ্যা)	-	-
৩১	ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ (সংখ্যা)	৫৩	১৪
৩২	রাস্তা নির্মাণ (কিলোমিটার)	৭৮.২৭	২৫.২৪
৩৩	ফ্লাডওয়াল নির্মাণ (কিলোমিটার)	২.৬৪	৩.৪৭
৩৪	ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	৩	৫
৩৫	ভূমি উন্নয়ন (ঘনমিটার মাটি লক্ষ/হেক্টর এলাকা)	-	
৩৬	জীপ ক্রয় (সংখ্যা)	৪ (ডিএনডি প্রকল্প)	
	মোটর সাইকেল ক্রয় (সংখ্যা)	৮ (ডিএনডি প্রকল্প)	
৩৭	জলযান ক্রয় (সংখ্যা)	-	

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	২০২৩-২৪ অর্থবছরে নির্মিত	
		পূর্ণ	আংশিক
৩৮	বনায়ন (গাছ সংখ্যা)	৯,৭৪,৭২০	
৩৯	সম্পাদিত সমীক্ষা (সংখ্যা)	১৩	৪
৪০	ভূমি পুনরুদ্ধার (বর্গ কিলোমিটার)	১ (রাজশাহী জেলা)	
৪১	সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	-	
৪২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকার সম্প্রসারণ (হেক্টর)	৯০০০ (কুমিল্লা জেলার তিতাস) ৮৭,৭০৬ (হাওর এলাকার জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৩টি হাওর)	

এক নজরে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত অবকাঠামো/কর্মকাণ্ডের বিবরণ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	১,০০৩	টি
সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা	৬৭.৩৪	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধার আওতাভুক্ত এলাকা (১৪১টি সেচধর্মী প্রকল্প বাস্তবায়িত)	১৬.৪৯	লক্ষ হেক্টর
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ভূমি সৃজন/পুনরুদ্ধার	১০৮৭.৬২	বর্গ কিলোমিটার
নদী ভাঙ্গন হতে সংরক্ষিত জেলা শহর	৩১	টি
নদী ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজ	১৬৫৮.৯৬	কিলোমিটার
স্পার নির্মাণ	২৫১	টি
ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ	২৪.১৫	কিলোমিটার
সমান্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	১৬৬৬২	কিলোমিটার
ক) উপকূলীয় বাঁধ (১৪৭টি পোল্ডার)	৫,৮৩৫	কিলোমিটার
খ) ডুবন্ত বাঁধ (৯৯টি হাওর/হাওর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে)	২,৮২৮	কিলোমিটার
গ) অন্যান্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৭,৯৯৯	কিলোমিটার
সেচ খালের ডাইক	৩৬১৩	কিলোমিটার
বাপাউবোর বাঁধের উপর সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	১৩২৩	কিলোমিটার
বাপাউবোর বাঁধের উপর এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত রাস্তা	৪১৮৩	কিলোমিটার
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১২১৪	কিলোমিটার
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫৩৫৫	কিলোমিটার
নিষ্কাশন খালের দৈর্ঘ্য	৪৫০২	কিলোমিটার
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৬২৬৩	টি
পাম্প হাউজের সংখ্যা	২৫	টি
ফ্লোজার	১৪৩৬	টি
ব্রিজ/কালভার্ট	৫৮৬৪	টি
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া, পালাকাটা, কওয়া, বাগুজারা)	৫	টি
ড্রেজার সংখ্যা	৪১	সেট
নদী পুনঃখনন	৩৮২৪	কিলোমিটার
নদী ড্রেজিং	১৫৭৭	কিলোমিটার

উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ঘাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা সহ ছোট-বড় ৫৭টি আন্তর্জাতিক নদ-নদী এ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। সুতরাং এসব নদীর পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টিজনিত কারণে নদীর দু'কূল উপচিয়ে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কৃষি জমি বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এবং কোন কোন বছর খরাজনিত কারণে স্বল্প পানি প্রবাহের কারণে সেচ কার্যে পানির অভাব কৃষিকার্যে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এছাড়াও নদী ভাঙ্গন হতে শহর রক্ষা, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা রক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জ্ঞান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশ যেখানে ৯৭.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হতো, সেখানে ২০২২-২৩ অর্থ-বছরে চালের উৎপাদন বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩৯০.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। এর মধ্যে বাপাউবো'র প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায় অতিরিক্ত প্রায় ১১১.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য-শস্য উৎপাদিত হয়েছে। সুতরাং একটি সুসম টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদ খাতে সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্যশস্য উৎপাদনসহ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি হচ্ছে সে দেশের জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) এবং তার বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যারেজ, রেগুলেটর, স্লুইস, ক্রস-ড্যাম, রাবার ড্যাম, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, উপকূলীয় বাঁধ, ডুবন্ত বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ, নদীতীর ভাঙ্গন প্রতিরোধ তীর সংরক্ষণমূলক কাজ, নদ-নদী ড্রেজিং ও খাল খনন/ পুনঃখনন, ব-দ্বীপ উন্নয়ন এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রভৃতি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের জিডিপিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহ যেমন কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতিতে সরাসরি অবদান রাখে, ঠিক তেমনি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত বাঁধের উপর এলজিইডি ও সওজ কর্তৃক নির্মিত রাস্তাও দেশের অর্থনীতিতে পরোক্ষভাবে অবদান রাখে। বাপাউবো'র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কেবল বাঁধের অভ্যন্তরে বন্যার পানির প্রবেশকেই বাঁধা দেয় না, বরং বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে পরিবেশ ও প্রতিবেশগত মানবিক দুর্যোগ থেকেও রক্ষা করে। বন্যার পানি লোকালয়ে প্রবেশ করলে তা জন-জীবন এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। সে প্রেক্ষিতে বাপাউবো বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বাঁধের অভ্যন্তরের এলাকাকে মানবিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে, যার সুফল কোন অর্থনৈতিক সূচকে নির্ণয়যোগ্য বলে প্রতীয়মান হয় না। নদ-নদীর পানি সমতল সম্পর্কিত তথ্য এবং বন্যা সতর্কীকরণ পূর্বাভাস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সেবা ইতোমধ্যে জাতীয় নীতি-নির্ধারণী মহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ও দুর্যোগের পূর্বাভাস সম্পর্কিত এ ধরনের সেবাকেও কোন নির্ণয় সূচকে সরাসরি পরিমাপ করা যায় না।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন এর সকল পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল প্রকল্পই দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য, দেশের জন্য। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প বিষয়ে প্রকল্প সুবিধাভোগী, প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণকেও সচেতন ও যত্নশীল হতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ম্যাগেটভুক্ত কার্যক্রম হলেও স্থানীয় জনগণ, বোর্ডের প্রশাসন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একার পক্ষে সম্ভব নয়। সে লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মাননীয় স্থানীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে প্রত্যেক জেলায় জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক জেলায় ছোট নদী ও খাল পুনঃখনন কর্মসূচি এবং নদী, খালে বা তাদের তীরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কাজ চলমান রয়েছে। বাপাউবো'র কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিতকল্পে সদর দপ্তর হতে জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ নিয়মিত গণশুনানী আয়োজন, প্রকল্প সুবিধা ভোগীদের সাথে আলোচনা, প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান জায়গায় বাস্তবায়নাধীন কাজের তথ্য ও দায়িত্বশীলদের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড স্থাপন প্রভৃতি উদ্যোগের মাধ্যমে কমিউনিটি মনিটরিং নিশ্চিত করা হয়েছে। এভাবেই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম আরো বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি-নির্ধারকগণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।



শিমরাইল পাম্প স্টেশন, নারায়ণগঞ্জ



নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ, পূর্ব পাটিচড়া, পল্লীতলা, নওগাঁ



হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদীর ডান তীরে
লাঙ্গনমোড়া এলাকায়, চট্টগ্রাম



নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ, কামারজানি, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা



চরবাড়িয়া এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ, বরিশাল



যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি উন্নয়ন এবং
প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা, সিরাজগঞ্জ



নদী খনন, তুলশীগঙ্গা, মুরারীপুর, জয়পুরহাট



নদী ড্রেজিং, আড়িয়াল খাঁ, ফরিদপুর



নদীতীর সংরক্ষণ, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল



রেগুলেটর, চিতলমারী, বাগেরহাট



বাঁধ, পোস্তার নং- ৩২, দাকোপ, খুলনা



নদীতীর সংরক্ষণ, গণকবর, গাইবান্ধা

পরিশিষ্ট-১

পরিশিষ্ট-১

২০২৩-২৪ অর্থ-বছরের ৩০-০৬-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবয়ুক্রি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা							
১	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	২০১১৩১.৮৮	১০৫৭২৮.৫০	৫২৫০০.০০	৫২৪০৮.৮৩	১৫৮০৬৯.২৬
২৬		স্থানীয়	২০১১৩১.৮৮	১০৫৭২৮.৫০	৫২৫০০.০০	৫২৪০৮.৮৩	১৫৮০৬৯.২৬
একনেক		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩০-০৮- ২০১৮		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫২.৬০	৩০.০০	২১.৫০	৭৯.১০
		আর্থিক %		৫২.৫৭	২৬.১০	২৬.০২	৭৮.৫৯
২	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন শুভাঢ্যা খাল পুনঃখনন এবং খালের উভয় পাড়ের উন্নয়ন ও সুরক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়) (সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৩১৭৫৯.০০	০.০০	৩৮.০০	৩৬.৫২	৩৬.৫২
৯৯		স্থানীয়	৩১৭৫৯.০০	০.০০	৩৮.০০	৩৬.৫২	৩৬.৫২
একনেক		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৯-০৮- ২০২৩		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.০০	১.০০	১.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.১২	০.১১	০.১১
৩	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৪) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	১২৯৯৯১.১৭	৮৭২৭৫.২০	৩৫০০০.০০	৩৩৮৫৫.৬৯	১২১১৩০.৯১
১৮		স্থানীয়	১২৯৯৯১.১৭	৮৭২৭৫.২০	৩৫০০০.০০	৩৩৮৫৫.৬৯	১২১১৩০.৯১
একনেক		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০৯-০৮- ২০১৬		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮১.৬৮	১৮.৩৬	১৮.৩৬	১০০.০০
		আর্থিক %		৬৭.১৪	২৬.৯২	২৬.০৪	৯৩.১৮
৪	পদ্মা বহুমুখী সেতুর ডাচিতে মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টংগিবাড়ী উপজেলাধীন বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৪)	মোট	৪৭৮৭১.২৪	৫২৯২.৯১	৯৫০০.০০	৯৪৯৯.১৬	১৪৭৯১.৯৬
৬৩		স্থানীয়	৪৭৮৭১.২৪	৫২৯২.৯১	৯৫০০.০০	৯৪৯৯.১৬	১৪৭৯১.৯৬
একনেক		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮-০৭- ২০২১		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১১.৮৮	২২.৯৮	১৭.৫৬	৩৫.০০
		আর্থিক %		১১.০৬	১৯.৮৪	১৯.৮৪	৩০.৯০
৫	কালিগঙ্গা নদীর ভাঙ্গন হতে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ সদর এবং সিংগাইর উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ (এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	মোট	৬৮৮৯৬.০০	২৮২.৯৫	২৮১৬২.০০	২৮১৫৯.৮০	২৮৪৪১.৭২
৭৪		স্থানীয়	৬৮৮৯৬.০০	২৮২.৯৫	২৮১৬২.০০	২৮১৫৯.৮০	২৮৪৪১.৭২
একনেক		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯-০৮- ২০২২		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.০০	৪০.০০	৩৮.০০	৪০.০০
		আর্থিক %		০.৪১	৪০.৮৮	৪০.৮৭	৪১.২৮
৬	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন দুর্গাপুর ইউনিয়নের তারাগঞ্জ বাজার এবং সংলগ্ন এলাকা শীতলক্ষ্যা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৩০৭৯.৩০	১০৯৫.০২	১৪৩০.০০	১৪২৮.৭০	১২৮৯.০৬
৬৭		স্থানীয়	৩০৭৯.৩০	১০৯৫.০২	১৪৩০.০০	১৪২৮.৭০	১২৮৯.০৬
পরিঃ মন্ত্রী		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৮-০২- ২০২২		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৬.০০	৬৪.০০	৬৩.০০	৯৯.০০
		আর্থিক %		৩৫.৬৬	৪৬.৪৪	৪১.৮৬	৭৭.৪২
৭	টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন লৌহজং নদীর ভাঙ্গন হতে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের আওতাধীন কুমুদিনী হাসপাতাল, ভারতেশ্বরী হোমসসহ ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাসমূহ রক্ষা (এপ্রিল, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৪৫১৬.৩০	০.০০	১৫৩০.০০	১৫২৯.৬০	১৫২৯.৫৫
৮৮		স্থানীয়	৪৫১৬.৩০	০.০০	১৫৩০.০০	১৫২৯.৬০	১৫২৯.৫৫
পরিঃ মন্ত্রী		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০৬-০৬- ২০২৩		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৩০.০০	৫২.০০	৫২.০০
		আর্থিক %		০.০০	৩৩.৮৮	৩৩.৮৭	৩৩.৮৭
৮	ময়মনসিংহ জেলার মুন্সীগঞ্জ উপজেলার আয়মন নদী পুনঃখনন ও নদী তীর সংরক্ষণ (সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৪৬৯৫.০০	০.০০	২৫০.০০	২৪৯.৫০	২০৯.২০
৯৬		স্থানীয়	৪৬৯৫.০০	০.০০	২৫০.০০	২৪৯.৫০	২০৯.২০
পরিঃ মন্ত্রী		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০-০৯- ২০২৩		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১২.০০	১৫.০০	১৫.০০
		আর্থিক %		০.০০	৫.৩২	৪.৪৬	৪.৪৬
৯	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উন্নয়ন, ওয়েড প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	৩৫০৩৪.৩৩	৩২৮১৩.২৯	২১৭০.০০	২১৬১.৮৮	৩৪৯৭৪.৭৭
২৭		স্থানীয়	৩৫০৩৪.৩৩	৩২৮১৩.২৯	২১৭০.০০	২১৬১.৮৮	৩৪৯৭৪.৭৭
একনেক		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০৯-১০- ২০১৮		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯৪.০০	৬.০০	৫.৮৩	৯৯.৮৩
		আর্থিক %		৯৩.৬৬	৬.১৯	৬.১৭	৯৯.৮৩

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবযুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	কিশোরগঞ্জ জেলার ১০টি উপজেলায় নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ, ওয়েড প্রটেকশন এবং খাল পুনঃখনন প্রকল্প (জানুয়ারি-২০২২ হতে ডিসেম্বর- ২০২৬)	মোট	৬৫৪২৫.৭৫	৯২৪.৮৮	১৩০৯৫.০০	১৩০৯৩.১৫	১৩০৯১.৬৯	১৪০১৬.৫৭
৭৩		স্থানীয়	৬৫৪২৫.৭৫	৯২৪.৮৮	১৩০৯৫.০০	১৩০৯৩.১৫	১৩০৯১.৬৯	১৪০১৬.৫৭
একনেক ০৫-০৪- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.২৫	১৮.০০		২৪.৯৫	২৭.২০
		আর্থিক %		১.৪১	২০.০২		২০.০১	২১.৪২
১১	নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	মোট	২০৫৯৩.৮১	৩৩.৪৩	৭৫০০.০০	৭৪৯৭.২১	৭৪৭৫.৫৯	৭৫০৯.০২
১৩৫		স্থানীয়	২০৫৯৩.৮১	৩৩.৪৩	৭৫০০.০০	৭৪৯৭.২১	৭৪৭৫.৫৯	৭৫০৯.০২
একনেক ০৫-০৪- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.২০	৫০.০০		৪৮.০০	৪৮.২০
		আর্থিক %		০.১৬	৩৬.৪২		৩৬.৩০	৩৬.৪৬
১২	নেত্রকোণা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলায় বাঘরুয়া ও কর্ণপুর গ্রাম কংশ নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা (জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	মোট	৪৭০১.০৭	১৩.৪৫	২৭০০.০০	২৬৯৭.৩৪	২৬৬৩.২৫	২৬৭৬.৭০
৭৮		স্থানীয়	৪৭০১.০৭	১৩.৪৫	২৭০০.০০	২৬৯৭.৩৪	২৬৬৩.২৫	২৬৭৬.৭০
পরিঃ মন্ত্রী ০৭-০২- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৫০	৭৫.০০		৬৫.৩০	৬৫.৮০
		আর্থিক %		০.২৯	৫৭.৪৩		৫৬.৬৫	৫৬.৯৪
১৩	নেত্রকোণা জেলার সদর ও বারহাটা উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ (জীবন রক্ষা বাঁধ) পুনর্বাসন এবং কংশ নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন (সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৪৭৭০.০০	০.০০	১৩৫.০০	১২৯.৭৫	১২৬.৫৭	১২৬.৫৭
৯৭		স্থানীয়	৪৭৭০.০০	০.০০	১৩৫.০০	১২৯.৭৫	১২৬.৫৭	১২৬.৫৭
পরিঃ মন্ত্রী ০৭-০২- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৫০	১০.০০		২.৭৫	৩.২৫
		আর্থিক %		০.০০	২.৮৩		২.৬৫	২.৬৫
১৪	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলায় পাকেরদহ ও বালিজুরি ইউনিয়ন এবং বগড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় জামখল এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	মোট	৫৭৪৪১.০০	২৪১৫৮.৩৫	১৬০০০.০০	১৫৯৯৯.০০	১৫৯৯৭.২০	৪০১৫৫.৫৫
৪৬		স্থানীয়	৫৭৪৪১.০০	২৪১৫৮.৩৫	১৬০০০.০০	১৫৯৯৯.০০	১৫৯৯৭.২০	৪০১৫৫.৫৫
একনেক ১০-০৩- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৭.৮৮	২০.০০		২০.০০	৮৭.৮৮
		আর্থিক %		৪২.০৬	২৭.৮৫		২৭.৮৫	৬৯.৯১
উপ-মোট : কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	৬৭৯৯০৫.৪৫	২৫৭৬১৭.৯৮	১৭০০১০.০০	১৬৮৭৪৫.১১	১৬৮৪৩৪.৪০	৪২৬০৫২.৩৮
		স্থানীয়	৬৭৯৯০৫.৪৫	২৫৭৬১৭.৯৮	১৭০০১০.০০	১৬৮৭৪৫.১১	১৬৮৪৩৪.৪০	৪২৬০৫২.৩৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.২৬	৯৯.০৭	
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা								
১৫	কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	৭৮৮৫.১৫	৩৮৮৭.৩৯	২৪৯৯.০০	২৪৯৮.৭০	২১৬৮.৭৭	৬০৫৬.১৬
৫০		স্থানীয়	৭৮৮৫.১৫	৩৮৮৭.৩৯	২৪৯৯.০০	২৪৯৮.৭০	২১৬৮.৭৭	৬০৫৬.১৬
একনেক ২১-০৭- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬০.০২	৩৯.৯৮		৩৯.৯৮	১০০.০০
		আর্থিক %		৪৯.৩০	৩১.৬৯		২৭.৫০	৭৬.৮০
১৬	লক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত রামগতি ও কমলনগর উপজেলায় বড়খেরী ও লুঘুয়াবাজার এবং কাদের পতিতের হাট এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৩০৮৯৯৬.৯৯	১৪৭৯৭.৫৩	৩০০০০.০০	২৯৯৯৯.০০	২৯৯৯৭.৯১	৪৪৭৯৫.৪৪
৫৯		স্থানীয়	৩০৮৯৯৬.৯৯	১৪৭৯৭.৫৩	৩০০০০.০০	২৯৯৯৯.০০	২৯৯৯৭.৯১	৪৪৭৯৫.৪৪
একনেক ০১-০৬- ২০২১		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬.৩৭	৯.৭৫		৯.৭৫	১৬.১২
		আর্থিক %		৪.৭৯	৯.৭১		৯.৭১	১৪.৫০
১৭	ভূমি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে উড়ির চর - নোয়াখালী ক্রস ডাম নির্মাণ প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৭) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৫৮৮৯৪.০০	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	১৬.৮৯	১৬.৮৯
৯৪		স্থানীয়	৫৮৮৯৪.০০	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	১৬.৮৯	১৬.৮৯
একনেক ১৮-০৭- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০০		০.০৩	০.০৩
		আর্থিক %		০.০০	০.০৮		০.০৩	০.০৩
১৮	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় নলের চরে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন (সেপ্টেম্বর, ২০২৩ খ্রি: হতে জুন, ২০২৬ খ্রি:) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৩৭৭০৪.৫৪	০.০০	৮০০.০০	৩৯৯.৫০	৫০.৪৫	৫০.৪৫
৯৮		স্থানীয়	৩৭৭০৪.৫৪	০.০০	৮০০.০০	৩৯৯.৫০	৫০.৪৫	৫০.৪৫
একনেক ২৯-০৮- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২.৪০		০.১৫	০.১৫
		আর্থিক %		০.০০	২.১২		০.১৩	০.১৩

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবয়ুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১৯	ফেনী জেলার সোনাগাজী ও দাগনভূঞা উপজেলায় ফেনী নদী ও ছোট ফেনী নদীর বিভিন্ন স্থান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন (জানুয়ারী, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৪৮৯৫.০০	০.০০	২০০.০০	১৯৯.৫০	১৯৩.৭৭	১৯৩.৭৭
১০১	উপজেলায় ফেনী নদী ও ছোট ফেনী নদীর বিভিন্ন স্থান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন (জানুয়ারী, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৫)	স্থানীয়	৪৮৯৫.০০	০.০০	২০০.০০	১৯৯.৫০	১৯৩.৭৭	১৯৩.৭৭
পরিঃ মন্ত্রী ১৪-১১- ২০২৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৫.০০		৪.০০	৪.০০
		আর্থিক %		০.০০	৪.০৯		৩.৯৬	৩.৯৬
২০	চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ পুনর্বাসন (অক্টোবর, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৭)	মোট	৮২৭০২.০০	০.০০	৩৫০.০০	৩৪৯.৫০	১৩৬.৮৯	১৩৬.৮৯
১০৪	উপজেলায় চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ পুনর্বাসন (অক্টোবর, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৭)	স্থানীয়	৮২৭০২.০০	০.০০	৩৫০.০০	৩৪৯.৫০	১৩৬.৮৯	১৩৬.৮৯
একনেক ১২-০৯- ২০২৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০০		০.২৫	০.২৫
		আর্থিক %		০.০০	০.৪২		০.১৭	০.১৭
২১	মেঘনা-ধনগোদা সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৩৪৭৬৫.৬৯	০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৮.৪০	২৯৮২.১৩	২৯৮২.১৩
১৩৬	উপজেলায় মেঘনা-ধনগোদা সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন ও নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫)	স্থানীয়	৩৪৭৬৫.৬৯	০.০০	৩০০০.০০	২৯৯৮.৪০	২৯৮২.১৩	২৯৮২.১৩
একনেক ২৯-০৩- ২০২৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০.০০		১০.৩০	১০.৩০
		আর্থিক %		০.০০	৮.৬৩		৮.৫৮	৮.৫৮
২২	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিয়ারা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	মোট	১২২৪৩.০১	৪১৪.৬৮	১.০০	০.০০	০.০০	৪১৪.৬৮
১২৯	উপজেলায় চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিয়ারা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	স্থানীয়	১২২৪৩.০১	৪১৪.৬৮	১.০০	০.০০	০.০০	৪১৪.৬৮
একনেক ২৩-১০- ২০১৮	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.৩৯	০.০০		০.০০	৩.৩৯
		আর্থিক %		৩.৩৯	০.০১		০.০০	৩.৩৯
উপ-মোট : পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মোট	৫৪৮০৮৬.৩৮	১৯০৯৯.৬০	৩৬৯০০.০০	৩৬৪৯৬.৬০	৩৫৫৪৬.৮১	৫৪৬৪৬.৮১
		স্থানীয়	৫৪৮০৮৬.৩৮	১৯০৯৯.৬০	৩৬৯০০.০০	৩৬৪৯৬.৬০	৩৫৫৪৬.৮১	৫৪৬৪৬.৮১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৮.৯০	৯৬.৩৩	৯৬.৩৩
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট								
২৩	সিলেট জেলায় সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	মোট	১৩৫০৪.১৯	৮৯৩৫.৪৯	৩৭১০.০০	৩৭০৭.৬৫	৩৪৬৩.০৩	১২৩৯৮.৫২
৩৮	উপজেলায় সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	স্থানীয়	১৩৫০৪.১৯	৮৯৩৫.৪৯	৩৭১০.০০	৩৭০৭.৬৫	৩৪৬৩.০৩	১২৩৯৮.৫২
একনেক ০৫-১১- ২০১৯	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭১.৫০	২৮.৫০		২১.২৮	৯২.৭৮
		আর্থিক %		৬৬.১৭	২৭.৪৭		২৫.৬৪	৯১.৮১
২৪	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (জানুয়ারী, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	১৯১৬৭.২৩	১২৪৬১.২৪	২৫২৫.০০	২৫২৫.০০	২৪৭০.১৫	১৪৯৩১.৩৯
৪৩	উপজেলায় সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (জানুয়ারী, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	স্থানীয়	১৯১৬৭.২৩	১২৪৬১.২৪	২৫২৫.০০	২৫২৫.০০	২৪৭০.১৫	১৪৯৩১.৩৯
একনেক ২৮-০১- ২০২০	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৬.৪৫	১৩.৫৫		১৩.৫৫	১০০.০০
		আর্থিক %		৬৫.০১	১৩.১৭		১২.৮৯	৭৭.৯০
২৫	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় কুশিয়ারা নদীর ডানতীরে অবস্থিত বাগময়না এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (মে, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৫)	মোট	৪৪৯১.০০	০.০০	৫০০.০০	৪৯৯.৪০	৪৯৯.৩০	৪৯৯.৩০
পরিঃ মন্ত্রী ২১-০৬- ২০২৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	স্থানীয়	৪৪৯১.০০	০.০০	৫০০.০০	৪৯৯.৪০	৪৯৯.৩০	৪৯৯.৩০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২০.০০		১৬.৫০	১৬.৫০
		আর্থিক %		০.০০	১১.১৩		১১.১২	১১.১২
২৬	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলায় কুশিয়ারা নদীর ডানতীরে অবস্থিত ফেসী বাজার ও ভাঙ্গাবাড়ী এলাকায় নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৪৭৭৭.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৯৯.৯৮	৪৯৯.৯৮
পরিঃ মন্ত্রী ১৩-০৬- ২০২৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	স্থানীয়	৪৭৭৭.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৯৯.৯৮	৪৯৯.৯৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২০.০০		১৫.৫০	১৫.৫০
		আর্থিক %		০.০০	১০.৪৭		১০.৪৭	১০.৪৭
২৭	সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ ও তাহিরপুর উপজেলায় শনির হাওরের লালুর গোয়ালা এবং সাহেব নগর স্থানের ডুবন্ত বাধের ২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে পাইলট জিওসেল প্রটেকশন প্রকল্প (জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৪)	মোট	৩৮২৩.০০	০.০০	৩৪০০.০০	৩৩৯৮.৪০	৩৩৪৩.৭৮	৩৩৪৩.৭৮
পরিঃ মন্ত্রী ০৮-০২- ২০২৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	স্থানীয়	৩৮২৩.০০	০.০০	৩৪০০.০০	৩৩৯৮.৪০	৩৩৪৩.৭৮	৩৩৪৩.৭৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৯০.০০		১০০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		০.০০	৮৮.৯৪		৮৭.৪৬	৮৭.৪৬

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অব্যয়িত (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৮	হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	মোট	৫৪১৭৩.৬৪	২১৪২২.৩৪	৮০০০.০০	৭৯৯৯.০০	৭৯৯৮.৯৭	২৯৪২১.৩১
৩৯		স্থানীয়	৫৪১৭৩.৬৪	২১৪২২.৩৪	৮০০০.০০	৭৯৯৯.০০	৭৯৯৮.৯৭	২৯৪২১.৩১
একনেক ১১-০২- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫০.৮৭	১৫.০০		১৭.০০	৬৭.৮৭
		আর্থিক %		৩৯.৫৪	১৪.৭৭		১৪.৭৭	৫৪.৩১
২৯	মনু নদীর ভাঙ্গন হতে মৌলভীবাজার জেলা সদর, রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৬)	মোট	৯৯৬২৮.০০	১৬২৪১.৮০	২১৫০০.০০	১৩৪৪৪.৮১	১৩৪৪১.০০	২৯৬৮২.৮০
৪৭		স্থানীয়	৯৯৬২৮.০০	১৬২৪১.৮০	২১৫০০.০০	১৩৪৪৪.৮১	১৩৪৪১.০০	২৯৬৮২.৮০
একনেক ২১-০৬- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৭.০০	১০.০০		১১.০০	৪৮.০০
		আর্থিক %		১৬.৩০	২১.৫৮		১৩.৪৯	২৯.৭৯
উপ-মোট : উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মোট	১৯৯৫৬৪.০৬	৫৯০৬০.৮৭	৪০১৩৫.০০	৩২০৭৪.২৬	৩১৭১৬.২১	৯০৭৭৭.০৮
		স্থানীয়	১৯৯৫৬৪.০৬	৫৯০৬০.৮৭	৪০১৩৫.০০	৩২০৭৪.২৬	৩১৭১৬.২১	৯০৭৭৭.০৮
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৭৯.৯২	৭৯.০২	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম								
৩০	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরী উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেজা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়া বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিকাশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪) ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ	মোট	১৬৩৬৯১.১৯	১৩৪৫৮৫.৩৮	১৮৯৭৫.০০	১৮৯৭৫.০০	১৮৯৭৫.০০	১৫৩৫৬০.৩৮
২০		স্থানীয়	১৬৩৬৯১.১৯	১৩৪৫৮৫.৩৮	১৮৯৭৫.০০	১৮৯৭৫.০০	১৮৯৭৫.০০	১৫৩৫৬০.৩৮
একনেক ৩০-০৮- ২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৯.০০	১১.০০		৮.০০	৯৭.০০
		আর্থিক %		৮২.২২	১১.৫৯		১১.৫৯	৯৩.৮১
৩১	খাগড়াছড়ি শহর ও তৎসংলগ্ন অবকাঠামো নদী ভাঙ্গন হতে সংরক্ষণ (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৫৮৬০০.৮৯	১৯৮৫.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৯৯.৯৮	৯৪৮৪.৯৮
৭৫		স্থানীয়	৫৮৬০০.৮৯	১৯৮৫.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৪৯৯.৯৮	৯৪৮৪.৯৮
একনেক ১৯-০৭- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪.৪০	১৪.০০		১৪.১৪	১৮.৫৪
		আর্থিক %		৩.৩৯	১২.৮০		১২.৮০	১৬.১৯
৩২	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় পোস্তার নং- ৭২ এর ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের স্থায়ী পুনর্বাসনসহ ঢাল সংরক্ষণ (সেপ্টেম্বর ২০২৩ হতে জুন ২০২৭) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৫৬২২১.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
৯৩		স্থানীয়	৫৬২২১.০০	০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
একনেক ১৮-০৭- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৪.০০		১.৫০	১.৫০
		আর্থিক %		০.০০	০.৮৯		০.৮৯	০.৮৯
৩৩	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোস্তার নং- ৬২ (পেতেঙ্গা), পোস্তার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোস্তার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	৫৭৭২৩.৯২	৪৮৬৫৩.২৭	৭১০০.০০	৭০৯৯.৩৫	৬৮৮১.২০	৫৫৫৩৪.৪৭
১৯		স্থানীয়	৫৭৭২৩.৯২	৪৮৬৫৩.২৭	৭১০০.০০	৭০৯৯.৩৫	৬৮৮১.২০	৫৫৫৩৪.৪৭
একনেক ০৯-০৮- ২০১৬		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯২.৫০	৭.৫০		৬.১০	৯৮.৬০
		আর্থিক %		৮৪.২৯	১২.৩০		১১.৯২	৯৬.২১
৩৪	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৪)	মোট	৩৫৪৮৬.৪৯	২৪১৪২.৭৯	১২১৬.০০	১২১৬.০০	১২১৬.২০	২৫৩৫৭.৯৯
২২		স্থানীয়	৩৫৪৮৬.৪৯	২৪১৪২.৭৯	১২১৬.০০	১২১৬.০০	১২১৬.২০	২৫৩৫৭.৯৯
একনেক ০৯-০১- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭২.২৫	৬.০০		৬.৫০	৭৮.৭৫
		আর্থিক %		৬৮.০৩	৩.৪৩		৩.৪২	৭১.৪৬
৩৫	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলাশয়/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিকাশন উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪) অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	১৬২০৭৩.৫০	২৪৭৭১.৯৫	২০০০০.০০	১৯৭৪৯.৪০	১৯৭৪৯.৪০	৪৪৫২১.৩৫
৩৩		স্থানীয়	১৬২০৭৩.৫০	২৪৭৭১.৯৫	২০০০০.০০	১৯৭৪৯.৪০	১৯৭৪৯.৪০	৪৪৫২১.৩৫
একনেক ২৭-০২- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৫.১৫	৯.০০		৯.০৫	৩৪.২০
		আর্থিক %		১৫.২৮	১২.৩৪		১২.১৯	২৭.৪৭
৩৬	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	১১৫৮৩৬.০০	৯১০০.০৭	১৪৫০০.০০	১৪১৩৮.৪০	১৪১৩৮.৪০	২৩২৩৮.৪৭
১৩৩		স্থানীয়	১১৫৮৩৬.০০	৯১০০.০৭	১৪৫০০.০০	১৪১৩৮.৪০	১৪১৩৮.৪০	২৩২৩৮.৪৭
একনেক ০৪-০৫- ২০২১		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১১.৮৭	১৩.০০		১৩.১০	২৪.৯৭
		আর্থিক %		৭.৮৬	১২.৫২		১২.২১	২০.০৬

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩৭	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শ্রীমাই খালে	মোট	১৩৩০৩.০০	০.০০	১৪০০.০০	১৩৯৯.৬০	১৩৯৯.৬০	১৩৯৯.৬০
৮১	Multipurpose Hydraulic Elevator	স্থানীয়	১৩৩০৩.০০	০.০০	১৪০০.০০	১৩৯৯.৬০	১৩৯৯.৬০	১৩৯৯.৬০
একনেক ১১-০৪- ২০২৩	DAM নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৬)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০.০০		১০.৬০	১০.৬০
		আর্থিক %		০.০০	১০.৫২		১০.৫২	১০.৫২
৩৮	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা	মোট	৪৩৫১৮.৪২	২৫৫৩০.৪০	৭০০০.০০	৬৯৯৯.২০	৬৯৯৯.৫৯	৩২৫২৬.৯৯
২৫	এবং রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলায়	স্থানীয়	৪৩৫১৮.৪২	২৫৫৩০.৪০	৭০০০.০০	৬৯৯৯.২০	৬৯৯৯.৫৯	৩২৫২৬.৯৯
একনেক ০৯-১০- ২০১৮	কর্তৃকুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে	বাস্তব %		৭০.০০	২০.০০		১০.০০	৮০.০০
	জুন, ২০২৪)	আর্থিক %		৫৮.৬৭	১৬.০৯		১৬.০৮	৭৪.৭৪
৩৯	কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ	মোট	৩৬৮৬৬.৭১	৯৮৩৬.৮১	৫০০০.০০	৪৯৯৯.৪০	৪৯৯৬.৮০	১৪৮৩৩.৬১
২৪	সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও	স্থানীয়	৩৬৮৬৬.৭১	৯৮৩৬.৮১	৫০০০.০০	৪৯৯৯.৪০	৪৯৯৬.৮০	১৪৮৩৩.৬১
একনেক ২৩-০১- ২০১৮	টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	পোস্তারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর,	বাস্তব %		২৬.০৭	১৩.৫৬		১৪.৫৫	৪০.৬২
	২০১৭ হতে জুন, ২০২৫)	আর্থিক %		২৬.৬৮	১৩.৫৬		১৩.৫৫	৪০.২৪
উপ-মোট : দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মোট	৭৪৩৩২১.১২	২৭৮৬০৫.৬৭	৮৩১৯১.০০	৮২৫৭৬.৩৫	৮২৩৫২.১৭	৩৬০৯৫৭.৮৪
		স্থানীয়	৭৪৩৩২১.১২	২৭৮৬০৫.৬৭	৮৩১৯১.০০	৮২৫৭৬.৩৫	৮২৩৫২.১৭	৩৬০৯৫৭.৮৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.২৬	৯৮.৯৯	
উপ-মোট: পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)		মোট	২১৭০৮৭৭.০১	৬১৪৩৮৪.১২	৩৩০২৩৬.০০	৩১৯৮৯০.৩২	৩১৮০৪৯.৫৯	৯৩২৪৩৩.৭১
		স্থানীয়	২১৭০৮৭৭.০১	৬১৪৩৮৪.১২	৩৩০২৩৬.০০	৩১৯৮৯০.৩২	৩১৮০৪৯.৫৯	৯৩২৪৩৩.৭১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৬.৮৭	৯৬.৩১	
উত্তরাঞ্চল, রংপুর								
৪০	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায়	মোট	৪৪৮৩১.০০	৩১৬৬৭.৪৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৯৯৯.৯৯	৩৭৬৬৭.৪৬
৩১	ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ভাঙ্গনরোধ প্রকল্প (১ম	স্থানীয়	৪৪৮৩১.০০	৩১৬৬৭.৪৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৫৯৯৯.৯৯	৩৭৬৬৭.৪৬
একনেক ২৭-০২- ২০১৯	সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৮.৮০	১৫.৬১		৮.৫৫	৮৭.৩৫
		আর্থিক %		৭০.৬৪	১৩.৩৮		১৩.৩৮	৮৪.০২
৪১	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী	মোট	৪৮০৪২.০০	৩৪২৬২.৯৯	১০৫০০.০০	১০৪৯৯.৭৮	১০০০৩.২০	৪৪২৬৬.১৯
৩৪	হতে ফুলুয়ারচর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর	স্থানীয়	৪৮০৪২.০০	৩৪২৬২.৯৯	১০৫০০.০০	১০৪৯৯.৭৮	১০০০৩.২০	৪৪২৬৬.১৯
একনেক ০৯-০৪- ২০১৯	(মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪)	বাস্তব %		৮৬.৬০	১৩.৪০		৯.০৭	৯৫.৬৭
		আর্থিক %		৭১.৩২	২১.৮৬		২০.৮২	৯২.১৪
৪২	কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও	মোট	৬২৯৪৫.২৮	২৩৪৩৫.০২	১৫০০০.০০	১০৮৪৭.৪৫	১০৮৩৬.৮২	৩৪২৭১.৮৪
৪৫	ফুলবাড়ী উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা	স্থানীয়	৬২৯৪৫.২৮	২৩৪৩৫.০২	১৫০০০.০০	১০৮৪৭.৪৫	১০৮৩৬.৮২	৩৪২৭১.৮৪
একনেক ০৩-০৩- ২০২০	নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সংশোধিত) (মার্চ, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৩.১৫	১৫.০০		৪.১৪	৬৭.২৯
		আর্থিক %		৩৭.২৩	২৩.৮৩		১৭.২২	৫৪.৪৫
৪৩	কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দুধকুমার নদী	মোট	৬৯২৬৮.০০	৫২২২.৩৭	১৭০০০.০০	১৪৯৯৭.৬০	১৪৯৮২.২৪	২০২০৪.৬১
৬১	ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২১	স্থানীয়	৬৯২৬৮.০০	৫২২২.৩৭	১৭০০০.০০	১৪৯৯৭.৬০	১৪৯৮২.২৪	২০২০৪.৬১
একনেক ১০-০৮- ২০২১	হতে জুন, ২০২৫)	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৮.০৫	২১.৬৬		১৫.০০	৩৩.০৫
		আর্থিক %		৭.৫৪	২৪.৫৪		২১.৬৩	২৯.১৭
৪৪	গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলায়	মোট	৪০১৭৫.৯৬	২১৪১৮.৪২	১৭৯১১.০০	১৭৯১০.৪০	১৭৪৪০.১৩	৩৮৮৫৮.৫৫
৫১	গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা	স্থানীয়	৪০১৭৫.৯৬	২১৪১৮.৪২	১৭৯১১.০০	১৭৯১০.৪০	১৭৪৪০.১৩	৩৮৮৫৮.৫৫
একনেক ২১-০৭- ২০২০	নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	সংশোধিত) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	বাস্তব %		৮১.১০	১৮.৮৫		১৭.৮৮	৯৮.৯৮
		আর্থিক %		৫৩.৩১	৪৪.৫৮		৪৩.৪১	৯৬.৭২

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪৫	যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন কাতলামারী ও সাঘাটা উপজেলাধীন গোবিন্দী এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৪)	মোট	৮৩০৯৬.৭৬	১৪১৬১.৯৭	২০০০০.০০	১৭৫০৪.৯৫	১৭৫০২.৯২	৩১৬৬৪.৮৯
৫৬		স্থানীয়	৮৩০৯৬.৭৬	১৪১৬১.৯৭	২০০০০.০০	১৭৫০৪.৯৫	১৭৫০২.৯২	৩১৬৬৪.৮৯
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৭-১১- ২০২০		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২১.৮২	২৪.০৭		১৯.৫০	৪১.৩২
		আর্থিক %		১৭.০৪	২৪.০৭		২১.০৬	৩৮.১১
৪৬	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার নদী তীর সংরক্ষণ, ছোট নদী, খাল- বিল পুনঃখনন ও জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	মোট	১৯০৩৭.৬৭	৭৮৯৮.৭৯	৬৬৮০.০০	৬৬৭৯.৪৮	৬৬৭৮.৮৭	১৪৫৭৭.৬৬
১৩৪		স্থানীয়	১৯০৩৭.৬৭	৭৮৯৮.৭৯	৬৬৮০.০০	৬৬৭৯.৪৮	৬৬৭৮.৮৭	১৪৫৭৭.৬৬
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০৫-১০- ২০২১		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫২.৩৩	২৯.৪২		২৬.০২	৭৮.৩৫
		আর্থিক %		৪১.৪৯	৩৫.০৯		৩৫.০৮	৭৬.৫৭
৪৭	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪) এ সমাপ্ত	মোট	৪৯৩৪.৯৫	২৯৯৬.৪২	১৪৭৫.০০	১৪৭৪.৮০	১৪৩২.৯৫	৪৪২৯.৩৭
৬৬		স্থানীয়	৪৯৩৪.৯৫	২৯৯৬.৪২	১৪৭৫.০০	১৪৭৪.৮০	১৪৩২.৯৫	৪৪২৯.৩৭
পরিঃ মন্ত্রী		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১০-০২- ২০২২		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯০.৩২	৯.৬৮		৯.৬৮	১০০.০০
		আর্থিক %		৬০.৭২	২৯.৮৯		২৯.০৪	৮৯.৭৬
৪৮	নীলফামারী জেলার চাড়ালাকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	১৬৯১৮.৪১	১১৯৯০.৭২	২৩৩৫.০০	২২৭২.৯৫	২২৭০.১০	১৪২৬০.৮২
৩২		স্থানীয়	১৬৯১৮.৪১	১১৯৯০.৭২	২৩৩৫.০০	২২৭২.৯৫	২২৭০.১০	১৪২৬০.৮২
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩০-০৪- ২০১৯		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৩.৪৭	১৬.৫৩		১৬.৫৩	১০০.০০
		আর্থিক %		৭০.৮৭	১৩.৮০		১৩.৪২	৮৪.২৯
৪৯	তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	মোট	১৪৫২৩৩.০০	১১৯৭০.৭৮	৩৪৫০০.০০	৩৩৪৮৪.০০	৩৩৪৬৩.৫০	৪৫৪৩৪.২৮
১৩১		স্থানীয়	১৪৫২৩৩.০০	১১৯৭০.৭৮	৩৪৫০০.০০	৩৩৪৮৪.০০	৩৩৪৬৩.৫০	৪৫৪৩৪.২৮
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০৪-০৫- ২০২১		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১৭.০০	২৭.০০		২১.০০	৩৮.০০
		আর্থিক %		৮.২৪	২৩.৭৫		২৩.০৪	৩১.২৮
৫০	দিনাজপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং দিনাজপুর শহর সলগ্ন টেপা ও গর্ভেধুরী নদী সিস্টেম ড্রেজিং/খনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৩৪০২২.৫৮	১৯৪৪২.১৪	৮৯৫০.০০	৮৯৪৯.৫৬	৮৮৮৪.৯২	২৮৩২০.০৬
৪৮		স্থানীয়	৩৪০২২.৫৮	১৯৪৪২.১৪	৮৯৫০.০০	৮৯৪৯.৫৬	৮৮৮৪.৯২	২৮৩২০.০৬
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০৬-০৭- ২০২০		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৯.১২	১৮.০০		১৭.৮২	৮৬.৯৪
		আর্থিক %		৫৭.১৪	২৬.৩১		২৬.১১	৮৩.২৬
৫১	দিনাজপুর জেলার টেপা, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	১৮০০৫.৩২	৫৬৯৫.৮৬	১১৭০৪.০০	১১৭০২.৫৮	১১৬৬১.৮০	১৭৩৫৭.৬৬
৬২		স্থানীয়	১৮০০৫.৩২	৫৬৯৫.৮৬	১১৭০৪.০০	১১৭০২.৫৮	১১৬৬১.৮০	১৭৩৫৭.৬৬
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৪-০৮- ২০২১		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪১.০৫	৫৮.৯৫		৫৮.৪৫	৯৯.৫০
		আর্থিক %		৩১.৬৩	৬৫.০০		৬৪.৭৭	৯৬.৪০
৫২	ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন ব্যারেজ, বুড়ি বাঁধ ও ভুল্লি বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন, নদীতীর সংরক্ষণ ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	মোট	৩৩৬২৫.১৩	৮৮৬৪.৪৫	১০১৪০.০০	৯১২৮.৮০	৯০২৬.৩৫	১৭৮৯০.৮০
১৩২		স্থানীয়	৩৩৬২৫.১৩	৮৮৬৪.৪৫	১০১৪০.০০	৯১২৮.৮০	৯০২৬.৩৫	১৭৮৯০.৮০
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০৮-০৬- ২০২১		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৫.০২	২৫.৭০		২০.৬৯	৫৫.৭১
		আর্থিক %		২৬.৩৬	৩০.১৬		২৬.৮৪	৫৩.২১
উপ-মোট : উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট	৬২০১৩৬.০৬	১৯৯০২৭.৪০	১৬২১৯৫.০০	১৫১৪৫২.৩৫	১৫০১৮৩.৭৯	৩৪৯২১১.১৯
		স্থানীয়	৬২০১৩৬.০৬	১৯৯০২৭.৪০	১৬২১৯৫.০০	১৫১৪৫২.৩৫	১৫০১৮৩.৭৯	৩৪৯২১১.১৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৩.৩৮	৯২.৫৯	
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী								
৫৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৫) ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট	২৪৬৮৮.৭১	১৩৫৭৭.৭৮	৬০০০.০০	৫৯৯৮.৪৭	৫৯৯৭.৩০	১৯৫৭৫.০৮
২৩		স্থানীয়	২৪৬৮৮.৭১	১৩৫৭৭.৭৮	৬০০০.০০	৫৯৯৮.৪৭	৫৯৯৭.৩০	১৯৫৭৫.০৮
একনেক		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৬-০১- ২০১৮		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৪.৯৯	১৩.০০		১৩.০০	৮৭.৯৯
		আর্থিক %		৫৫.০০	২৪.৩০		২৪.২৯	৭৯.২৯

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিতৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫৪	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ও শাজাহানপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৬০৩৮৫.২৭	১৯৫৩৩.৫৯	২২০০০.০০	২১৯৯৯.৬০	২১৯৯৯.৪৭	৪১৫৩৩.০৬
৪১		স্থানীয়	৬০৩৮৫.২৭	১৯৫৩৩.৫৯	২২০০০.০০	২১৯৯৯.৬০	২১৯৯৯.৪৭	৪১৫৩৩.০৬
একনেক ০৩-০৩- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪১.৫০	৩০.০০		৩০.৫৫	৭২.০৫
		আর্থিক %		৩২.৩৫	৩৬.৪৩		৩৬.৪৩	৬৮.৭৮
৫৫	রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরে স্থাপনা সমূহ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৭৪৪৬০.৭৩	২৬৪৪৭.৫১	৩০০০০.০০	২৯৯৯৭.০০	২৯৯৫৩.৪২	৫৬৪০০.৯৩
৪২		স্থানীয়	৭৪৪৬০.৭৩	২৬৪৪৭.৫১	৩০০০০.০০	২৯৯৯৭.০০	২৯৯৫৩.৪২	৫৬৪০০.৯৩
একনেক ১৮-০২- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬০.২১	২০.০০		১৯.১০	৭৯.৩১
		আর্থিক %		৩৫.৫২	৪০.২৯		৪০.২৩	৭৫.৭৫
৫৬	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	মোট	১৭৬৩৬.৪১	১০১৪৪.১২	৫৬৫০.০০	৫৫৮৪.২৪	৫২৫৮.০৪	১৫৪০২.১৬
৪৯		স্থানীয়	১৭৬৩৬.৪১	১০১৪৪.১২	৫৬৫০.০০	৫৫৮৪.২৪	৫২৫৮.০৪	১৫৪০২.১৬
একনেক ০৬-০৭- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৬.০০	২৪.০০		১৯.০০	৯৫.০০
		আর্থিক %		৫৭.৫২	৩২.০৪		২৯.৮১	৮৭.৩৩
৫৭	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	মোট	৪৩৭৭১.১৮	১৯৪৫১.০০	১৭৫০০.০০	১৭৪৮২.৫১	১৭০৪০.৪৬	৩৬৪৯১.৪৬
৪৪		স্থানীয়	৪৩৭৭১.১৮	১৯৪৫১.০০	১৭৫০০.০০	১৭৪৮২.৫১	১৭০৪০.৪৬	৩৬৪৯১.৪৬
একনেক ০৩-০৩- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৭.০০	২৩.০০		১৩.০০	৯০.০০
		আর্থিক %		৪৪.৪৪	৩৯.৯৮		৩৮.৯৩	৮৩.৩৭
৫৮	পাবনা জেলার ইছামতি নদী পুনরুজ্জীবিতকরণ (নভেম্বর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৭)	মোট	১৫৫৪৯০.০০	০.০০	১০০০.০০	৯৪০.০০	৯৪০.০০	৯৪০.০০
১৩৯		স্থানীয়	১৫৫৪৯০.০০	০.০০	১০০০.০০	৯৪০.০০	৯৪০.০০	৯৪০.০০
একনেক ৩১-১০- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০০		০.৬০	০.৬০
		আর্থিক %		০.০০	০.৬৪		০.৬০	০.৬০
৫৯	সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাসপুকুরিয়া হতে চর-সলিমাবাদ পর্যন্ত যমুনা নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণ (জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৪)	মোট	৪৬৮৯.৮৪	০.০০	৪৬২৫.০০	৪৬২৫.০০	৪৬২৩.৬৭	৪৬২৩.৬৭
৮০		স্থানীয়	৪৬৮৯.৮৪	০.০০	৪৬২৫.০০	৪৬২৫.০০	৪৬২৩.৬৭	৪৬২৩.৬৭
পরিঃ মন্ত্রী ০২-০৩- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		১০০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		০.০০	৯৮.৬২		৯৮.৫৯	৯৮.৫৯
৬০	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় সিংড়াবাড়ী, পাটখামা ও বাত্রীখোলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৫৬০০৭.৫৮	২৪৬৭২.৬৬	১৮৪২০.০০	১৮৪১৯.৩০	১৮৪১৯.৩০	৪৩০৯১.৯৬
৫৫		স্থানীয়	৫৬০০৭.৫৮	২৪৬৭২.৬৬	১৮৪২০.০০	১৮৪১৯.৩০	১৮৪১৯.৩০	৪৩০৯১.৯৬
একনেক ০৩-১১- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৫.০৫	১৪.৯৫		১১.০৫	৮৬.১০
		আর্থিক %		৪৪.০৫	৩২.৮৯		৩২.৮৯	৭৬.৯৪
৬১	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলায় ব্রাহ্মপুখুরিয়া-হাটপাটিল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ এবং বেতিল স্পার-১ এবং এনায়েতপুর স্পার-২ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৬৪৭৪৯.১২	৭৭৯৭.৭৬	২০৩৬৯.০০	২০৩৬৭.৮৩	২০৩৬৭.৩০	২৮১৬৫.০৬
৬০		স্থানীয়	৬৪৭৪৯.১২	৭৭৯৭.৭৬	২০৩৬৯.০০	২০৩৬৭.৮৩	২০৩৬৭.৩০	২৮১৬৫.০৬
একনেক ০৮-০৬- ২০২১		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২৭.০০	২৩.০০		২৫.৭৪	৫২.৭৪
		আর্থিক %		১২.০৪	৩১.৪৬		৩১.৪৬	৪৩.৫০
৬২	বগুড়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকায় করতোয়া নদী পুনঃখনন ও ডান তীরে স্লোপ প্রটেকশন কাজ (নভেম্বর, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৪৭১৩.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৮.৬০	১৪৯৮.৫৪	১৪৯৮.৫৪
১০০		স্থানীয়	৪৭১৩.০০	০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৮.৬০	১৪৯৮.৫৪	১৪৯৮.৫৪
পরিঃ মন্ত্রী ৩০-১০- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	২৫.০০		৫৫.৬০	৫৫.৬০
		আর্থিক %		০.০০	৩১.৮৩		৩১.৮০	৩১.৮০
৬৩	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	২৩৩০৪১.১৮	১০৮০৬৮.০১	৭৯৬৯৭.০০	৭৬৮০০.০০	৭৬৭৯৯.৭৬	১৮৪৮৬৭.৭৭
৩০		স্থানীয়	২৩৩০৪১.১৮	১০৮০৬৮.০১	৭৯৬৯৭.০০	৭৬৮০০.০০	৭৬৭৯৯.৭৬	১৮৪৮৬৭.৭৭
একনেক ০৭-১১- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৭.০০	১৫.০০		১৫.৫০	৮২.৫০
		আর্থিক %		৪৬.৩৭	৩৪.২০		৩২.৯৬	৭৯.৩৩
অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী								

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
উপ-মোটঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মোট	৭৩৯৬৩৩.০২	২২৯৬৯২.৪৩	২০৬৭৬১.০০	২০৩৭১২.৫৫	২০২৮৯৭.২৬	৪৩২৫৮৯.৬৯
		স্থানীয়	৭৩৯৬৩৩.০২	২২৯৬৯২.৪৩	২০৬৭৬১.০০	২০৩৭১২.৫৫	২০২৮৯৭.২৬	৪৩২৫৮৯.৬৯
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৮.৫৩	৯৮.১৩	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মোট	১৩৫৯৭৬৯.০৮	৪২৮৭১৯.৮৩	৩৬৮৯৫৬.০০	৩৫৫১৬৪.৯০	৩৫৩০৮১.০৪	৭৮১৮০০.৮৭
		স্থানীয়	১৩৫৯৭৬৯.০৮	৪২৮৭১৯.৮৩	৩৬৮৯৫৬.০০	৩৫৫১৬৪.৯০	৩৫৩০৮১.০৪	৭৮১৮০০.৮৭
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৬.২৬	৯৫.৭০	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর								
৬৪	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্রা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	৫৯৬৫২.৮২	৫৪৪৮৭.১৭	৪০২০.০০	৪০১৯.৬০	৪০১৫.৬৭	৫৮৫০২.৮৪
স্থানীয়		৫৯৬৫২.৮২	৫৪৪৮৭.১৭	৪০২০.০০	৪০১৯.৬০	৪০১৫.৬৭	৫৮৫০২.৮৪	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %		৯৩.০০	৭.০০	৭.০০	১০০.০০			
	আর্থিক %	৯১.৩৪	৬.৭৪	৬.৭৩	৯৮.০৭			
৬৫	শরীয়তপুর জেলার কীর্তিনাশা নদীর ডান ও বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৩৫৭৮৭.৭৬	১০১৯৭.২৯	১৬০০০.০০	১৫৯৯৮.০০	১৫৯৮৫.৯৩	২৬১৮৩.২২
স্থানীয়		৩৫৭৮৭.৭৬	১০১৯৭.২৯	১৬০০০.০০	১৫৯৯৮.০০	১৫৯৮৫.৯৩	২৬১৮৩.২২	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %		৩৫.০০	৩৫.০০	৪৫.০০	৮০.০০			
	আর্থিক %	২৮.৪৯	৪৪.৭১	৪৪.৬৭	৭৩.১৬			
৬৬	শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫)	মোট	৫৯১৪৬.৩৭	৯৯৮.৩২	২৪০০০.০০	২৩৯৯৮.০০	২৩৯৯৩.৪৬	২৪৯৯১.৭৮
স্থানীয়		৫৯১৪৬.৩৭	৯৯৮.৩২	২৪০০০.০০	২৩৯৯৮.০০	২৩৯৯৩.৪৬	২৪৯৯১.৭৮	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %		৩.০০	৩৫.০০	৪৫.০০	৪৮.০০			
	আর্থিক %	১.৬৯	৪০.৫৮	৪০.৫৭	৪২.২৫			
৬৭	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার পদ্মা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে মাঝিরাঘাট জিরো পয়েন্ট এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর ২০২৩ হতে জুন ২০২৬) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৮৫৯৭৬.৮৬	০.০০	৩১৮০.০০	৩১৭৮.৮০	৩১৭৬.৭৪	৩১৭৬.৭৪
স্থানীয়		৮৫৯৭৬.৮৬	০.০০	৩১৮০.০০	৩১৭৮.৮০	৩১৭৬.৭৪	৩১৭৬.৭৪	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %		০.০০	০.০০	৩.৭০	৪.০০	৪.০০	০.০০	
	আর্থিক %	০.০০	৩.৭০	৩.৬৯	৩.৬৯			
৬৮	ফরিদপুর জেলার মধুমতি নদীর বামতীরের ভাঙ্গন হতে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ স্মৃতি যাদুঘর সংযোগ রাস্তাসহ অন্যান্য এলাকা সংরক্ষণ ও ড্রেজিং (মার্চ, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৬) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৪৮১১০.০০	০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৫.০০	৩৯৯৪.২৭	৩৯৯৪.২৭
স্থানীয়		৪৮১১০.০০	০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৫.০০	৩৯৯৪.২৭	৩৯৯৪.২৭	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %		০.০০	০.০০	১০.৩৯	৯.০০	৯.০০	০.০০	
	আর্থিক %	০.০০	৮.৩১	৮.৩০	৮.৩০			
৬৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	মোট	১৪৭৭২.৫৯	৮২৯১.৬৫	২৫০০.০০	২৪৯৮.২৫	২৪৯৭.৩৫	১০৭৮৯.০০
স্থানীয়		১৪৭৭২.৫৯	৮২৯১.৬৫	২৫০০.০০	২৪৯৮.২৫	২৪৯৭.৩৫	১০৭৮৯.০০	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %		৬৩.০০	২৮.৬০	২৫.৬০	৮৮.৬০			
	আর্থিক %	৫৬.১৩	১৬.৯২	১৬.৯১	৭৩.০৩			
৭০	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫) ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	মোট	৪০৪২৮.২৪	১৬২০১.৫৮	১৫৮০০.০০	১৫৭৯৯.২০	১৫৭৯৯.০৮	৩২০০০.৬৬
স্থানীয়		৪০৪২৮.২৪	১৬২০১.৫৮	১৫৮০০.০০	১৫৭৯৯.২০	১৫৭৯৯.০৮	৩২০০০.৬৬	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %		৫৯.৬২	২৭.০০	২২.২৪	৮১.৮৬			
	আর্থিক %	৪০.০৭	৩৯.০৮	৩৯.০৮	৭৯.১৫			
৭১	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (আগষ্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪)	মোট	২৭৩০৭.৩৫	১০৪৬৫.৮৫	৬৭০০.০০	৬৬৬১.১৪	৬৬৫০.৬৮	১৭১১৬.৫৩
স্থানীয়		২৭৩০৭.৩৫	১০৪৬৫.৮৫	৬৭০০.০০	৬৬৬১.১৪	৬৬৫০.৬৮	১৭১১৬.৫৩	
প্রকল্প সাঃ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
বাস্তব %		৪৪.৩৪	২১.৫০	২১.৭০	৬৬.০৪			
	আর্থিক %	৩৮.৩৩	২৪.৫৪	২৪.৩৫	৬২.৬৮			

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৭২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলাধীন তালবাড়িয়া ও কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৬)	মোট	১৪৭১৯৮.০০	০.০০	৫০০.০০	৩৪৯.৮০	৩৩০.৫৬	৩৩০.৫৬
১০৫	উপজেলাধীন তালবাড়িয়া ও কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নের কোমরকান্দি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৬)	স্থানীয়	১৪৭১৯৮.০০	০.০০	৫০০.০০	৩৪৯.৮০	৩৩০.৫৬	৩৩০.৫৬
একনেক ৩১-১০- ২০২৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০০		১.০২	১.০২
		আর্থিক %		০.০০	০.৩৪		০.২২	০.২২
৭৩	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৬৭৩৭৩.৩৫	৩৯১৫৮.৬০	১৯০০০.০০	১৮৯৭৫.৬৭	১৮৮৯৫.০০	৫৮০৫৩.৬০
২৯		স্থানীয়	৬৭৩৭৩.৩৫	৩৯১৫৮.৬০	১৯০০০.০০	১৮৯৭৫.৬৭	১৮৮৯৫.০০	৫৮০৫৩.৬০
একনেক ২৩-১০- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৭৪.৩২	১০.০০		১৬.৬০	৯০.৯২
		আর্থিক %		৫৮.১২	২৮.২০		২৮.০৫	৮৬.১৭
উপ-মোট : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট	৫৮৫৭৫৩.৩৪	১৩৯৮০০.৪৬	৯৫৭০০.০০	৯৫৪৭৫.৪৬	৯৫৩৩৮.৭৪	২৩৫১৩৯.২০
		স্থানীয়	৫৮৫৭৫৩.৩৪	১৩৯৮০০.৪৬	৯৫৭০০.০০	৯৫৪৭৫.৪৬	৯৫৩৩৮.৭৪	২৩৫১৩৯.২০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %				৯৯.৭৬	৯৯.৬২	৯৯.৬২
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল								
৭৪	বরিশাল জেলার কারখানা, বিঘাই এবং পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৬)	মোট	৬৭৬০০.০০	০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৫.৮০	৩৯৯৪.৮০	৩৯৯৪.৮০
৮২	অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	স্থানীয়	৬৭৬০০.০০	০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৫.৮০	৩৯৯৪.৮০	৩৯৯৪.৮০
একনেক ১৭-০১- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৬.০০		৬.০০	৬.০০
		আর্থিক %		০.০০	৫.৯২		৫.৯১	৫.৯১
৭৫	বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় চরকাউয়া, চাঁদমারী, জাওয়া, লামচরি এবং চরমোনাই এলাকা কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই ২০২৩ হতে জুন ২০২৬)	মোট	৫১২৯২.০০	০.০০	৬০০০.০০	৫৯৯৯.৬০	৫৯৯৯.৬০	৫৯৯৯.৬০
একনেক ১৮-০৪- ২০২৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	স্থানীয়	৫১২৯২.০০	০.০০	৬০০০.০০	৫৯৯৯.৬০	৫৯৯৯.৬০	৫৯৯৯.৬০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১১.৭০		৬.০০	৬.০০
		আর্থিক %		০.০০	১১.৭০		১১.৭০	১১.৭০
৭৬	মেঘনার শাখা নদীর ভাঙ্গন হতে হিজলা উপজেলাধীন পুরাতন হিজলা, বাউশিয়া ও হরিনাথপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৭)	মোট	৬২৮৮৬.০০	০.০০	১১৯৭.০০	১১৯২.৮০	১১৮৯.৫৪	১১৮৯.৫৪
১০৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	স্থানীয়	৬২৮৮৬.০০	০.০০	১১৯৭.০০	১১৯২.৮০	১১৮৯.৫৪	১১৮৯.৫৪
একনেক ১২-০৯- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১.০০		২.০০	২.০০
		আর্থিক %		০.০০	১.৯০		১.৮৯	১.৮৯
৭৭	বরিশাল জেলার বাণুগঞ্জ উপজেলাধীন বরিশাল বিমানবন্দর এলাকা সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (আগস্ট, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৪৫৭০.০০	০.০০	১৩০০.০০	১২৯৯.৪০	১২৯৮.২৬	১২৯৮.২৬
পরিঃ মন্ত্রী ২১-০৯- ২০২৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	স্থানীয়	৪৫৭০.০০	০.০০	১৩০০.০০	১২৯৯.৪০	১২৯৮.২৬	১২৯৮.২৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৩০.০০		৩০.০০	৩০.০০
		আর্থিক %		০.০০	২৮.৪৫		২৮.৪১	২৮.৪১
৭৮	সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বালকাঠি জেলার সদর উপজেলা ও নলছিটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৭)	মোট	৬৮০৩৬.০০	০.০০	৩১.০০	২৭.৩০	২৬.৯৪	২৬.৯৪
একনেক ০৯-১১- ২০২৩	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	স্থানীয়	৬৮০৩৬.০০	০.০০	৩১.০০	২৭.৩০	২৬.৯৪	২৬.৯৪
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৪০		০.০৪	০.০৪
		আর্থিক %		০.০০	০.০৫		০.০৪	০.০৪
৭৯	তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ধুলিয়া লঞ্চঘাট থেকে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার দুর্গাপাশা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৬)	মোট	৭৪৮০২.৬৩	১৭৮৬৯.৬৪	১৭০০০.০০	১৬৯৯৮.৬০	১৬৯৯৬.৫৯	৩৪৮৬৬.২৩
৫২		স্থানীয়	৭৪৮০২.৬৩	১৭৮৬৯.৬৪	১৭০০০.০০	১৬৯৯৮.৬০	১৬৯৯৬.৫৯	৩৪৮৬৬.২৩
একনেক ১৮-০৮- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৬.০০	২০.০০		১৪.১৫	৫০.১৫
		আর্থিক %		২৩.৮৯	২২.৭৩		২২.৭২	৪৬.৬১
৮০	বরগুনা জেলার অধীন পোস্তার ৪৩/১ ও ৪৪বি পূর্ববাসিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ অংশ পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রতিরক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫)	মোট	৭১২২৫.০০	৪৯৮.৯০	৬৫০০.০০	৬৪৯৮.৮০	৬৪৯১.১৭	৬৯৯০.০৭
৬৮		স্থানীয়	৭১২২৫.০০	৪৯৮.৯০	৬৫০০.০০	৬৪৯৮.৮০	৬৪৯১.১৭	৬৯৯০.০৭
একনেক ০৪-০১- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৭০	৮.৭৫		১০.৩০	১১.০০
		আর্থিক %		০.৭০	৯.১৩		৯.১১	৯.৮১

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৮১	বরগুনা জেলাধীন পোস্তার নং-৪১/৬এ ও ৪১/৬বি ও ৪১/৭এ পুনর্বাসন এবং বেতাগী শহরসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অংশে বিঘখালী ও পায়রা নদীর ভাংগন হতে প্রতিরক্ষা (এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৫)	মোট	৮২৬৪৯.২৫	৪৮২.১৪	৬০০০.০০	৫৯৯৮.৮০	৫৯৯১.৪৬	৬৪৭৩.৬০
একনেক ২২-০২- ২০২২		স্থানীয়	৮২৬৪৯.২৫	৪৮২.১৪	৬০০০.০০	৫৯৯৮.৮০	৫৯৯১.৪৬	৬৪৭৩.৬০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.৬০	৬.১০		৯.৪০	১০.০০
		আর্থিক %		০.৫৮	৭.২৬		৭.২৫	৭.৮৩
৮২	ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৫৫৭৩৮.৬৯	১৫৫৬৭.২৫	১৫০০০.০০	১৪৯৮৩.০০	১৪৯৭৯.১১	৩০৫৪৬.৩৬
একনেক ১৬-০২- ২০২১		স্থানীয়	৫৫৭৩৮.৬৯	১৫৫৬৭.২৫	১৫০০০.০০	১৪৯৮৩.০০	১৪৯৭৯.১১	৩০৫৪৬.৩৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৫.০০	২৩.০০		২৩.০০	৫৮.০০
		আর্থিক %		২৭.৯৩	২৬.৯১		২৬.৮৭	৫৪.৮০
৮৩	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা সদর উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২৩ থেকে জুন, ২০২৭) ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৬৮৯১০.০০	০.০০	২৩৪.০০	২৩০.০০	২২২.৪৮	০.০০
একনেক ০৯-১১- ২০২৩		স্থানীয়	৬৮৯১০.০০	০.০০	২৩৪.০০	২৩০.০০	২২২.৪৮	০.০০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	০.৩৪		০.৩৪	০.৩৪
		আর্থিক %		০.০০	০.৩৪		০.৩২	০.৩২
৮৪	ভোলা জেলার মুজিব নগর ও মনপুরায় উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬)	মোট	১১১৭০০.০০	২৯৯৯.২০	২০০০০.০০	১৯৯৯৮.৮০	১৯৯৯২.৪৬	২২৯৯১.৬৬
একনেক ২২-০২- ২০২২		স্থানীয়	১১১৭০০.০০	২৯৯৯.২০	২০০০০.০০	১৯৯৯৮.৮০	১৯৯৯২.৪৬	২২৯৯১.৬৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.৫০	১৮.৩০		১৭.২৫	২০.৭৫
		আর্থিক %		২.৬৯	১৭.৯১		১৭.৯০	২০.৫৮
৮৫	তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলায় উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	১১০০০০.০০	২৯৯৯.৪০	৩০০০০.০০	২৯৯৯৭.২০	২৯৯৯৫.৪০	৩২৯৯৪.৮০
একনেক ০৫-০৪- ২০২২		স্থানীয়	১১০০০০.০০	২৯৯৯.৪০	৩০০০০.০০	২৯৯৯৭.২০	২৯৯৯৫.৪০	৩২৯৯৪.৮০
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩.৭৫	২৭.৩৬		২৬.৫০	৩০.২৫
		আর্থিক %		২.৭৩	২৭.২৭		২৭.২৭	৩০.০০
উপ-মোট : দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মোট	৮২৯৪০৯.৫৭	৪০৪১৬.৫৩	১০৭২৬২.০০	১০৭২২০.১০	১০৭১৭৭.৮১	১৪৭৩৭১.৮৬
		স্থানীয়	৮২৯৪০৯.৫৭	৪০৪১৬.৫৩	১০৭২৬২.০০	১০৭২২০.১০	১০৭১৭৭.৮১	১৪৭৩৭১.৮৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আর্থিক %					৯৯.৯৬	৯৯.৯২
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা								
৮৬	খুলনা জেলার পোস্তার নং-১৪/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	মোট	১১৭২৩১.২৫	১২৪৭.৫০	৯০০০.০০	৮৯৯৭.০০	৮৯৩৮.২৫	১০১৮৫.৭৫
একনেক ২৩-১১- ২০২১		স্থানীয়	১১৭২৩১.২৫	১২৪৭.৫০	৯০০০.০০	৮৯৯৭.০০	৮৯৩৮.২৫	১০১৮৫.৭৫
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.০৬	১০.০০		৯.৪৪	১০.৫০
		আর্থিক %		১.০৬	৭.৬৮		৭.৬২	৮.৬৮৯
৮৭	সাতক্ষীরা জেলার পোস্তার নং-১, ২, ৬-৮ এবং ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৪৬৫৮৪.০০	১৪৭৮১.৬০	১৪০০০.০০	১৩৯৬৯.৯২	১৩৮৩৮.০১	২৮৬১৯.৬১
একনেক ০২-০৬- ২০২০		স্থানীয়	৪৬৫৮৪.০০	১৪৭৮১.৬০	১৪০০০.০০	১৩৯৬৯.৯২	১৩৮৩৮.০১	২৮৬১৯.৬১
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৫.০০	১৫.০০		১১.৫০	৭৬.৫০
		আর্থিক %		৩১.৭৩	৩০.০৫		২৯.৭১	৬১.৪৪
৮৮	সাতক্ষীরা জেলার পোস্তার নং-১৫ পুনর্বাসন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	১০২০৪২.৯২	৫১৮৯.৪৪	১৬০০০.০০	১৫৯৯৭.৮০	১৫৯৮৮.২৮	২১১৭৭.৭২
একনেক ০৭-০৯- ২০২১		স্থানীয়	১০২০৪২.৯২	৫১৮৯.৪৪	১৬০০০.০০	১৫৯৯৭.৮০	১৫৯৮৮.২৮	২১১৭৭.৭২
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮.২০	১৬.০০		১৬.০০	২৪.২০
		আর্থিক %		৫.০৯	১৫.৬৮		১৫.৬৭	২০.৭৫
৮৯	পানুগুহি নদীর ভাংগন হতে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলা সদর এবং সংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ এবং বিঘখালী নদী পুনঃখনন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	মোট	৬৫৮৮৩.০০	৭৯০.৪৮	৭৫০০.০০	৭৪৯৬.৭০	৭৪৮৮.৫৮	৮২৭৯.০৬
একনেক ১৯-০৪- ২০২২		স্থানীয়	৬৫৮৮৩.০০	৭৯০.৪৮	৭৫০০.০০	৭৪৯৬.৭০	৭৪৮৮.৫৮	৮২৭৯.০৬
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		১.৫৫	১৫.০০		১৫.০০	১৬.৫৫
		আর্থিক %		১.২০	১১.৩৮		১১.৩৭	১২.৫৭

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯০	মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	মোট	৩৪২৭৫.৩৩	১৬৮৯৪.৭৭	৮৫০০.০০	৭৪৯৮.৪৫	৭৪৭৫.৫৬	২৪৩৭০.৩৩
৩৭		স্থানীয়	৩৪২৭৫.৩৩	১৬৮৯৪.৭৭	৮৫০০.০০	৭৪৯৮.৪৫	৭৪৭৫.৫৬	২৪৩৭০.৩৩
একনেক ২০-০৮- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৬.০০	২৪.০০		২২.০০	৭৮.০০
	আর্থিক %		৪৯.২৯	২৪.৮০		২১.৮১	৭১.১০	
৯১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৫৩১০৭.০০	১৩৪৬৪.৩০	৯৭০০.০০	৯৬৯৯.০০	৯৬২৯.৫২	২৩০৯৩.৮২
৫৩		স্থানীয়	৫৩১০৭.০০	১৩৪৬৪.৩০	৯৭০০.০০	৯৬৯৯.০০	৯৬২৯.৫২	২৩০৯৩.৮২
একনেক ১৮-০৮- ২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫২.৬৭	১৮.২৭		১৮.৩৫	৭১.০২
	আর্থিক %		২৫.৩৫	১৮.২৭		১৮.১৩	৪৩.৪৯	
উপ-মোট : দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	মোট	৪১৯১২৩.৫০	৫২৩৬৮.০৯	৬৪৭০০.০০	৬৩৬৫৮.৮৭	৬৩৩৫৮.২০	১১৫৭২৬.২৯	
	স্থানীয়	৪১৯১২৩.৫০	৫২৩৬৮.০৯	৬৪৭০০.০০	৬৩৬৫৮.৮৭	৬৩৩৫৮.২০	১১৫৭২৬.২৯	
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আর্থিক %				৯৮.৩৯	৯৭.৯৩		
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	মোট	১৮৩৪২৮৬.৪১	২৩২৫৮৫.০৮	২৬৭৬৬২.০০	২৬৬৩৫২.৪৩	২৬৫৮৭৪.৭৫	৪৯৮২৩৭.৩৫	
	স্থানীয়	১৮৩৪২৮৬.৪১	২৩২৫৮৫.০৮	২৬৭৬৬২.০০	২৬৬৩৫২.৪৩	২৬৫৮৭৪.৭৫	৪৯৮২৩৭.৩৫	
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	আর্থিক %				৯৯.৫১	৯৯.৩৩		
বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ								
৯২	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Jhalakathi, Barguna & Patuakhali District (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২৩) জুন, ২০২৪ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।	মোট	৩২৮০০০.০০	২৪৮০৫৪.৩৩	৪৫৫০০.০০	৩৭৪৭৮.৩৪	৩৭৪৭৮.৩৪	২৮৫৫৩২.৬৭
৮৩		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
একনেক ০১-১০- ২০১৩		প্রকল্প সাঃ	৩২৮০০০.০০	২৪৮০৫৪.৩৩	৪৫৫০০.০০	৩৭৪৭৮.৩৪	৩৭৪৭৮.৩৪	২৮৫৫৩২.৬৭
		আরপিএ	৩২৮০০০.০০	২৪৮০৫৪.৩৩	৪৫৫০০.০০	৩৭৪৭৮.৩৪	৩৭৪৭৮.৩৪	২৮৫৫৩২.৬৭
		বাস্তব %		৮৮.৩৫	১১.৬৫		১০.১৫	৯৮.৫০
	আর্থিক %		৭৫.৬৩	১৩.৮৭		১১.৪৩	৮৭.০৫	
৯৩	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	৩৪৫৬৯.৯৬	২০৬৭৫.১২	১২৫০০.০০	১২১১৯.৭৭	১১৯৯৪.১৩	৩২৬৬৯.২৫
২২৭		স্থানীয়	৪৮২৭.২৩	২৬৪৭.৯২	১৫০০.০০	১৪১৫.৫০	১২৮৯.৮৬	৩৯৩৭.৭৮
যোগাযোগ সেক্টর একনেক ১৪-০২- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	২৯৭৪২.৭৩	১৮০২৭.২০	১১০০০.০০	১০৭০৪.২৭	১০৭০৪.২৭	২৮৭৩১.৪৭
		আরপিএ	২৯৭৪২.৭৩	১৮০২৭.২০	১১০০০.০০	১০৭০৪.২৭	১০৭০৪.২৭	২৮৭৩১.৪৭
		বাস্তব %		৮২.০০	১৮.০০		১৬.০০	৯৮.০০
	আর্থিক %		৫৯.৮১	৩৬.১৬		৩৪.৭০	৯৪.৫০	
৯৪	ক্রাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (বাপাউবো অংশ) (জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬) দাতা সংস্থাঃ বিশ্বব্যাংক	মোট	১১৮২৫৫.০০	৪৬.২৮	১৯০০.০০	১৬৭৩.২৬	৭৯৩.১৮	৮৩৯.৪৬
১৩৮		স্থানীয়	৩৩২৫৫.০০	৬.০৬	৭০০.০০	৫৯৯.৪৩	২২৯.০১	২৩৫.০৭
একনেক ০৭-১২- ২০২১		প্রকল্প সাঃ	৮৫০০০.০০	৪০.২২	১২০০.০০	১০৭৩.৮৩	৫৬৪.১৭	৬০৪.৩৯
		আরপিএ	৮৫০০০.০০	৪০.২২	১২০০.০০	১০৭৩.৮৩	৭৭৯.৩২	৮১৯.৫৪
		বাস্তব %		০.৭০	২.০০		১.০৫	১.৭৫
	আর্থিক %		০.০৪	১.৬১		০.৬৭	০.৭১	
৯৫	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	৫৬২৬৯.০০	৪৪৭৭০.৫৮	৬৫৬৭.০০	৬০৫৮.৩৯	৫৯৬০.১৯	৫০৭৩০.৭৭
১৩৭		স্থানীয়	১০১৪৮.০০	৭০৩৪.৩০	১৫৪৮.০০	১৫৪৭.০৯	১৪৪৮.৮৮	৮৪৮৩.১৯
একনেক ১৭-০৬- ২০১৪		প্রকল্প সাঃ	৪৬১২১.০০	৩৭৭৩৬.২৮	৫০১৯.০০	৪৫১১.৩০	৪৫১১.৩০	৪২২৪৭.৫৮
		আরপিএ	৩৯৬৪৮.০০	৩৩৫২১.৩৮	৪৩৬২.০০	৪১০৪.৭৮	৪১০৪.৭৮	৩৭৬২৬.১৬
		বাস্তব %		৮৭.০০	১৩.০০		১১.৫০	৯৮.৫০
	আর্থিক %		৭৯.৫৭	১১.৬৭		১০.৫৯	৯০.১৬	
৯৬	বন্যা ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন জরুরী সহায়তা প্রকল্প (Flood Reconstruction Emergency Assistance project) (০১ এপ্রিল, ২০২৩ থেকে ৩০ জুন, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ ADB ২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৬৯৯৮১.১১	০.০০	৮০০০.০০	৭৯৭৯.৬০	৭৮৯৬.৭৩	৭৮৯৬.৭৩
১০৮		স্থানীয়	১৪০১৯.৬৯	০.০০	১৫০০.০০	১৪৭৯.৬০	১৪৫৬.৭৩	১৪৫৬.৭৩
একনেক ১১-০৪- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	৫৫৯৬১.৪২	০.০০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	৬৪৪০.০০	৬৪৪০.০০
		আরপিএ	৫৫৯৬১.৪২	০.০০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	৬৪৪০.০০	৬৪৪০.০০
		বাস্তব %		০.০০	১১.০০		১৪.২৫	১৪.২৫
	আর্থিক %		০.০০	১১.৪৩		১১.২৮	১১.২৮	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯৭	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৮ খ্রিঃ) দাতা সংস্থাঃ ADB	মোট	৮৯৩৫৫.০৫	০.০০	৩১৭.০০	৭৬.২১	৪১.০৭	৪১.০৭
১৪০	উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৮ খ্রিঃ) দাতা সংস্থাঃ ADB	স্থানীয়	১৪৮১৭.৬৬	০.০০	৪২.০০	৪১.৩০	৬.১৬	৬.১৬
একনেক ০৫-০৯- ২০২৩	২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৮ খ্রিঃ) দাতা সংস্থাঃ ADB	প্রকল্প সাঃ	৭৪৫৩৭.৩৯	০.০০	২৭৫.০০	৩৪.৯১	৩৪.৯১	৩৪.৯১
		আরপিএ	৭৪০২৫.৯৯	০.০০	২৭৫.০০	৩৪.৯১	৩৪.৯১	৩৪.৯১
		বাস্তব %		০.০০	১.০০		০.০০	০.০০
		আর্থিক %		০.০০	০.৩৫		০.০৫	০.০৫
৯৮	Project for Planning Capacity Enhancement and Establishment of Technology Adaptation Cycle on Comprehensive Nodi (River) Management. (জুলাই, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ JICA	মোট	৪৫২৪.৭৬	০.০০	২৭২০.০০	২৪৪৪.৩৫	২৪৩৩.৪৭	২৪৩৩.৪৭
১৪	২০২৩ হতে জুন, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ JICA	স্থানীয়	৫৭৬.৪৩	০.০০	৪৬.০০	৪৫.৪১	৩৪.৫৩	৩৪.৫৩
পরিঃ মন্ত্রী ২০-০৮- ২০২৩	২০২৩ হতে জুন, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ JICA	প্রকল্প সাঃ	৩৯৪৮.৩৩	০.০০	২৬৭৪.০০	২৩৯৮.৯৪	২৩৯৮.৯৪	২৩৯৮.৯৪
		আরপিএ	৩৯৪৮.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		০.০০	৬২.০০		৬০.২৩	৬০.২৩
		আর্থিক %		০.০০	৬০.১১		৫৩.৭৮	৫৩.৭৮
৯৯	Support to Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project Additional Financing in c/w Ensuing Project in Tungipara & Kotailpara Upazila under Gopalganj District. দাতা সংস্থাঃ ADB	মোট	৮৬৪.০০	০.০০	৮৫৮.০০	৮৫৮.০০	৮৫৮.০০	৮৫৮.০০
৯	২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) দাতা সংস্থাঃ ADB	স্থানীয়	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
পরিঃ মন্ত্রী ০৬-১০- ২০২২	২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) দাতা সংস্থাঃ ADB	প্রকল্প সাঃ	৮৫৮.০০	০.০০	৮৫৮.০০	৮৫৮.০০	৮৫৮.০০	৮৫৮.০০
		আরপিএ	৮৫৮.০০	০.০০	০.০০	৮৫৮.০০	৮৫৮.০০	৮৫৮.০০
		বাস্তব %		০.০০	১০০.০০		১০০.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		০.০০	৯৯.৩১		৯৯.৩১	৯৯.৩১
১০০	Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP)-Project 2 (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ ADB এবং GoN	মোট	১৮০০৯০.৩৩	৩৪৪১১.২৭	৯৭৬২০.০০	৮৯২৪৬.৭০	৮৯০০৭.৮১	১২৩৪২৯.০৮
৮৭	২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ ADB এবং GoN	স্থানীয়	৩৫৭৫৩.৮৫	১৯৯৯.০৫	১৫১৪৫.০০	১০৭৮০.৭৮	১০৫৪৬.৮৪	১২৫৪৫.৮৯
একনেক ২৫-০১- ২০২২	২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ ADB এবং GoN	প্রকল্প সাঃ	১৪৪৩৩৬.৪৭	৩২৪২২.২২	৮২৪৭৫.০০	৭৮৪৬৫.৯২	৭৮৪৬০.৯৭	১১০৮৩.১৯
		আরপিএ	১৪১১৬৫.৩২	৩১৪২২.২২	৮১০৯০.০০	৭৮৪৬৫.৯২	৭৮৪৬০.৯৭	১০৯৮৩.১৯
		বাস্তব %		২০.৬৭	৫৬.৫০		৫৬.৪৮	৭৭.১৫
		আর্থিক %		১৯.১১	৫৪.২১		৪৯.৪২	৬৮.৫৪
১০১	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ JICA	মোট	৯৯৭৫৫.০০	৯৩৬৪৯.৪২	৪৬২২.০০	৪৫৪৯.৫১	৪৫২৭.৯৭	৯৮১৭৭.৩৯
৮৪	২০১৪ হতে জুন, ২০২৪) দাতা সংস্থাঃ JICA	স্থানীয়	৪০৩৩৮.৯০	৩৬২৮১.০৪	৪০০২.০০	৩৯৯৭.৮০	৩৯৭৬.২৬	৪০২৫৭.৩০
একনেক ১৪-১০- ২০১৪	২০১৪ হতে জুন, ২০২৪) দাতা সংস্থাঃ JICA	প্রকল্প সাঃ	৫৯৪১৬.১০	৫৭৩৬৮.৩৮	৬২০.০০	৫৫১.৭১	৫৫১.৭১	৫৭৯২০.০৯
		আরপিএ	৫১৫৪৪.৭০	৪৯৬৩৪.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	৪৯৬৩৪.৮৫
		বাস্তব %		৯৬.০০	৪.০০		২.৭৫	৯৮.৭৫
		আর্থিক %		৯৩.৮৮	৪.৬৩		৪.৫৪	৯৮.৪২
১০২	দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ) (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ JICA	মোট	৭৫৭৮১.০০	৪৭৯০.৪৭	২২০০০.০০	২১৯৯৪.০০	২০৬১২.০৫	২৫৪০২.৫২
৮৬	২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ JICA	স্থানীয়	২০১৯৫.০০	১৩৯০.৪৭	৪৫০০.০০	৪৪৯৪.০০	৪১১১.১৯	৫৫০১.৬৬
একনেক ২৩-১১- ২০২১	২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ JICA	প্রকল্প সাঃ	৫৫৫৮৬.০০	৩৪০০.০০	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১৬৫০০.৮৬	১৯৯০০.৮৬
		আরপিএ	৫৫৫৮৬.০০	৩৪০০.০০	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১৬৫০০.৮৬	১৯৯০০.৮৬
		বাস্তব %		৭.০০	৪০.০০		২৮.০০	৩৫.০০
		আর্থিক %		৬.৩২	২৯.০৩		২৭.২০	৩৩.৫২
১০৩	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪) দাতা সংস্থাঃ IFAD, GoN	মোট	৩১১৫৯.১৮	৮৮১২.০৪	৯১০৫.০০	৮৮৪৩.০৭	৬১৭৮.৯০	১৪৯৯০.৯৪
৮৫	২০১৯ হতে জুন, ২০২৪) দাতা সংস্থাঃ IFAD, GoN	স্থানীয়	১৮১৩৮.৪৩	২৮৩১.৫১	২০৫২.০০	১৭৯০.০০	১৪২২.৮৪	৪২৮৪.৩৫
একনেক ২১-০৭-২০২০	২০১৯ হতে জুন, ২০২৪) দাতা সংস্থাঃ IFAD, GoN	প্রকল্প সাঃ	১৩০০৫.৭৫	৫৯৫০.৫৩	৭০৫৩.০০	৭০৫৩.০০	৪৭৬৬.০৬	১০৭০৬.৫৯
		আরপিএ	৬০৮০.২৫	১৫৩৯.০০	৪৫৪০.০০	৪৫৪০.০০	৩২৭৮.৭০	৪৮১৭.৭০
		বাস্তব %		৩৩.৫০	৩০.০০		২২.২৫	৫৫.৭৫
		আর্থিক %		২৮.২৮	২৯.২২		১৯.৮৩	৪৮.১১
উপ-মোট : বৈদেশিক সহায়তাপুঞ্জ প্রকল্প		মোট	১০৮৮৬০৪.৩৯	৪৫৫২১৯.৫১	২১১৭০৯.০০	১৯৩৩২১.২০	১৮৭৭৮১.৮৪	৬৪৩০০১.৩৫
		স্থানীয়	১৯২০৬১.১৯	৫২২২০.৩৫	৩১০৩৫.০০	২৬১৯০.৯৮	২৪৫২২.৩১	৭৬৭৪২.৬৬
		প্রকল্প সাঃ	৮৯৬৫৪৩.১৯	৪০২৯৯৯.১৬	১৮০৬৭৪.০০	১৬৭১৩০.২২	১৬৩২৫৯.৫৩	৫৬৬২৫৮.৬৯
		আরপিএ	৮৭১৫৬০.৭৪	৩৮৫৬৩৯.২০	১৭১৯৬৭.০০	১৬১২৬০.০৫	১৫৮৬৪০.১৫	৫৪৪২৭৯.৩৫
		আর্থিক %				৯১.৩১	৮৮.৭০	৭৯.০২
বিশেষ প্রকল্পসমূহ								
	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/২১)	মোট	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬
		স্থানীয়	১২৯২২৪.৩১	৬৯৮৭৬.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৮৭৬.২৬
একনেক অক্টোবর, ২০১০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৪.০৮	০.০০	০.০০	০.০০	৫৪.০৮
		আর্থিক %		৫৪.০৭	০.০০	০.০০	০.০০	৫৪.০৭
১০৪	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৫১৭৬৬.২২	৩৮৯৫০.৮০	৬৬২৩.০০	৬৬২১.৫৬	৬৬১৯.২৬	৪৫৫৭০.০৬
২১	২০১৭ হতে জুন, ২০২৫)	স্থানীয়	৫১৭৬৬.২২	৩৮৯৫০.৮০	৬৬২৩.০০	৬৬২১.৫৬	৬৬১৯.২৬	৪৫৫৭০.০৬
একনেক ১১-০৭- ২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮৫.২০	৫.৮০		৫.০০	৯০.২০
		আর্থিক %		৭৫.২৪	১২.৭৯		১২.৭৯	৮৮.০৩

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০৫	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	২২৫৬৮৪.৮৮	১৬৭২১৭.৮৬	৩৩৪৩৪.০০	৩২৪৫৮.৬৯	১৫৫৮২.৭২	১৮২৮০০.৫৮
২৮		স্থানীয়	২২৫৬৮৪.৮৮	১৬৭২১৭.৮৬	৩৩৪৩৪.০০	৩২৪৫৮.৬৯	১৫৫৮২.৭২	১৮২৮০০.৫৮
একনেক ০৭-১১- ২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯০.০০	১০.০০		৯.৩৫	৯৯.৩৫
	আর্থিক %		৭৪.০৯	১৪.৮১		৬.৯০	৮১.০০	
১০৬	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলযান ক্রয় প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪), জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন। অর্পিত ক্রয়কাজ- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	মোট	৫৪৫২.১৫	৪৯৭৭.৪২	৩৯২.০০	৩৮৯.৯৫	৩৭৪.৭২	৫৩৫২.১৪
৩৫		স্থানীয়	৫৪৫২.১৫	৪৯৭৭.৪২	৩৯২.০০	৩৮৯.৯৫	৩৭৪.৭২	৫৩৫২.১৪
পরিঃ মন্ত্রী ০৮-০৮- ২০১৯		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৮০.০০	২০.০০		০.০০	৮০.০০
	আর্থিক %		৯১.২৯	৭.১৯		৬.৮৭	৯৮.১৭	
১০৭	যমুনা নদী সিস্টেমের বামতীরে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেব্রু-১) (মে, ২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৪) জুন, ২০২৪ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৪৮১.১৪	১৫৯.৪৮	২৭৫.০০	২৭৫.০০	২৬২.৯৭	৪২২.৪৫
৭		স্থানীয়	৪৮১.১৪	১৫৯.৪৮	২৭৫.০০	২৭৫.০০	২৬২.৯৭	৪২২.৪৫
পাসম মন্ত্রী ২২-০৫- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৮.৪৪	৬১.৫৬		৬১.১৫	৯৯.৫৯
	আর্থিক %		৩৩.১৫	৫৭.১৬		৫৪.৬৬	৮৭.৮০	
১০৮	বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের তথ্যাদি হালনাগাদকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	৪৪৭.৫০	১৪৫.০৪	২৮৩.০০	২৮৩.০০	২১৮.২২	৩৬৩.২৬
৬		স্থানীয়	৪৪৭.৫০	১৪৫.০৪	২৮৩.০০	২৮৩.০০	২১৮.২২	৩৬৩.২৬
পাসম মন্ত্রী ২৫-০৪- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৬৭.৪১	৩২.৫৯		৩০.০৭	৯৭.৪৮
	আর্থিক %		৩২.৪১	৬৩.২৪		৪৮.৭৬	৮১.১৮	
১০৯	নাফ নদীর মোহনার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং শাহ পরীর দ্বীপের ভূমি উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুন, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩) জুন, ২০২৩ এ সমাপ্ত	মোট	৩৩২.০০	৩১৩.৩৪	১.০০	০.০০	০.০০	৩১৩.৩৪
১০		স্থানীয়	৩৩২.০০	৩১৩.৩৪	১.০০	০.০০	০.০০	৩১৩.৩৪
পাসম মন্ত্রী ০৭-০৬- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৯৯.৩২	০.০০		০.০০	৯৯.৩২
	আর্থিক %		৯৪.৩৮	০.৩০		০.০০	৯৪.৩৮	
১১০	নোয়াখালী জেলার আওতাধীন হাতিয়া উপজেলায় পোড়ার নং- ৭৩/১ (এ+বি) এবং ৭৩/২ এর সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	৩৮০.০০	৭৩.৬০	২৬২.০০	২৬২.০০	২৫০.৯৪	৩২৪.৫৪
১১		স্থানীয়	৩৮০.০০	৭৩.৬০	২৬২.০০	২৬২.০০	২৫০.৯৪	৩২৪.৫৪
পাসম মন্ত্রী ১৮-০৭- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৫.০০	৩৮.৪২		৩৮.৪২	৯৩.৪২
	আর্থিক %		১৯.৩৭	৬৮.৯৫		৬৬.০৪	৮৫.৪১	
১১১	কীর্তনখোলা-সুগন্ধা-বিমখালী নদী অববাহিকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৪) জুন, ২০২৪ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৪৫৫.০০	১৭৮.০২	২৪৬.০০	২৪৫.৫০	২৪৪.৮১	৪২২.৮৩
৩		স্থানীয়	৪৫৫.০০	১৭৮.০২	২৪৬.০০	২৪৫.৫০	২৪৪.৮১	৪২২.৮৩
পাসম মন্ত্রী ২৫-০৯- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৩৯.৬৬	৬০.৩৪		৬০.২৪	৯৯.৯০
	আর্থিক %		৩৯.১৩	৫৪.০৭		৫৩.৮০	৯২.৯৩	
১১২	ঢাকা জেলার গোড়ানচাটাবাড়ি রিটেনশন পন্ডের সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ হতে এপ্রিল, ২০২৫)	মোট	৪৭৮.০০	০.০০	১৪৩.০০	১৪২.৮৮	১৪১.০০	১৪১.০০
৪		স্থানীয়	৪৭৮.০০	০.০০	১৪৩.০০	১৪২.৮৮	১৪১.০০	১৪১.০০
পাসম মন্ত্রী ০২-০২- ২০২৩		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		২.০০	৫০.০০		৪৬.৮৮	৪৮.৮৮
	আর্থিক %		০.০০	২৯.৯২		২৯.৫০	২৯.৫০	
১১৩	Detailed Study for Riverbank Erosion and Sustainable Mitigation Strategies for the Medium Rivers in Bangladesh (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	৩৮৮.০০	১৫৮.১৭	২১১.০০	১৮৮.৬৫	১৬৯.৬৯	৩২৭.৮৬
৮		স্থানীয়	৩৮৮.০০	১৫৮.১৭	২১১.০০	১৮৮.৬৫	১৬৯.৬৯	৩২৭.৮৬
পাসম মন্ত্রী ০১-০৬- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৪৪.০০	৫৬.০০		৫৩.২৩	৯৭.২৩
	আর্থিক %		৪০.৭৭	৫৪.৩৮		৪৩.৭৩	৮৪.৫০	
১১৪	খুলনা জেলায় দাকেপ উপজেলায় অবস্থিত পোস্তার -৩১ এর পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা হতে (আগস্ট ২০২২ হতে জুন, ২০২৪) জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	মোট	৪৩৭.০০	২৪৩.৩৬	১৭৯.০০	১৫৫.৬৫	১৪৮.৫৭	৩৯১.৯৩
১৩		স্থানীয়	৪৩৭.০০	২৪৩.৩৬	১৭৯.০০	১৫৫.৬৫	১৪৮.৫৭	৩৯১.৯৩
পাসম মন্ত্রী ০৪-০৮- ২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৭.০০	৪৩.০০		৪১.৬৫	৯৮.৬৫
	আর্থিক %		৫৫.৬৯	৪০.৯৬		৩৪.০০	৮৯.৬৯	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২৩-২৪ আরএডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	৩০-০৬- ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১৫	ফেনী জেলাধীন মুছুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি	মোট	৪৮৫.০০	০.০০	১৬৮.০০	১৬৮.০০	১৬৬.৮২	১৬৬.৮২
৪	নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থা প্রকল্পের পুনর্বাসনের	স্থানীয়	৪৮৫.০০	০.০০	১৬৮.০০	১৬৮.০০	১৬৬.৮২	১৬৬.৮২
পাসম মন্ত্রী	নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (এপ্রিল, ২০২৩ হতে	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০৭-০৫- ২০২৩	জুন, ২০২৫)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	২০২৩-২৪ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তব %		০.০০	৫০.০০		৫০.০০	৩০.০০
		আর্থিক %		০.০০	৩৪.৬৪		৩৪.৪০	৩৪.৪০
১১৬	যমুনা নদীর চর স্থিতিশীল ও জীবিকায়ন প্রকল্পের	মোট	৪৯০.০০	১১৭.২০	২৭১.০০	২৭১.০০	২৬৩.৫৯	৩৮০.৭৯
১২	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (পাইলট	স্থানীয়	৪৯০.০০	১১৭.২০	২৭১.০০	২৭১.০০	২৬৩.৫৯	৩৮০.৭৯
পাসম মন্ত্রী	স্টাডি: কাউয়াখোলা চর) (জুলাই, ২০২২-জুন,	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০৪-০৮- ২০২২	২০২৪)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	বাস্তব %		৫৫.০০	৪৫.০০		৩০.০০	৮৫.০০
		আর্থিক %		২৩.৯২	৫৫.৩১		৫৩.৭৯	৭৭.৭১
১১৭	বর্ষি বাওর এলাকার পানি, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও	মোট	২৩০.০০	০.০০	২২৯.০০	২২৮.৭০	২২৩.২৫	২২৩.২৫
৫	জীববৈচিত্র্যের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে	স্থানীয়	২৩০.০০	০.০০	২২৯.০০	২২৮.৭০	২২৩.২৫	২২৩.২৫
পাসম মন্ত্রী	বিস্তারিত সমীক্ষা (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ হতে জুন,	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১৯-০২- ২০২৩	২০২৪)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	বাস্তব %		৫.০০	১০০.০০		৯৫.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		০.০০	৯৯.৫৭		৯৭.০৭	৯৭.০৭
১১৮	পাবনা জেলার পদ্মা নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা এবং	মোট	৪৪২.৫৭	১৪৭.৭৫	২৫২.০০	২৫১.৬৪	২৪৯.৫৭	৩৯৭.৩২
৯	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের পুনর্বাসন	স্থানীয়	৪৪২.৫৭	১৪৭.৭৫	২৫২.০০	২৫১.৬৪	২৪৯.৫৭	৩৯৭.৩২
পাসম মন্ত্রী	কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুন, ২০২২ হতে	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০৬-০৬- ২০২২	ডিসেম্বর, ২০২৩)	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	জুন, ২০২৪ এ সমাপ্ত	বাস্তব %		৬৫.০০	৩৫.০০		৩৫.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		৩৩.৩৮	৫৬.৯৪		৫৬.৩৯	৮৯.৭৮
১১৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় মহানন্দা নদী এবং	মোট	৪৮১.২৫	১৮৭.৯৫	২৫৪.০০	২৫৩.৭৯	২৫০.৭৯	৪৩৮.৭৪
১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর জেলায় পদ্মা	স্থানীয়	৪৮১.২৫	১৮৭.৯৫	২৫৪.০০	২৫৩.৭৯	২৫০.৭৯	৪৩৮.৭৪
পাসম মন্ত্রী	নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০-০৯- ২০২২	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (সেপ্টেম্বর, ২০২২ হতে	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	ডিসেম্বর, ২০২৩)	বাস্তব %		৬০.০০	৪০.০০		৪০.০০	১০০.০০
	ডিসেম্বর, ২০২৩ এ সমাপ্ত	আর্থিক %		৩৯.০৫	৫২.৭৮		৫২.১১	৯১.১৭
১২০	পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় টেকসই নদী	মোট	৪৯৭.৭৬	১৪৮.০০	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৩০৪.৯৮	৪৫২.৯৮
২	ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	স্থানীয়	৪৯৭.৭৬	১৪৮.০০	৩০৫.০০	৩০৫.০০	৩০৪.৯৮	৪৫২.৯৮
পাসম মন্ত্রী	(সেপ্টেম্বর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪)	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
০২-১০- ২০২২	ডিসেম্বর, ২০২৩ এ সমাপ্ত	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		বাস্তব %		৫৫.০০	৪৫.০০		৪৫.০০	১০০.০০
		আর্থিক %		২৯.৭৩	৬১.২৭		৬১.২৭	৯১.০০
উপ-মোট : বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট	৪১৮১৫২.৭৮	২৮২৮৯৪.২৫	৪৩৫২৮.০০	৪২৫০১.০১	২৫৪৭১.৯০	৩০৮৩৬৬.১৫
		স্থানীয়	৪১৮১৫২.৭৮	২৮২৮৯৪.২৫	৪৩৫২৮.০০	৪২৫০১.০১	২৫৪৭১.৯০	৩০৮৩৬৬.১৫
		প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
উপ-মোটঃ বৈদেশিক সহায়তাপুঁট, কারিগরি সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট	১৫০৬৭৫৭.১৭	৭৩৮১১৩.৭৬	২৫৫২৩৭.০০	২৩৫৮২২.২১	২১৩২৫৩.৭৪	৯৫১৩৬৭.৫০
		স্থানীয়	৬১০২১৩.৯৭	৩৩৫১১৪.৬০	৭৪৫৬৩.০০	৬৮৬৯১.৯৯	৪৯৯৯৪.২১	৩৮৫১০৮.৮১
		প্রকল্প সাং	৮৯৬৫৪৩.১৯	৪০২৯৯৯.১৬	১৮০৬৭৪.০০	১৬৭১৩০.২২	১৬৩২৫৯.৫৩	৫৬৬২৫৮.৬৯
		আরপিএ	৮৭১৫৬০.৭৪	৩৮৫৬৩৯.২০	১৭১৯৬৭.০০	১৬১২৬০.০৫	১৫৮৬৪০.১৫	৫৪৪২৭৯.৩৫
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ১২০টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট	৬৮৭১৬৮৯.৬৭	২০১৩৮০২.৭৯	১২২২০৯১.০০	১১৭৭২২৯.৮৬	১১৫০২৫৯.১২	৩১৬৩৮৩৯.৪৩
		স্থানীয়	৫৯৭৫১৪৬.৪৭	১৬১০৮০৩.৬৩	১০৪১৪১৭.০০	১০১০০৯৯.৬৪	৯৮৬৯৯৯.৫৯	২৫৯৭৫৮০.৭৪
		প্রকল্প সাং	৮৯৬৫৪৩.১৯	৪০২৯৯৯.১৬	১৮০৬৭৪.০০	১৬৭১৩০.২২	১৬৩২৫৯.৫৩	৫৬৬২৫৮.৬৯
		আরপিএ	৮৭১৫৬০.৭৪	৩৮৫৬৩৯.২০	১৭১৯৬৭.০০	১৬১২৬০.০৫	১৫৮৬৪০.১৫	৫৪৪২৭৯.৩৫
		আর্থিক %				৯৬.৩৩	৯৪.১২	৯৪.৭৭

পরিশিষ্ট-২

পরিশিষ্ট-২

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় চলমান ৫টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	অর্থ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	জুন, ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
					আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা							
১	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলাধীন চরসুবুদ্দি ইউনিয়নের অন্তর্গত মেঘনা নদীর ডানতীরে অবস্থিত মহিষবেড় গ্রাম রক্ষার্থে নদীর তীর সংরক্ষণ।	১৫০০.০০	আগস্ট/২০২৩ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত।	৩৫০.০০	-	৭%	কাজ চলমান আছে।
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট							
২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলার জুড়ী নদীর বাম তীরে গৌরিপুর এলাকায় নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৪৮২.৭৭	ডিসেম্বর/২১ হতে জুন/২৪ পর্যন্ত।	২৪০.৮০	২৪০.৩৭	৭৫%	প্রকল্পের কাজ চলমান। জুন, ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মৌলভীবাজার জেলার জুড়ী উপজেলার জুড়ী নদীর বাম তীরে কাশিনগর দুর্গামন্দির (কাপনাপাহাড়) এবং জুড়ী নদীর ডান তীরে কাশিনগর স্কুল এলাকায় নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।	৪৯৮.৯৪	ডিসেম্বর/২১ হতে ডিসেম্বর/২৪ পর্যন্ত।	২৪৯.২৭	২৪৮.৭১	৬৫%	প্রকল্পের কাজ চলমান।
৪	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সিলেট সদর উপজেলার সিলেট শহরের কানিশাইল ছড়ার মুখে সুরমা নদীর চর খনন ও কানিশাইল ছড়ার শোপ সংরক্ষণ।	৮৬২.২৫	জানু/১৬ হতে জুন/১৭, সংশোধিত মেয়াদ: ডিসেম্বর/২৩ পর্যন্ত।	৪৩০.৬২	৪৩০.৩৯	৬২.১২%	ঠিকাদার কর্তৃক মামলা থাকায়, মামলা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে প্রকল্প সমাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা							
৫	কচুয়া উপজেলার সাচার-ঘুগরার বিল হতে পিতাম্বরদী, নারিন্দা, কাওয়াদী বাজার ও নায়েরগাঁও হয়ে মেঘনা নদী পর্যন্ত সাচার খাল (বোয়ালজুরী খাল) পুনঃখনন প্রকল্প।	১৪৯৯.৭২	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত।	১১৯৭.০৬	১১৯৭.০৬	৯০%	ঠিকাদার কর্তৃক মামলা থাকায়, মামলা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে প্রকল্প সমাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

The background of the page is composed of several overlapping, wavy, organic shapes in various shades of green, ranging from light lime green to dark forest green. These shapes create a sense of movement and depth, resembling stylized hills or flowing water. The central text is positioned within a clear, light-colored rectangular area.

পরিশিষ্ট-৩

পরিশিষ্ট-৩

বাপাউবোর্ড'র ২৫ বছর মেয়াদী খসড়া পরিকল্পনা

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
	River Management Project (Dredging, Bank Protection, Connectivity with Floodplain)			
1	National River Management Master Plan Preparation.	√		
2	Small River/Channel/Khal/Char Dredging Projects in 64 districts (Phase-II).	√		
3	Dredging of Madaripur Beel Route System		√	
4	Dredging of Kangsha River System			√
5	Dredging of Bhogai River System			√
6	Dredging of Modhumati River System		√	
7	Dredging of Karatoya River System	√		
8	Dredging of Arial Khan River System	√		
9	Dredging of Mukteswari-Teka River System		√	
10	Dredging of Betna River System		√	
11	Dredging of Kirtonkhola River System		√	
12	Dredging of Sondhya Khan River System		√	
13	Dredging of Khairabad River System		√	
14	Dredging of Old Brahmaputra River System	√		
15	Dredging of Old Dhaleswari River System	√		
16	Dredging of Surma River System	√		
17	Dredging of Kushiyara River System	√		
18	Dredging of Muhuri River System		√	
19	Dredging of Kakri River System		√	
20	Dredging of Dakatia River System	√		
21	Dredging of Dhonagoda River System		√	
22	Dredging of Dharla River System	√		
23	Dredging of Jamuneswari River System	√		
24	Dredging of Major River System		√	
25	Re-excavation of Bhairab River Project (Phase -II).	√		
26	River bank protection project along the left of Jamuna River at Char Pouli under Tangail sadar upazila and Alipur under Kalihati upazila of Tangail district.	√		
27	Development of Chandona-Barasia River Basin System	√	√	
28	River Bank Protection and flood management of entire Karnafuli basin.	√	√	
29	River Bank Protection from erosion of Sangu and Matamuhuri river	√	√	
30	River Bank Protection from erosion of rivers in Meghna Basin.	√	√	
31	Protection and Development of Coxsbazar Sea Beach.	√		
32	Protection and development of Kuakata Sea Beach.	√		

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
33	Construction of Super-Dyke along the Coastline / Bank line of Greater Noakhali (Laxmipur-Noakhali-Feni)	√	√	
34	Construction of Super Dyke along the Coast of Mirsarai, Chattogram to Cox's Bazar.	√	√	
35	Detail study for char removal and increasing navigability of estuaries of Feni river, Sandwip channel, Moheshkhali channel & Kutubdia channel.	√		
36	Stabilization of both Bank of Lower Meghna River by dredging and infrastructures.	√	√	
37	Study on Tidal River Management	√	√	
38	Implementation of Tidal River Management (Jessore, Khulna, Satkhira, Bagerhat).	√	√	√
39	Study on Integrated River System Management (4 major rivers) and Protection of Accreted Land.	√	√	
40	Protection and development of trans-boundary river (phase-III).	√	√	√
41	Protection of Kobutorkhola and Josodiya area from left bank erosion of Padma River in Shreenagar and Louhojong Upazila under Munsiganj district.	√		
42	Left bank protection of the shore's area from Dashani to Shatla in Matlab Upazila from wave action of Meghna River of Chadpur district.	√		
43	Protection of Rustampur and Noluya adjacent to proposed cantonment area from erosion of Surma River in Sadar & Golapgonj upazila under Sylhet district.	√		
44	Flood control Project in Kazirhat & Satbaria area including Padma left river bank protection of different area in Sujanagar upazila under Pabna district.	√		
45	Jamuna left bank protection of upstream & downstream of Paturia Ghat as well adjacent areas.	√		
46	Renovation and rehabilitation of damaged river bank protective work along left bank of Meghna River in Sadar and Haimchar upazila under Chadpur district.	√		
47	Jamuna right bank protection with rehabilitation of Crossbar, Spur & Revetment work located at Jamuna right bank in Sonatola, Sariakandi & Dhanut upazila under Bogra district.	√		
48	Protection of Rajshahi City from erosion of Padma River with improvement of flood control & drainage system.	√		
49	Protection of Singrabari, Patgram and Baikhola area of Kazipara upazila in Sirajganj district from erosion of Jamuna river.	√		
50	Left bank protection from Brahmaputra river at Moricachor and Bottola area of Iswargonj upazila in Mymensingh district.	√		
51	Re-Excavation of Ayman River and construction of walkway along the Right Bank of the River with beautification in Muktagacha Upazila Dist:- Mymensingh	√		
52	Bank protection and rehabilitation project of Jamuna river in Bagura district.	√		
53	Protection from erosion of Shitalakkha river at Taragonj bazar and adjacent area in Durgapur union in Kapashia upazila under Gazipur district.	√		
54	Dredging and bank protection of Matamuhuri River.	√		
55	Removal of water logging of Bhabodaho River and adjacent area (phase-II).	√		
56	Dredging of Gumti River for improvement of irrigation and drainage system in Cumilla district.	√		

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
57	Bank protection and dredging of Arial Khan, Kumar and Torki river in Rajoir, Kalkini and Sadar Upazila of Madaripur district.	√		
58	Right bank protection from erosion of Padma River in sadar upazila, proposed cantonment at Kalukhali upazila, Pangsha upazila of Rajbari district.	√		
59	Dredging and bank protection work of Kirtinasha river in Sariatpur district.	√		
60	Protection from erosion of right bank of Padma river in Sokhipur thana, right bank of Meghna river in Gosairhat upazila, and Damudya river in Sureshwor in Sariatpur District.	√		
61	Protection of Barisal airport and adjacent valuable area, Abul Kalam degree college area from erosion of Sugongha river, and Mirgonj ferighat, Mirgonj bazar from erosion of Arial Khan river in Babugonj upazila in Barisal district.	√		
62	Protection and development of reclaimed land from Jamuna river between crossbar-1 and crossbar-2 in sadar upazila of Sirajganj district.	√		
63	Protection of river bank and dredging/ re-excavation to protect different erosion prone area in Karimgonj and Ina, Mithamoin, Astogram, Nikli, Bajitpur, Bhoirab, Pakundia upazila in Kishorgonj district.	√		
64	Protection of left bank project of Payra river in Baherchor under Dumki-Laukati sub-project in Potuakhali district.	√		
65	Left bank protection of diversion channel of Musapur regulator and Sandwip channel to protect Musapur closure, regulator and adjacent area from erosion of Sandip channel in Kompanigonj upazila of Noakhali district.	√		
66	Rehabilitation of Chandpur irrigation project with re-excavation of Dakatia river, construction of embankment on bank, plantation and beautification.	√		
67	Protection of Panchpai, Baghrua, Jahangirpur and Karnapur villages of Sadar and Barhatta Upazilas of Netrokona District from erosion of Kangsha River.	√		
68	Bank protection work of Bhairab and Atai river to protect Chondani Mohol Ashrayan Project under Barakpur-Dighaliya project in Khulna district.	√		
69	Protection of Boishakhi closure in Chaptir haor, Tufankhali closure, Boaliya closure, Goruchora closure in Boram haor on both bank of Kalni river and river bank protection of Dholbazar area in Dirai upazila in Sunamganj district.	√		
70	Protection of Digholbak in Nobinonj upazila & Markuli bazar in Baniyachong upazila of Hobigonj district from left bank erosion of Kushiya river and re-excavation of Sutang river.	√		
71	Protection of Talbari area in Mirpur upazila under Kustia district from the erosion of the river Padma.	√		
72	River bank protection of different area from erosion of Old Brahmaputra River in Mymensingh district.	√		
73	Re-excavation of Gangnai, Nagor, Bhadraboti, Iramati river.	√		
74	Protection from erosion of Tentulia river from dhuliya launchghat in baufal upazila of Patuakhali to Durga pasha in Bakergonj upazila of Barisal district.	√		

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
75	Protection of various important areas of Sadar and Raipura upazilas of Narsingdi district from Meghna river erosion.	√		
76	Right bank protection of Jamuna and Hurasagor river at Bera upazila of Pabna district and Shahjadpur upazila of Sirajgonj district and Hurasagor-Karatoya river left bank flood control project.	√		
77	Protection of postokola Cantonment from erosion of Burigonga River.	√		
78	Permanent protective work for protection of Hosnabad bazar, lunchghat and adjacent area from erosion of Arial Khan river in Gemornodi upazila of Barisal district.	√		
79	Chandpur town protection and rehabilitation project.	√		
80	Re-excavation of Louhojong river in Sadar, Delduyar and Mirjapur upazila of Tangail district and beautification project.	√		
81	Both bank protection of small Jamuna river in Badalgachi upazila of Naogaon district.	√		
82	Protection infrastructure built in Nolerchar and Keringchar from erosion of Meghna River in Hatiya Upazila of Noakhali district.	√		
83	Rehabilitation and right bank protection of Jamuna River in Bagura District.	√		
84	Protection of Charkauya, Chadmari and Jagua area from erosion of Kritonkhola river in sadar upazila of Barisal district and dredging at Charmonai and Lamchori.	√		
85	Left bank protection of Chatolpar area from erosion of Meghna river in Nasirnagar upazila of Brahmanbaria.	√		
86	Left bank protection of Chatolpar area in Nasirnagar upazila and panishwar in sorial upazila from erosion of Meghna river of Brahmanbaria	√		
87	River bank protection from erosion of Kushiya river in Habigonj, Sunamganj & Moulvibazar district.	√		
88	Strengthening the built revetment work to protect Surersshwar darbar sharif and adjacent area located at right bank of Padma river in Naria Upazila of Shariatpur district.	√		
89	Removal of waterlogging at Amtoli-Subondi-Choura area located of polder no 43/1 in Amtoli upazila in Barguna district.	√		
90	Left bank Protection of Ichhamoti and Kalikandi river to protect main land in Satkhira district in Bangladesh.	√		
91	Protection of Majhirghat zero point from erosion of Padma river in Jajira upazila in Shariatpur district.	√		
92	River bank protection of 6.00km from erosion of Meghna River at Aslampur and Hajarigonj union in Charfashon upazila of Bhola district.	√		
93	Protection of Hanarchar-katakhal area from erosion of Meghna River in Sadar and Haimchar upazila of Chandpur district.	√		
94	Excavation of Loop cut of Ghorauttra river located at Gopalpur and Nagiyar Dhair in Mithamain upazila under Kishoreganj district.	√		
95	Bank protection work for prevention of erosion in various rivers including Meghna river in Vederganj and Gosairhat under Shariatpur district.	√		
96	Right bank protection of Padma river in Shakhipur thana, right bank protection of Meghna river and bank protection of Damudda river in Gosairhat upazila under Shariatpur district.	√		
97	Protection work of Betagi town, Fuljhuri launch terminal and Jangalia bazar from erosion of Bishkhali & Payra river and sustainable water management project inside polder no-41/6a, 41/6b & 41/7a in Barguna district	√		

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
98	Protection work of Amtoli town & Arpangasi Ghotkali bazar from erosion of Payra river with river dredging and sustainable water management project inside polder no-43/1, 44b in Barguna district.	√		
99	River bank protection and removal of waterlogging through re-excavation of small river, khal-beel in Pirganj upzilla under Rangpur district.	√		
100	Bank protection work of Jhinai river in Gopalpur Upazilla under Tangail district.	√		
101	Conservation and use of rainwater through construction of environment friendly water reservoir at Khoia Chhara and Govaniya Chhara of Mirsharai Upazila and Kumira Chhara of Sitakunda Upazila under Chattogram.	√		
102	Left bank protection of Jamuna river in Tangail Sadar and Nagorpur Upazilla under Tangail district and Chouhali upzilla under Sirajganj district	√		
103	Bank protection of Pungli river in Sadar upazila under Tangail district.	√		
104	Left bank protection of Jamuna river in Sadar and Kalihati upazila under Tangail district.	√		
105	Achievement of Sustainable Development Goals (SDG) by dredging of Chotra beel in laxmipur union of Atghoria upazilla under Pabna district.	√		
106	Protection of Chorbagdanga and Shahjahanpur area from erosion of Padma River in Chapainwabganj district.	√		
107	Flood control, drainage and river bank protection in Sadar upazilla of Naogaon district.	√		
108	Rehabilitation of Roktodoho- Lohachura beel drainage scheme.	√		
109	Rehabilitation of four projects of Manda, Raninagar and Atrai upazilla in Naogaon district and bank protection work along with dredging of Atrai river.	√		
110	Right bank protection works of Karatoya river at adjacent areas of the office of the deputy commissioner in Sadar upazilla of Bogra district.	√		
111	Permanent protection to prevent left bank erosion from Padma River at “Ruppur Nuclear Power Plant Project” and adjacent areas.	√		
112	Protection of different areas from erosion of Sugondha river at Sadar and Nolchiti upazilla under Jhalkathi district.	√		
113	Removal of waterlogging at Amtoli-Subondi-Chawra areas under polder no 43/1 of Amtoli upazilla in Barguna district.	√		
114	Bank protection of Boro Machuwa Rocketghat and coastal embankment of polder no-39/1b and 39/1c from the erosion of Boleshwar river in Mothbaria upazilla of Bagerhat district.	√		
115	Protection of Bamna town, Ramna, and Kalikabari launch terminal from erosion of Bishkhali river with dredging and sustainable water management project inside polder no-39/2a and 39/1d in Barguna district.	√		
116	Protection of Kakchira launch terminal, Jintola, Kalomegh, Padma and bazar from erosion of Boleshwar and Bishkhali river along with dredging and sustainable water management project inside polder no-39/1c and 40/1 in Barguna district.	√		
117	Protection of Old Hijla, Baushia and Harinathpur area from erosion of Meghna river in Hijla upazilla under Barishal district.	√		
118	Protection of Boraiya Degree College and adjacent areas from erosion of Bishkhali river of Rajapur upazilla in Jhalkathi district.	√		
119	Protection of different important areas from erosion of Bishkhali river at Nazirpur, Necharabad, Sadar and Indurkani upazilla under Pirojpur district.	√		
120	Protection from erosion of Dhorla river at Sadar and Patgram upazilla of Lalmonirhat district.	√		

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
121	Left bank protection and dredging of Teesta River at Hatibandha upazilla under Lalmonirhat district.	✓		
122	Riverbank protection work at different places of Talma, Chawai, Korotoa, Pathraj, and Ghoramara river in Panchagar district.	✓		
123	Left bank protection of Teesta River at Mohichkhocha in Aditmari upazilla under Lalmonirhaat district.	✓		
124	Riverbank protection of Tangon, Shok, Senuwa, Pathraj, Tirmoi, Kulik and Lacchi river in Thakurgaon.	✓		
125	Protection of very erosion prone areas of Gorai-Modhumoti river in Magura and Jhainadah district.	✓		
126	Strengthening of previous riverbank protection work to protect Sureshwar dorbar shorif and adjacent areas from erosion of Padma River in Naria upzilla under Shariatpur district	✓		
127	Recovery of naval route and beautification project from Gopalganj to Tungipara.	✓		
128	Bank protection work to prevent erosion of tributary river of Padma and Sureshwar-Damuda river in Vederganj upazilla of Shariatpur district.	✓		
129	Protection and rehabilitation project of Madaripur town and adjacent areas.	✓		
130	River governance of Gorai under Shreepur upazilla in Magura.	✓		
131	River bank protection work from Kazirhat to Dubuldia and Matarbari and Burirhat-Vedorganj Khal rehabilitation project in Shariatpur district.	✓		
132	Riverbank protection to protect Sholpur-Jugihati and Par Hajigram from left bank erosion of Atai and Rupsha river and development of drainage system of Putimari beel.	✓		
133	River bank protection at different erosion prone areas with dredging of Bhoirab, Atai, Rupsha, Hamkura, Bhodra and Gangrail river system to remove water logging problem of Khulna district and adjacent areas.	✓		
134	Protection of Morelganj upazilla Sadar and adjacent areas from erosion of Panguchi river and dredging of Bishkhali river.	✓		
135	Permanent riverbank protection to prevent vulnerable places of Norail district.	✓		
136	Riverbank protection at vulnerable places of polder no 35/1, 35/3 and Mongla-Ghosiakhali channel in Bagerhat district.	✓		
137	Rehabilitation of embankment and protection of both bank of Surma and Kushiya River in Sylhet district.	✓		
138	Development of Early Flood and Integrated Water Resource Management in Haor area of Sunamganj District	✓		
139	Left bank protection of Surma river at Dharargaon and Brahmanaon in Sadar upzilla of Sunamganj district.	✓		
140	Permanent bank protection at coast of Chor Nangulia to protect from continuous erosion at left bank of Meghna river in Suborno chor in Noakhali district.	✓		
141	Protection at Boyan chor to protect from continuous erosion of left bank of Meghna river in Hatia and Ramgoti upazilla in Noakhali and laxmipur district.	✓		
142	Construction of embankment with slope protection at Choiyarkuri bazar to Horipur village and Mohakalpara to Rampur village in Nasirnagar upazilla under Brahmanbaria district	✓		

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
143	Bank protection work of Sangu and tributary rivers (Chandkhali and Dolu) of Chondonaish and satkania upazilla of Chattogram district.	√		
144	Construction of tidal barrier to prevent erosion in the beach of Saint Martins's island and development of internal drainage system and beautification.	√		
145	Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (Project-3)	√		
146	Protection of Newly Formed Economic Zone from Flood and River Erosion of Jamuna River at Bhuapur Upazila in Tangail district.	√		
147	Upper Meghna Capital Dredging Project	√		
148	Protective work at different places of Jhalakathi Sadar and Nalcity Upazilla of Jhalakathi District from the erosion of Shugandha River	√		
149	Strengthening of sea dyke with improvement of polder 71 in Kutubdia island, Cox's Bazar	√		
150	Protection of Manikganj district from the erosion of Jamuna and Padma river bank	√		
151	Project to protect the right bank of Brahmaputra river at Chilmari and Ulipur Upazila in Kurigram District	√		
153	Flood control management in Surma, Kushiya, Piyan and Kushigang rivers in Sylhet district	√		
152	Water Resources Management Project in the Arial Khan and Tentulia River Basin	√		
153	Water Resources Management Project in the Sandhya-Baleshwar River Basin	√		
154	Water Resources Management Project in the Burishwar-Payra River Basin	√		
155	Bank Protection Work along the Bank of Karnafuli River and Other Connecting Khals in Boalkhali Upazila of Chattogram District.	√		
156	Protection Project to Protect the Proposed Tangail Economic Zone from Flood and Erosion of the Left Bank of Jamuna River in Bhuapur Upazila of District Tangail	√		
157	Improvement of newly accreted land at northern Sandwip & bank erosion control at Southern Urir Char project.	√		
Land Reclamation and Development Project				
158	Hatiya-Dhamarchar-Nijhumdwip Integrated Development Project	√		
159	Bhola - Kukrimukri - Char Montaz Integrated Development Project	√		
160	Sandwip-Jahazer char cross dam Project	√		
161	Estuary Development Study and Pilot Program for land reclamation	√		
162	Sandwip-Urirchar Cross Dam Project		√	
163	Jahazer char-Noakhali Cross Dam Project		√	
164	Monitoring, clustering and development of chars		√	√
165	Clustering of some emerging chars/bars and stabilizing of channels by dragging.		√	
166	Study for Estuary Management Program (Karnafuli to Sundarban).	√		
167	Char Development and Settlement Project-V (CDSP-V)	√		
168	Char Stabilization and Livelihood Development in Major rivers		√	√

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
169	Land beyond Land, Efforts to Reclaim lands at near Coast; Preparatory Surveys and Studies.	√	√	
170	Development of Climate Smart Integrated Coastal Resources Database (CSICRD)	√	√	
171	Development Catchment and Sub-catchment Management Plans	√	√	
172	Kaptai Lake Rehabilitation Study and Pilot Project.	√	√	
173	Flow control and water storage structures for water availability in the dry season	√	√	
174	Integrated Jamuna-Padma Rivers Stabilization, Land Reclamation and development Project.	√	√	√
175	Integrated Coastal Zone Land use Planning in Bangladesh using GIS and RS Technology.	√	√	
176	Land reclamation by dredging and construction of crossbar in Jamuna river in Bagura district.	√		
177	Freshwater Harvesting and Land Reclamation Char Kukri Mukri, Bhola, Bangladesh.	√		
Integrated Development Project				
178	Integrated Water Resources Management in Bill area including Beel Halmi Development Project	√		
179	Utilization of Ganges water for Ganges depended area.		√	
180	Integrated Water Resources Development & Management in Boral Basin	√		
181	Utilization of Water of Brahmaputra River		√	
182	Utilization of Water of Meghna River		√	
183	Utilization of Water of Dharla River		√	
184	Utilization of Water of Mahananda River		√	
185	Utilization of Water of Kangsa River		√	
186	Utilization of Water of Kushiya River		√	
187	Utilization of Water of Khowai River		√	
188	Dhaka Integrated Flood Control Embankment cum Eastern Bypass Road Multipurpose Project	√		
189	Integrated development of Moheshkhali Matarbari Area	√		
190	Old Brahmaputra Integrated River Management Project	√	√	
191	Basin wise Integrated Water Resource Assessment including environmental flow in Major Rivers.	√	√	√
192	Comprehensive Flood and Drainage Management for Meghna Basin;	√	√	
193	Development Study on formulating Master Plan for Promoting Integrated Water and Natural Resource Management and improving Disaster Resilience in Greater Chittagong area	√		
194	Rehabilitation of Water Management Infrastructure in Bhola District	√		
195	Managed Aquifer Recharge for Artificial Storage (MARAS) of Water to Improve Groundwater Table	√	√	
196	Structural interventions for managing sea level rise: preparatory surveys & studies.		√	√

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
197	Rehabilitation of Marashi River sub-Project in Jhinaigati upazila under Sherpur District.	√		
198	Gonggaijuri Haor Integrated Water Management Project.	√		
199	Improvement of Drainage System and Water Logging Mitigation of Chittagong Cantonment & Adjacent Area	√		
200	Meghna-Titas FCD in Sadar upazila, Bijoy Nagar and Sorail upazila under Brahmanbaria district.	√		
201	Improvement of integrated water management of Arial Beel and drainage system of Ishamati river.	√		
202	Karatoya River Improvement Project.	√		
203	Improvement of flood control and drainage system from Hazimara to Char Mohon polder 59/2 in Sadar & Raipur upazila under Lakshmipur district.	√		
204	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gumti - Muhuri Basin.	√	√	√
205	Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Gorai-Passur Basin	√	√	√
206	Improvement of Drainage Congestion, Canal Dredging and Flood Control for Barisal CC area.		√	
207	Improvement of drainage network, flood control and solid waste management for Khulna City		√	
208	Rationalized Water Related Interventions in Hurasagar basin.	√	√	√
209	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Chittagong Coastal Plain Basin	√	√	√
210	Prevention of flood, river bank erosion, increase navigation depth and land reclamation by dredging rivers flowing through Kurigram district.	√		
211	Bank protection and development of Surma and Kushiara River in Jakigonj upazila of Sylhet district.	√		
212	Flood control and drainage at downstream of Chaln beel and connectivity road with Rabindra University, Bangladesh.	√		
213	Improvement of irrigation and drainage system in Purbodhola upazila of Netrokona district.	√		
214	Bank protection of Dhalchar from erosion of Meghna River in Charfason of Bhola district and Carjahir Uddin FCD project in Tajumuddin upazila.	√		
215	Development of Khowai river system in Habiganj district	√		
216	Integrated water management of Arial Beel and improvement of drainage system of Ichhamoti river in Nawabgonj and Dohar Upazila of Dhaka district.	√		
217	Integrated development project of ponding area of Goranchot bari.	√		
218	Flood control, drainage and irrigation project in Goyainghat upazilla of Sylhet.	√		
219	Rehabilitation project of Muhuri- Kohuwa flood control, drainage and irrigation project in Feni	√		
220	Surma and Boulai River Basin Management Project.	√		
221	Integrated Water Resource Management and Development of Naf River Estuary and Land Development of Shah Parir Dwip.	√		
Irrigation Project (New & Rehabilitation)				
222	Kurigram Irrigation Project (North Unit).	√		

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
223	Kurigram Irrigation Project (South Unit).	√		
224	North Rajshahi Irrigation Project.	√		
225	Irrigation Projects in Eastern hill.		√	
226	Fatikchari FCDI Project.	√		
227	Dhurang Irrigation Project.	√		
228	Rehabilitation and modernization of Irrigation Project	√	√	√
229	Integrated Development of Mahananda Irrigation Project.	√		
230	WMOs and Participatory Management Model, for O&M for Irrigation Schemes	√		
231	Study for rehabilitation of Flood Control & Drainage (FCD) Project and up gradation to combat the effect of climate change.	√		
232	Nishchintapur Irrigation Project.	√		
233	Halda Irrigation Project.	√		
234	Boalkhali Irrigation Project.		√	
235	Rehabilitation of Barishal Irrigation Project.	√		
236	Renovation and Rehabilitation of mechanical & electrical infrastructure of Chandpur Irrigation Project.	√		
237	Rehabilitation of Karnafuli Irrigation Project (Halda unit, part-1) in Fatikchari & Hathazari Upazila under Chittagong District.	√		
238	Rehabilitation of Manu Irrigation and Flood Control Embankment Project.	√		
239	South Comilla - North Noakhali Irrigation Project (including south Chadpur).	√		
240	Buri Titas Irrigation and drainage Project in Nabinogor upazila under Brahmonbaria District and Muradnagar upazila under Comilla District.	√		
241	Chadpur-Comilla Integrated Flood Control, Drainage and Irrigation Project.	√		
242	Irrigation through construction of Hydraulic Elevated Dam in Maynee River (80m) of Dighinala Upazila under Khagrachori district and Sreemai Khal in Patiya upazila under Chittagoan district.	√		
243	Kharkharia Flood Control, Drainage And Irrigation Project.	√		
244	Rehabilitation of existing Pumphouses (GK, Pabna, Chandpur, Barishal etc)	√		
245	Rehabilitation of Halda extended irrigation project in Hathajari upazilla of Chattogram district.	√		
246	Technical Assistance for Modernization of Ganges-Kobadak Irrigation Project.	√		
247	Rationalization of Pekua, Bagguzara and Palakata Rubber Dam under Coxsbazar district, Mahamaya Rubber Dam under Chattogram district and kohu river Rubber Dam under Feni district.	√		
248	Integrated Development Project to increase command area of Electric Block and Low Lift Pump irrigation projects in Dinajpur, Thakurgaon and Panchagarh District	√		

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
	Climate Change Adaptation and Ecosystem Restoration Project			
249	Ghaghot River Restoration Project.	√	√	
250	Restoration of four rivers around Dhaka city.	√		
251	Arial Khan River Restoration Project.	√	√	
252	Impact of Climate Change on Groundwater Resources of Bangladesh.		√	
253	Revitalization and Restoration of Hurasagar and Atrai rivers.	√		
254	Disaster Risk Management Enhancement Project.	√		
255	Integrated Development of Karnafuli, Sangu and Matamuhuri River Basin	√		
256	Integrated Development of the Hatiya, Shabazpur and Sandwip Channel	√		
257	Detail study for conservation of aquatic animals and biodiversity in the Maheshkhali Channel.	√		
258	Restoration of Gojaria River		√	
259	Restoration of Gorai river (phase-III).	√		
260	Dredging of Bhola river and re-excavation of Bishkhali khal under Bagerhat district.	√		
261	Re-excavation of Khapravanga-Chaplirdon River (Mahipur Channel) by dredger in Kolapara upazila under Patuakhali district.	√		
262	Rationalization of Polders in Baleswar - Tentulia Basin.	√	√	√
263	Rationalization of Polders in Gorai-Passur Basin.	√	√	√
264	Rationalization of Polders in Gumti - Muhuri Basin.	√	√	√
265	Conservation /preservation of fresh water in Baleshwar, Bishkhali, Nurishwar and Tetulia river systems through salinity barrier.		√	
266	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Baleswar-Tentulia Basin.	√	√	√
267	Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project	√		
268	Restoration of icchamoti river passing through Pabna district.	√		
269	Climate smart water management project.	√	√	
270	Climate sensitive agriculture and water management project.	√		
271	Excavation of Dighi to preserve rainwater in coastal areas of Norail, Potuakhali, Bhola, Feni and Noakhali.	√		
272	Excavation of Dighi to preserve rainwater in coastal areas of Khulna, Satkhira and Bagerhat district.	√		
273	Climate Resilient River Stabilization Project (CRRiSP)	√		
	Rehabilitation of Coastal Polders			
274	Rehabilitation of Polder 59/3C in Noakhali district.	√		
275	Rehabilitation of Polder 64 in Bashkhali upazila.	√		
276	Improvement of Polder 65 in Cox's Bazar district.		√	
277	Rehabilitation and climate proofing Polders in coastal area.	√	√	√
278	Rehabilitation of Polder 66 Cox's Bazar district.		√	

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
279	Integrated Study for the Long-term Solution of Coastal areas	√		
280	Sustainable improvement of coastal polders.		√	
281	Safety of coastal infrastructure against cyclones and cyclonic storm surge.		√	
282	Coastal Embankment Improvement Project (II)	√		
283	Rehabilitation of the polders in Southwestern coastal zones	√	√	
284	Construction of flood control embankment and infrastructure under polder 55/2G in Baufol upazila of Patuakhali district.	√		
285	Rehabilitation of Polder-3 of Satkhira district.	√		
286	Rehabilitation of polder 73/1 & 73/2 in Hatiya upazila under Noakhali district damaged by occurred cyclone/high tide due to climate change in different times.	√		
287	Sea Dyke protection of polder 48 near Kuyakata in Kolapara upazila under Patuakhali district.	√		
288	Super dyke Construction Project at Gohira of Anowara under Chittagong District in connection with Bangladesh Economic zone (EZ).	√		
289	Rehabilitation of Polder no-46, 47/1, 49, 54/A in Kolapara upazila of Patuakhali District.	√		
290	Rehabilitation of Polder 34/2 (part), 30, 31 (part), 31 in Khulna district.	√		
291	Rehabilitation of Polder no-5 in Satkhira district.	√		
292	Rehabilitation of Polder no 31 in Dakop upazilla of Khulna district.	√		
293	Riverbank protection at vulnerable places of polder no 35/1, 35/3 and Mongla-Ghosiakhali channel in Bagerhat district.	√		
294	Rehabilitation project of polder no 13-14/2 of Khulna and Satkhira district	√		
295	Construction of Super Dyke and Sustainable Development of Water Resources Management of Polder-70 in MIDI Area at Upazila-Moheskhal, District-Coxsazar.	√		
296	Rehabilitation of Polder in Khulna, Satkhira and Bagerhat District.	√		
297	Sustainable Development of Water Resources Management of Polder-71 in Cocksazar.	√		
298	Early Warning System for Coastal Resilience in polder protected areas	√		
299	Blue Gold Program (Phase-2)	√		
Haor Rehabilitation Projects				
300	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project-2	√	√	√
301	Dredging and River Management in the Northeastern Haor Region	√	√	
302	Village Protection against Wave Action in Haor Area and Improved Water Management in Haor Basins.	√	√	
303	River Dredging and Development of Settlement in Haor Areas.	√	√	√
304	Development of Early Warning System for Flash Flood Prone Areas in Haor and Dissemination to Community Level.	√	√	
305	Monitoring of Rivers in Haor Area.	√	√	√
306	Expansion of irrigation through utilization of surface water by double lifting in haor area.	√	√	

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
307	Minor Irrigation by low lift pumps Project.	√	√	
308	Investigation and expansion of ground water irrigation.	√	√	
309	Development and Construction of Innovative Fish pass / Fish Friendly Structures.	√	√	
310	Elevated Village Platforms for the Haor Areas.	√	√	
311	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√	√
312	Borni Baor Land Reclamation and Development Project (phase-II).	√		
313	Program for Implementation of Rationalized Water Related Interventions in Upper Meghna Basin.	√	√	
314	Ecosystem habitat preservation program for plants, wildlife, fisheries, and migratory birds.	√	√	
315	Sustainable Haor Wetland/Rivers and Fish Habitat Management.		√	
316	Management of Commercially Important Wetland Ecosystem.		√	
317	Construction of causeway for improvement of drainage and convenience of navigation at haor area.	√		
318	Development of drainage and early flood prevention at haor area under Sunamganj district through river dredging and bank protection.	√		
319	Comprehensive study for flood and drainage management of upper Meghna basin within Bangladesh.	√		
320	Climate sensitive agriculture and water management project.	√		
Others Projects				
321	ICT Based Institutional Development and Capacity Building of Agencies under MoWR	√		
322	Connecting all working field divisions including training Institute with central data network of BWDB for online monitoring and management	√		
323	Development of consolidated MIS reporting and online monitoring of BWDB's programmes.	√		
324	Impact study of the interventions of trans-boundary river system	√		
325	Morphological Dynamics of Meghna Estuary for Sustainable Char Development	√	√	√
326	Development of WMOs and Participatory Scheme Management Model, with Cost Recovery for Operation and Maintenance.	√		
327	Dynamic Climate Smart Knowledge Portal and Hydro-geological Database for MoWR and BWDB	√		
328	Expansion and Modernization of Network & Tools for Groundwater Monitoring Including National Coordination Mechanism	√		
329	Procurement of land based mechanical equipment and Barge construction for Directorate of Mechanical.	√		
330	Construction of residential buildings with other structures of BWDB's own compound in Dhaka.	√		
331	Construction of International Water Resource Management and Research Institute.	√		
332	Southern Agricultural Improvement Project (SAIP).		√	
333	Study for harnessing the waters of the Brahmaputra River.		√	

Sl.	Project Name	Priority (Term-wise)		
		Short (8 yrs)	Medium (15 yrs)	Long (25 yrs)
334	Construction of Inspection Bungalow at the Field Level of Water Development Board	√		
335	Capacity Building/Procurement of Dredgers, Modernization of Mechanical/Dredger/Hydrology Wing	√		
336	Construction of Necessary Residential, Administrative and Other Physical Infrastructure at BWDB Establishment Project (1st Phase)	√		
337	Construction of 9 dredger bases to increase dredging capacity of BWDB.	√		
338	Collection of 20 amphibian excavators with cutter suction dredging attachment for dredging of small river in Bangladesh.	√		
339	Tree plantation on BWDB's constructed embankment, bank of rivers and khal.	√		
340	Sustainability of irrigation and drainage projects through participatory water management.	√		
341	Technical assistance for preparation of flood management plan of Bangladesh.	√		
342	Integrated development program to expand electric block and small irrigation project area in Dinajpur, Thakurgaon and Panchagarh district.	√		
343	Automation of hydrology division of BWDB with modern equipment's.	√		
344	Renovation/construction of offices and residential buildings of Sylhet, Sunamganj, Moulovibazar and Habiganj O&M Division under North-Eastern zone, Sylhet.	√		



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

www.bwdb.gov.bd বাপাউবো.বাংলা

পানি ভবন, ৭২ গ্রীনরোড, ঢাকা
